



Valledupar – Cesar, 11 de marzo del 2020

Honorable Magistrado.

JOSE ANTONIO APONTE OLIVELLA.

Tribunal Administrativo del Cesar

E. S. D.

REF.: Medio de Control: Controversias Contractuales.
Demandante: Consorcio Ambientes Escolares Del Cesar
Demandado: Municipio de Chiriguaná Cesar
Radicado: 20-001-23-39-002-2016-00485-00

AMELIA JUDITH GARCIA MENESES, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Valledupar (Cesar), identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.064.799.687 expedida en Chiriguaná (Cesar), abogada titulada y portadora de la tarjeta profesional No. 292.260 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado de **MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ CESAR**, según poder conferido por el señor **CARLOS IVAN CAAMAÑO CUADRO**, en su calidad de Alcalde Encargado y en Representación Legal del Ente Territorial, por medio del presente escrito, me dirijo a Usted, a fines de dar cumplimiento a lo requerido mediante GJ 0818 del Tribunal Administrativo del Cesar, en donde por tercera vez se solicitan documentales correspondiente a Copia auténtica o fotocopia autenticada de todos los antecedentes administrativos relativos al contrato No. 002-2010 del 20 de enero de 2010, cuyo objeto fue *“la construcción y adecuación de ambientes escolares en las instituciones y centros educativos del municipio de Chiriguaná Departamento del Cesar”*, de los cuales se anexan y relacionan los siguientes documentos:

- Copia Autentica de Contrato de Obras Civiles No. 002 del 20 de enero del 2010.
 - Copia Autentica de Programación de Obras.
 - Copia Autentica de Contrato de Cesión de Derechos Consorciales.
 - Copia Autentica de Póliza o Garantía del Contrato de Obras Civiles No. 002 del 20 de enero del 2010.
 - Copia Autentica de Actas de inicio, suspensión y reinicio de obras del contrato de Obras Civiles No. 002 del 20 de enero del 2010.
 - Copia Autentica de Certificaciones del Pago de Parafiscales dentro del contrato de Obras Civiles No. 002 del 20 de enero del 2010.
 - Copia Autentica del informe técnica del contrato de Obras Civiles No. 002 del 20 de enero del 2010.
- Diseño de mezclas de los concretos vaciados en obra.



- Análisis de las Características de los Agregados Finos y Gruesos de los concretos vaciados en obra.
- Copia de Ensayos de Laboratorio o Pruebas de Resistencia de los Concretos vaciados en obra.
- Informe de Avance de Obras del Obras Civiles No. 002 del 20 de enero del 2010.
 - Estado de Avance de las Obras en los Planteles en Ejecución.
 - Acta de Comité Técnico como constancia de Verificación del Retraso en la Ejecución de las Obras.
- Informe De Interventoría

Así mismo me permito anexar Poder para actuar con sus respectivos anexos los cuales me acreditan como apoderada judicial del Municipio de Chiriguaná Cesar.

Con el anexo de la información y documentación detallada me permito contestar y cumplir a SASTISFACCIÓN el requerimiento judicial de pruebas, cumpliendo con el deber legal de esta administración municipal de aportar las documentales requerida y permitir con ello que se siga con el curso normal del proceso.

NOTIFICACIONES


Recibiré notificaciones en la ciudad de Valledupar Cesar, en la dirección Carrera 11 No. 13 C – 48, Edificio Inversiones Saravelli – Oficina 303.

Correo electrónico: a.garciam.95@gmail.com - ameliagarciam.abogada@gmail.com.

El Municipio de Chiriguaná Cesar, recibirá notificaciones en la dirección Calle 7 No. 5-40 Barrio Centro en el Municipio de Chiriguaná Cesar.

Correo Electrónico: notificacionjudicial@chiriguana-cesar.gov.co

Atentamente,



AMELIA JUDITH GARCIA MENESES

C.C. No. 1.064.799.687 de Chiriguana Cesar

T.P. No. 292.260 del C.S. de la J.



3
423

Honorable Magistrado

JOSE ANTONIO APONTE OLIVELLA.

Tribunal Administrativo del Cesar

E. S. D.

REF.:	MEDIO DE CONTROL:	Controversias Contractuales.
	DEMANDANTE:	Consortio Ambientales Escolares Del Cesar.
	DEMANDADO:	Municipio de Chiriguana Cesar.
	RADICADO.:	20-001-23-39-002-2016-00485-00.
	ASUNTO:	Otorgamiento de Poder Especial.

CARLOS IVAN CAAMAÑO CUADRO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.670.767 expedida en Bucaramanga (Santander), quien actúa en nombre y representación del **MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ – CESAR**, en su calidad de Alcalde Municipal y Representante Legal, debidamente posesionado el 30 de diciembre de 2019, ante la Notaria Única del Circuito de Chiriguana (Cesar), manifiesto a usted, que confiero **PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** al doctor **AMELIA JUDITH GARCIA MENESES**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Valledupar, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.064.799.687 expedida en Chiriguana - Cesar, portadora de la tarjeta profesional No. 292.260 del Consejo Superior de la Judicatura, para que defienda los intereses de mi representada en el medio de control de Reparación Directa, que se adelanta en este despacho judicial, promovido por el **CONSORCIO AMBIENTALES ESCOLARES DEL CESAR** por medio de apoderado judicial.

Mi apoderado cuenta con todas las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, contestar demanda, llamar en garantía, excepcionar, interponer recursos, presentar nulidades, de ley, conciliar, recibir, transigir, sustituir, desistir, renunciar, reasumir y en general hacer cuanto fuere necesario en defensa de los legítimos derechos e intereses de mi representada y las detalladas en el artículo 77 del Código General del Proceso.

Sírvase Señor (a) Juez, reconocerle personería a mi apoderada dentro de los términos y para los efectos en que esta conferido el presente mandato.

Firma,

Acepto,

CARLOS IVAN CAAMAÑO CUADRO
CC No. 1.098.670.767 de Bucaramanga

AMELIA JUDITH GARCIA MENESES
C.C. No. 1.064.799.687 de Chiriguana
T.P. No. 292.260 del C.S de la J.

RAMA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL
JUZGADO SEGUNDO PROMOCION MUNICIPAL
PALACIO DE JUSTICIA DEL

Clasificación: Diez de Marzo de 2020

El señor juez promotor Magistrado

Jose Antonio Ponte Herrera

Secretario: Carlos Ivan Camacho Cuadro

en horas de estudio de los del del

El compareciente: Carlos Ivan

c.c. 1.098.670.667 de Bucaramanga

El secretario: CKE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR



SECRETARIA
JUZGADO SEGUNDO PROMOCION MUNICIPAL
CHIRIGUANÁ - CESAR



REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REPUBLICA DE COLOMBIA
ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

E-27

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA MUNICIPAL

DECLARAMOS

Que, CARLOS IVAN CAAMAÑO CUADRO con C.C. 1098670767 ha sido elegido(a) ALCALDE por el Municipio de CHIRIGUANA - CESAR, para el periodo de 2020 al 2023, por el PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL DE LA U.

En consecuencia, se expide la presente CREDENCIAL, en CHIRIGUANA (CESAR), el jueves 07 de noviembre del 2019.

CARLOS ARTURO GÓMEZ	EDGAR DANIEL BUITRAGO PUNTES	DIANA IRENE JIMÉNEZ FUMIHAYA	ALVARO LOPEZ CARDENAS
TRUJILLO			
MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA		SECRETARIO(S) DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA	



ACTA DE POSESIÓN

En el municipio de Chiriguana-Cesar, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), ante el Notario Único del Circulo de Chiriguana-Cesar, cuyo titular es el doctor **HÉCTOR EFRAÍN ORJUELA GARCÍA**, se presentó el Doctor **CARLOS IVÁN CAAMAÑO CUADRO**, identificado con la cedula de ciudadanía numero **1.098.670.767** expedida en Bucaramanga-Santander, para solicitar se le de posesión en el Centro de Integración Ciudadana C.I.C del corregimiento de Poponte de esta Jurisdicción, del cargo de alcalde Municipal de Chiriguana-Cesar, para el periodo constitucional 2020-2023.


En virtud de lo anterior y para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 94 de la ley 136 de 1994, el suscrito Notario se traslado al Centro de Integración Ciudadana C.I.C del corregimiento de Poponte, Jurisdicción del municipio de Chiriguana-Cesar y una vez allí se constató que el peticionario presentó para el efecto, la siguiente documentación:

1. Credencial expedida el día siete (07) de Noviembre de 2019 por la Registraduría Nacional del Estado Civil y firmada por los miembros de la Comisión Escrutadora.
2. Cedula de ciudadanía número **1.098.670.767** expedida en Bucaramanga-Santander.
3. Formato Único de Hoja de Vida, debidamente diligenciada.
4. Certificado de antecedentes especial No. 137686138 del 03 de diciembre de 2019 para el cargo de Alcalde Municipal expedido por la Procuraduría General de la Nación, donde consta que no registra sanciones ni inhabilidades vigentes.



5. Certificado de antecedentes ordinario No. 137686620 del 03 de diciembre de 2019 expedido por la Procuraduría General de la Nación, donde consta que no registra sanciones ni inhabilidades vigentes
6. Certificado de Antecedentes fiscales del 03 de diciembre de 2019 expedido por la Contraloría General de la República código de verificación 1098670767191202092417 donde consta que no se encuentra reportado como responsable fiscal.
7. Certificado de antecedentes y requerimientos judiciales del 03 del diciembre de 2019 expedido por la Policía Nacional, donde consta que no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales.
8. Fotocopia de certificación de la Escuela Superior de Administración Pública del 27 de Noviembre de 2019 sobre participación en seminario de inducción de y gobernadores.
9. Afiliación a la EPS Nueva E.P.S.
10. Formulario de Declaración Juramentada de Bienes y Rentas, Persona Natural de **CARLOS IVÁN CAAMAÑO CUADRO y ANA MARÍA GALEANO GUZMÁN.**
11. Declaración Jurada sobre ausencia de causales de inhabilidad o impedimentos para el ejercicio del cargo de Alcalde Municipal de Chiriguana-Cesar, y sobre la inexistencia de procesos de alimentos en su contra de fecha 03 de diciembre de 2019 emanada de la Notaria única de de Chiriguana Cesar.

Cumplidos los requisitos de ley, el suscrito Notario procedió a tomar el juramento al Doctor **CARLOS IVÁN CAAMAÑO CUADRO**, quien en voz clara y perceptible manifestó: *"Juro a Dios y prometo al pueblo de Chiriguana Cesar cumplir fielmente la Constitución, las leyes de Colombia, las ordenanzas y los acuerdos"* a lo cual el Notario expresó: *"Sí así lo hicieres que Dios y el Pueblo de Chiriguana os premien y si no fuere así que Dios y el pueblo os lo demanden"*.





En virtud de lo anterior, queda legalmente posesionado del cargo de **ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ-CESAR**, el Dr. **CARLOS IVÁN CAAMAÑO CUADRO**, para el periodo constitucional que comienza el primero (1) de enero de dos mil veinte (2020), de conformidad con la credencial expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.


El original de este documento se conservara en la Notaria única de Chiriguana-Cesar para su guarda y protocolo.

Firman.

El posesionado.



CARLOS IVÁN CAAMAÑO CUADRO

El Notario.


HÉCTOR EFRAÍN ORJUELA GARCÍA



Notario. Héctor Efraín Orjuela García
Dirección. Calle 8 No. 5-117
Email. unicachiriguana@supernotarlado.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.098.670.767

NUMERO

CAAMAÑO CUADRO

APELLIDOS

CARLOS IVAN

NOMBRES

Carlos I. Caamaño

FIRMA



IMPRESION DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-MAY-1989
CHIRIGUANA
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

A+

G.S. RH


M

SEXO

01-JUN-2007 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GONZALEZ VALE



P-2700100 59161769-M-1098670767-20070831

0442407243A 02 249117146

9
424

**CONTRATO DE OBRAS CIVILES No. 002 DEL 20 DE
ENERO DE 2010.**

REPÚBLICA DE GUATEMALA
MUNICIPIO DE CHICHUJANA
ALCALDIA MUNICIPAL
Este Documento es Fiel
Copia de su Original.
Fecha: 10-Marzo-2020
Firma: M^c José Vides



Municipio de Chiriguana
Departamento del Cesar
República de Colombia



Contrato de obras

Objeto:

Contratante:

Contratista:

Nit:

Dirección:

Teléfono:

Valor:

Duración:

No. 002--
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR
MUNICIPIO DE CHIRIGUANA
CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR
900.333.021-9
Calle 90 No. 18-83 Oficina 404
2578863
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE. (\$17.941.459.937,00)
La duración del presente contrato será de doce (12) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.

Entre los suscritos a saber: RAMON ARTURO DIAZ CORZO, mayor, identificado con cédula de ciudadanía Número 77 169.930 expedida en Valledupar - Cesar, en su calidad de Alcalde Municipal de Chiriguana, posesionado mediante acta número 0074 del 01 de enero de 2008, cargo para el cual fue elegido popularmente para el periodo 2008-2011, y, quien actúa a nombre y en representación del Municipio de Chiriguana, actuando como jefe de la entidad territorial, quien para efectos de este contrato se denominará el CONTRATANTE y DAVID OROZCO MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanía número 8.703.083 de Barranquilla - Atlántico quien actúa en representación del CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR., identificado con Nit: 900.333.021-9, para efectos de este vínculo contractual se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente CONTRATO DE OBRAS. Previas las siguientes consideraciones: a) Que la entidad debe satisfacer la necesidad que tiene a través de la presente contratación, b) Que del contrato celebrado no se derivara para el MUNICIPIO ningún tipo de relación laboral, c) Que para la adjudicación y celebración de este contrato y de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo estipulado en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el título I y capítulo I del título II del decreto 2474 de 2008 y se adelantó el procedimiento de Licitación Pública No.015 de 2009 al cual se presentaron los siguientes proponentes: CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR, d) Que una vez realizada la evaluación de las propuestas presentadas se adjudicó la Licitación al proponente CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR, por ser su propuesta favorable para los intereses del MUNICIPIO y se notificó personalmente el día 12 de enero de 2009, al Señor DAVID OROZCO MALDONADO, quien actuó en su calidad de representante legal del CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR, e) Que existen las apropiaciones presupuestales respaldadas por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1073 de fecha 03 de noviembre de 2009, actualizado mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 013 del doce de enero de 2010, h) Que una vez adjudicado el contrato procede la celebración del mismo el cual se registrará por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO: El contratista se obliga para con el MUNICIPIO a realizar LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR. SEGUNDA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE. (\$17.941.459.937,00). Incluido el IVA sobre la utilidad que corresponde a la obra a ejecutar de acuerdo con la Disponibilidad Presupuestal. PARÁGRAFO PRIMERO: El valor real del contrato será la suma de los resultados que se obtengan al multiplicar las cantidades ejecutadas y/o entregadas a satisfacción de EL MUNICIPIO por los valores o precios unitarios pactados para el respectivo ítem. El presente contrato se pacta por el sistema de precios unitarios (valor por unidad de recurso, obra, trabajo, servicio o bien, el cual remunera la totalidad de las actividades y/o suministros que sean necesarios para la ejecución de su objeto, de conformidad con lo pactado). Cada precio unitario comprende todos los costos directos e indirectos derivados de la ejecución de la respectiva actividad y/o suministro que hacen parte del objeto del contrato. Incluye entre otros los gastos de administración, salarios y prestaciones sociales del personal, incremento salarial y prestaciones, desplazamiento, transporte, alojamiento y alimentación del equipo de trabajo, del contratista, honorarios, asesorías en actividades objeto del contrato, computadores, licencias de utilización del software, impuestos a cargo del contratista, las deducciones a que haya lugar y en general todo costo en que incurra el contratista para la ejecución de cada una de las actividades o suministros objeto de este contrato, por lo cual incluye el A.I.U. PARÁGRAFO SEGUNDO: Dado que el Contratista incluyó en el precio de cada ítem, según aparece en la propuesta que forma parte de este contrato, la totalidad de los costos, gastos el A.I.U. y demás elementos, que inciden económicamente en la ejecución de cada una de dichas actividades y/o suministros adicionales, EL MUNICIPIO no despachara favorablemente reclamos de solicitudes de reajuste efectuados por el contratista por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el contrato y que fueron previsibles al momento de presentación de su oferta. Dicha suma de dinero se la cancelará al contratista de la siguiente forma: un anticipo correspondiente al 50% del valor del contrato, el cual asciende a la suma de OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS

20 ENE 2010

431

10-MAR-2020
MA JOSE UDES

Municipio de Chiriguana
Departamento del Cesar
República de Colombia



002

SESENTA Y OCHO PESOS MCTE, CON CINCUENTA CENTAVOS (\$8.970.729.968,50). El valor restante se cancelará previa presentación de las actas de pago parciales aprobadas por el interventor, de acuerdo con lo pactado, y corresponderán al valor que resulte de multiplicar las cantidades de obras ejecutadas por los precios unitarios, hasta el 90% del valor total del contrato. El 10% restante solo se cancelará con la terminación total de las obras y con el recibido a satisfacción por parte de la interventoría. Este último pago se efectuará una vez el contratista adjunte y cumpla con todos los requisitos exigidos por la Ley para su liquidación. De igual manera el pago quedará sujeto a que el contratista presente la fotocopia del pago de la EPS y pensiones, al igual que ARP y aportes parafiscales de Sena, ICBF, caja de compensación, de conformidad con el Decreto 1703 de 2002 y decreto 510 de 2003 y los artículos 50 y 23 de la ley 789 del 2002, 1150 de 2007 respectivamente. **TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1) DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de la República de Colombia, del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, de las normas que regulan el ejercicio de la ingeniería y sus profesiones afines y auxiliares, de las contenidas en las normas urbanísticas, técnicas y ambientales pertinentes, y en especial la NTC 4595 - 4596 y la NSR 98, y de las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aquellas contenidas en otros apartes del pliego de condiciones y de las consignadas específicamente en el contenido del contrato, el contratista contrae, entre otras, las siguientes: 1) **Obligaciones de carácter general:** A) Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción que hacen parte del pliego de condiciones, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido. B) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores. C) Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 -adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007-, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar, para el personal de la oficina que presta el apoyo a la ejecución de la obra, como de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, este último cuando corresponda. D) Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. E) Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. E) Informar oportunamente al Municipio sobre eventualidad que pueda surgir y que implique retraso en el desarrollo del contrato. F) Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en el pliego y sus anexos. G) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entramamientos. H) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. I) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. J) Las demás que por ley o contrato le correspondan. 2) **Obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual:** A) Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de las obras y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigidas en el pliego de condiciones. En todo caso, el contratista deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecución con El Municipio o con terceros. Además de lo anterior, deberá contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. B) Vincular a la ejecución de cada uno de los proyectos, como mínimo en un setenta por ciento (70%) del personal no calificado, a individuos de la región de influencia de la misma. C) Mantener al frente de las obras al personal exigido en los pliegos de condiciones y ofrecido por el proponente en su oferta matriculado y aceptado por la interventoría, quien será el director de proyecto y representante del contratista para decidir, con el interventor, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución de la obra. D) El contratista deberá presentar al interventor del contrato, con cinco (5) días de antelación al inicio de la etapa donde desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato, con excepción del personal principal requerido indicado en el pliego de condiciones. E) Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido. F) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y El Municipio. G)

20 ENE 2010



12
432

RECIBIDO
10 MAR 20 2020
MA JOSE JIDES

Municipio de Chiriguana
Departamento del Cesar
República de Colombia



002 - -

Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra El Municipio, por causa o con ocasión del contrato. **Parágrafo 1.** Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual será objeto de especial verificación por la interventoría, y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes. **Parágrafo 2.** El contratista no podrá contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato a celebrar. Por lo tanto, serán rechazadas por la Interventoría o por El Municipio las hojas de vida del personal que se pretenda contratar o vincular y que se encuentre incurso en la prohibición señalada. En este caso, el contratista tendrá que presentar un nuevo profesional o técnico, según corresponda. **3) Obligaciones relacionadas con la adecuación del lugar de la obra:** A) Obtener, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario. B) Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del objeto del contrato, así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. C) Realizar la construcción del campamento de obra por cada uno de los proyectos, cuya ubicación deberá contar con la aprobación de la interventoría. D) Las especificaciones técnicas mínimas del campamento, serán las siguientes: D1) El contratista construirá o adecuará en el sitio de la obra una caseta o edificación provisional que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, protección y seguridad. D2) El campamento estará conformado por oficinas para la dirección de la obra y la interventoría, un campamento para los trabajadores, un almacén y un depósito para materiales que puedan sufrir pérdidas o deterioro por su exposición a la intemperie. La capacidad del depósito la determinará el flujo de materiales de acuerdo con la programación detallada de la obra. D3) El campamento se ubicará en sitios de fácil drenaje, donde no ofrezcan peligros de contaminación con aguas residuales, letrinas y demás desechos y contarán con todos los servicios higiénicos debidamente conectados a los colectores de aguas residuales existentes en cercanías del campamento. El contratista será responsable ante las autoridades competentes en el sitio de las obras del cumplimiento de las normas vigentes y de las sanciones a que se haga acreedor debido a su incumplimiento u omisión. D4) Una vez terminada la obra, el campamento se retirará o demolerá y se restituirán las condiciones que existían inmediatamente antes de iniciar las construcciones, si a ello hay lugar. E) Instalar una valla informativa, de acuerdo con las dimensiones dadas en las especificaciones técnicas generales de construcción. F) Realizar, el cerramiento provisional de la obra y/o de las zonas por intervenir, de acuerdo con las especificaciones dadas, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a los trabajos, evite perturbaciones de tránsito e incomodidades a los vecinos. Deberá tener como mínimo dos (2) metros de altura y la totalidad de la señalización preventiva necesaria para la segura circulación del personal de obra, vecinos y terceros. De igual forma, deberá realizar el mantenimiento del campamento y del cerramiento, durante toda la ejecución de la obra. **4) Obligaciones relacionadas con los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de Construcción:** A) Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios. B) Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra. C) Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. D) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra. En cumplimiento de esta obligación, el contratista deberá presentar a la interventoría los documentos que permitan acreditar que los equipos utilizados para los diferentes ensayos tengan las siguientes capacidades: D1) Calibrar o verificar a intervalos especificados o antes de su utilización, comparado con patrones de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional. D2) Cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación. D3) Ajustar o reajustarse, según sea necesario. D4) Identificarse para poder determinar el estado de calibración. D5) Protegerse contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento. **5) Obligaciones relacionadas con la ejecución de la obra:** A) Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas, para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra; diferentes a los previamente obtenidos por El Municipio, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingreso del personal, horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervención del espacio público, entre otros. B) Realizar, por su cuenta y riesgo, las pruebas requeridas a todas las redes de instalaciones y corregirlas, si es el caso, hasta la entrega a satisfacción a la interventoría. C) Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. D) Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención en donde se ejecute la obra. E) Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencia de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del año siguiente a la entrega de las obras. F) Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor o El Municipio, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. G) Reponer, por su cuenta y riesgo, las obras de urbanismo afectadas por la construcción. H) Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre

20 ENE 2010

[Handwritten signature]

100

•

•

•

•

Municipio de Chiriguana
Departamento del Cesar
República de Colombia



0.02 - 3

Recn: 10-Marzo-2020
Firma: Ma Jose Vides

seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en cuanto guarda relación con: H1) Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra. H2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. H3) Dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual. 6) **Obligaciones de Información:** A) Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener, para cada uno de los frentes de trabajo: A1) Avance de cada una de las actividades programadas. A2) Cantidades de obra ejecutadas. A3) Registros fotográficos. A4) Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. A5) Fotocopia de la bitácora o libro de obra. A6) Resumen de las actividades realizadas en el mes. A7) Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. A8) Informe de seguridad industrial. A9) Informe de manejo ambiental. A10) Informe de manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes. A11) Informe de gestión social. A12) Actualización del programa de ejecución de obra. A13) Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. B) Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener: B1) Resumen de actividades y desarrollo de la obra. B2) Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra, Planos record de obra, aprobados por la interventoría, Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento, Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda, Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran, Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno, Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones, Registro fotográfico definitivo. C) Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de El Municipio. D) Elaborar, siguiendo los mismos criterios de los planos y diseños entregados por El Municipio, los planos record de la totalidad del proyecto, los cuales deberán ser entregados a El Municipio con la aprobación de la interventoría, en medio impreso y magnético. E) Elaborar, durante todo el proceso de construcción, el manual de funcionamiento y mantenimiento, en el cual se deberá especificar los materiales de obra de permanente uso (pisos, muros, cubiertas, aparatos y etc., así como de los equipos instalados), su funcionamiento y mantenimiento. Se deberá anexar el original de las garantías de todos los equipos. Este manual contendrá en una escala reducida, pero legible, los planos arquitectónicos estructurales, hidrosanitarios y de equipos especiales. El manual deberá contar con la aprobación por de la interventoría. F) Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance. G) Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación. G) Presentar toda la información requerida por el Interventor o El Municipio. 7) **Obligaciones relacionadas con los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción:** A) Utilizar los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción entregadas por El Municipio únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ningún caso, se entenderá como cesión de derechos o licenciamiento. B) En caso de ser necesario cualquier rediseño o modificación en los diseños, planos o cualquier otro documento entregado por El Municipio, que implique la creación de una obra nueva prolegida por las normas de derechos de autor, los derechos patrimoniales sobre la misma se entenderán cedidos a El Municipio. C) Revisar, junto con la interventoría, dentro de los quince (15) días siguientes a la suscripción del acta de inicio, la totalidad de los diseños, planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción. Si vencido el plazo señalado el contratista no presenta ninguna observación, se entiende que acepta en su integridad tales documentos. D) Justificar técnicamente toda adecuación, complementación, ajuste y/o modificación de los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, con el fin de obtener el aval del Consultor o en su defecto del interventor y por El Municipio, sin perjuicio de las autorizaciones que sean requeridas por parte del consultor que los haya elaborado en cumplimiento de lo dispuesto en las normas NTCGP1000:2004 e ISO 9011:2000. La responsabilidad por las adecuaciones, complementaciones, ajustes y/o modificaciones a los diseños, planos, estudios técnicos y/o especificaciones de construcción será asumida por el contratista en el evento que el contrato de consultoría no se encuentre vigente. **OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:** A) Pagar en la forma establecida en la Cláusula FORMA DE PAGO, las facturas presentadas por el contratista, para lo cual se establecerá en el contrato con cargo al Municipio.

20 ENE 2010



CHIRIKUWA
 No. 5 100 000
 100 000 000

Reine A. da 7



Municipio de Chiriguana
Departamento del Cesar
República de Colombia



002 - - 2

Resolución que el CONTRATISTA ejecutará el objeto del contrato con total autonomía técnica, administrativa, financiera y sin subordinación con respecto a el Municipio, queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre el personal utilizado por el CONTRATISTA y el Municipio de Chiriguana. Por lo tanto, será de cargo del CONTRATISTA el reclutamiento, calificación, entrenamiento y dotación del personal que utilice, lo mismo que el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, aportes a los sistemas generales de seguridad social y aportes parafiscales, así como el cumplimiento de normas sobre seguridad e higiene industrial. El CONTRATISTA deberá cumplir todas las disposiciones legales sobre contratación de personal. Así mismo, el CONTRATISTA proveerá el personal y los equipos requeridos para la debida y oportuna ejecución del contrato, de acuerdo con el programa de obra aprobado. Si el CONTRATISTA no cumple con dicho programa, deberá adoptar las medidas necesarias para lograr su cumplimiento incluyendo entre otras el aumento de personal, los turnos, la jornada de trabajo, la capacidad de los equipos o todo ello, sin costo adicional para el Municipio de Chiriguana. **VIGESIMA: PENAL PECUNIARIA:** Se estipula como cláusula penal pecuniaria la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen al Municipio por el incumplimiento total o parcial del contrato, para cuyo cobro prestará mérito ejecutivo el presente contrato, acompañado de cualquier medio idóneo de prueba del incumplimiento del Contratista, valor que se hará efectivo sin perjuicio de la imposición de multas y declaratoria de caducidad del Contrato. El Municipio, podrá tomar directamente el valor de la cláusula penal, de los saldos que adeude al Contratista, por razón del contrato o de la garantía constituida. De no ser posible, se cobrará acudiendo a la jurisdicción competente. El Contratista rehúsa a cualquier requerimiento judicial o privado, para hacer efectivas las obligaciones garantizadas. No obstante, El Municipio podrá solicitar al Contratista la totalidad del valor de los perjuicios causados que excedan el valor de la cláusula penal pecuniaria, de acuerdo con la facultad que otorgan sobre el particular los artículos 1594 y 1600 del Código Civil y en tal sentido se establece contractualmente, que el pago de las penas previstas no extingue la obligación principal contratada y que el acreedor de las obligaciones podrá a su arbitrio pedir el pago de la pena y la indemnización de los perjuicios causados, todo esto previo agotamiento del procedimiento reglado en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007 **VIGESIMA PRIMERA: PRORROGA DEL PLAZO:** Si las circunstancias de fuerza mayor y / o caso fortuito de cualquier naturaleza que se produzcan, resultan ser tales que con justicia dan derecho al contratista a una prórroga del plazo, el interventor deberá determinar la extensión de dicha prórroga, siempre que el contratista dentro de los diez días calendario anteriores al vencimiento del contrato le haya entregado los datos completos y pormenorizados de toda demanda de prórroga del plazo que considere tener derecho, con el objeto que su demanda pueda ser investigada y resuelta. El contratista deberá demostrar la situación de fuerza mayor o caso fortuito, caso en el cual tendrá derecho a la ampliación del plazo pero no a indemnización alguna ni a variación de las condiciones iniciales. Lo anterior no exonera al contratista de su obligación de constituir y mantener vigentes los seguros y garantías que correspondan según lo estipulado en el pliego de condiciones y será responsable de los daños que sufra el Municipio por no haberlos constituido o mantenido vigentes. Una vez cese las causeles de fuerza mayor o caso fortuito el contratista deberá comunicar esta situación inmediatamente al Municipio y continuar la ejecución del contrato presentando la reprogramación del mismo, donde se trate de recuperar el mayor tiempo posible. **VIGESIMA SEGUNDA: SUSPENSION TEMPORAL:** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito anteriormente descritos, se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato. La suspensión se hará de común acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de un acta donde conste el evento que la ocasione. Cuando fuera el contratista el interesado en la suspensión, este deberá haberla solicitado por escrito y obtenido el concepto favorable del Interventor y/o supervisor, condición necesaria para que El Municipio pueda considerar la solicitud de suspensión. El contratista deberá mantener vigentes las garantías correspondientes **VIGESIMA TERCERA: CLÁUSULA DE INDEMNIDAD:** el contratista se obliga a mantener libre al Municipio de Chiriguana de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de subcontratistas o dependientes. **VIGESIMA CUARTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL:** El valor del presente contrato será imputado al presupuesto de la vigencia 2009, con cargo al rubro de construcción y adecuación de ambientes escolares en las instituciones y centros educativos del municipio de Chiriguana, Departamento del Cesar

20 ENE 2010

Se firma en Chiriguana, Cesar, a los,

EL CONTRATANTE

RAMON ARTURO DIAZ CORZO
Alcalde Municipal

EL CONTRATISTA

DAVID OROZCO MALDONADO
C.C. 8.703.083 de Barranquilla - Atlántico
Representante CONSORCIO AMBIENTES
ESCOLARES DEL CESAR

76
436

PROGRAMACIÓN DE OBRAS.

GOBIERNO DE COLOMBIA
MINISTERIO DE INTERIORES
CORPORACIÓN ALCALDIA MUNICIPAL
Escribano de Gobierno
Copia 10-30-2020
Fecha: 10-marzo-2020
Firma: H^a José Vides

PROGRAMACION GENERAL DE OBRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
RAFAEL ARGOTE VEGA SEDE B Y SEDE A												
ESCUELA LA ESTACION												
ESCUELA SANTA RITA												
ESCUELA LA SIERRA												
ESCUELA ARENAS BLANCAS												
ESCUELA LA AURORA												
CHIQUEQUIRA												
ARGOTE VEGA # 1												
JUAN MEJIA GOMEZ BACHILLERATO												
JUAN MEJIA GOMEZ # 3												
JUAN MEJIA GOMEZ # 7												
EL HATILLO												
MANUEL GERMAN CUELLO SEDE #1												
MANUEL GERMAN CUELLO SEDE #2												
MANUEL GERMAN CUELLO BACHILLERATO												
LUIS FELIPE CENTENO #1 LAS MARGARITAS												
LUIS FELIPE CENTENO # 2												
LUIS FELIPE CENTENO BACHILLERATO												

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MUNICIPIO DE CHIRIGUANA
 ESTADISTICA MUNICIPAL
 Fecha: 10-Marzo-2010
 Firma: M. A. José J. J. J.

487



1000

19
4389

10 marzo 2020
Ha Jose Vides

20
440

CONTRATO DE CESION DE DERECHOS CONSORCIALES

Fecha: 10-ENE-2020
Hoy
Firma: M. J. J. J. J.

Los suscritos, GERMAN VILLANUEVA CALDERON, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 12.547.660 de Santa Marta quien obra en nombre propio, DAVID OROZCO MALDONADO, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 8.703.083 de Barranquilla, quien obra en nombre propio, VICTOR CABELLO LONDOÑO, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 85.459.388 de Santa Marta quien obra en nombre y representación de CONSTRUSOCIAL LTDA con NIT 819.002.537-3 y LEONARDO DAVID DELGHANS PABON, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 79.987.361 de Santa Marta quien obra en nombre y representación de BB INGENIEROS LTDA con NIT 830.005.282-4, de una parte, quienes para efectos del presente documento serán LOS ADQUIRIENTES y de la otra LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR, VALCO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES LTDA, Sociedad legalmente constituida y domiciliada en la Ciudad de Bogotá con NIT 900.010.332-8, legalmente representada por MARIO VALDERRAMA CORDERO, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 13.541.216 de Bucaramanga, quien participa en el Consorcio en el 8%, CONSTRUCTORA VC LTDA, sociedad legalmente constituida y domiciliada en la Ciudad de Bogotá con NIT 804.005.319-3 legalmente representada por FERNANDO VALDERRAMA CORDERO, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 91.270.374 de Bucaramanga, quien participa en el Consorcio en el 11%, COOPERATIVA NACIONAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL - COOPMUNICIPAL, entidad Cooperativa legalmente constituida y domiciliada en la Ciudad de Bucaramanga con NIT 804.010.427-0 legalmente representada por RODOLFO SIERRA GOMEZ, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 5.706.194 de Piedecuesta, quien participa en el Consorcio en el 40%, COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA - CODENCO, entidad Cooperativa legalmente constituida y domiciliada en la Ciudad de Bucaramanga con NIT 820.003.227-3 legalmente representada por JOSE ANTONIO ALVAREZ DELGADO, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 91.237.454 de Bucaramanga, quien participa en el Consorcio en el 40%, quienes para efectos del presente documento serán LOS CEDENTES, quienes junto con la sociedad OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A con NIT 830.006.821-9 legalmente representada por JULIO HERNAN ESPINEL MARTINEZ, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 19.390.017 de Bogotá, quien participa en el

COLOMBIA
Co
13-2020

11 JUL 2020
COLOMBIA
Co
13-2020

REPUBLICA DE COLOMBIA
NOTARIA 24 DE CUNDINAMARCA

21
441

Consortio en el 1%, se encuentran consorciados en el **CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR** el cual es contratista en el contrato de obra No. 002 de 20 de enero de 2010 celebrado con el Municipio de Chiriguaná cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ DEPARTAMENTO DEL CESAR**", hemos convenido el presente contrato de cesión de derechos que se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERO.-** Los Cedentes ceden a favor de los adquirentes la totalidad de cuotas de participación, obligaciones, derechos, utilidades y los dineros correspondientes a anticipo recibido por el Municipio de Chiriguaná, que tienen en el **CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR**; a su vez, los adquirentes asumen la totalidad de las responsabilidades que se deriven de los derechos que les entregan los cedentes, en la ejecución del contrato y respecto de multas o sanciones. En virtud de este documento, Los Cedentes quedan excluidos de la relación contractual existente entre el **CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR** y el **MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ**, por lo que renuncian expresamente al cobro de cualquier suma de dinero a título de beneficios por las obras o utilidades que perciba el consorcio, incluido el valor de contratos adicionales o restablecimientos del equilibrio económico; igualmente los Cedentes quedarán excluidos de toda responsabilidad derivada de dichas obras, negocios o actos del consorcio y de multas o sanciones que sean impuestas al **CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR** por la Administración Municipal o por cualquier otra autoridad administrativa o judicial.

PARAGRAFO.- Los Cedentes ceden su participación en el Consorcio en los porcentajes definidos en el comienzo de este documento y los Adquirentes los Reciben de la Siguiete Forma: El Adquirente **GERMAN VILLANUEVA CALDERON** recibe: Del Cesionario **VALCO CONSTRUCTORES Y CONSULTORES LTDA** el 8%. Del Cesionario **CONSTRUCTORA VC LTDA** el 11%. Del Cesionario **COOPERATIVA NACIONAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL - COOPMUNICIPAL** el 19%. Para un total recibido de 38%. El Adquiriente **DAVID OROZCO MALDONADO** recibe: Del Cesionario **COOPERATIVA NACIONAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL - COOPMUNICIPAL** el 21%. Del Cesionario **COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA - CODENCO** el 38,5%. Para un total recibido de 59,5%, El Adquiriente **CONSTRUSOCIAL LTDA** recibe: Del Cesionario **COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS DE COLOMBIA - CODENCO** el 1% Para un total recibido de 1%. El Adquiriente **BB INGENIEROS LTDA** recibe Del Cesionario **COOPERATIVA DE DEPARTAMENTOS Y**


17 JUL 2010

22
942


MUNICIPIOS DE COLOMBIA – CODENCO el 0,5%. Para un total recibido de 0,5% y OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A con NIT 830.006.821-9, legamente representada por JULIO HERNAN ESPINEL MARTINEZ, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 19.390.017 de Bogotá, quien mantiene la participación en el consorcio en el 1% para así conformar el 100% de las participaciones consorciales.

SEGUNDO.- Los cedentes renuncian expresamente a adelantar cualquier acción ante el Municipio de Chiriguaná con ocasión del contrato celebrado por el CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR y renuncian expresamente a la representación legal del mismo, de allí que a partir de la Suscripción de este documento el Representante Legal del Consorcio, Ingeniero MARIO VALDERRAMA CORDERO, cesará en el ejercicio de la misma y no será responsable de la dirección del contrato. En virtud de lo anterior, los Adquirentes designan como nuevo Representante Legal del Consorcio Ambientes Escolares del Cesar a DAVID OROZCO MALDONADO, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.703.083 de Barranquilla. Designación aceptada con su firma en este documento, por el Representante Legal designado; por el miembro del Consorcio que no cede sus cuotas de participación, OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A. con NIT 830.006.821-9, Representada Legalmente por JULIO HERNAN ESPINEL MARTINEZ mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 19.390.017 de Bogotá, y POR EL Municipio de CHIRIGUANÁ, representado legalmente por el Alcalde Municipal RAMON ARTURO DIAZ CORZO. En todo caso, a partir de la firma de este contrato, el Representante Legal actual del Consorcio queda relevado de sus obligaciones como tal y no le será endilgable ninguna obligación referente al mismo.

PARAGRAFO.- En virtud de este contrato, los Adquirentes manifiestan expresamente que conocen la situación de ejecución y desarrollo del objeto contractual del Contrato suscrito entre el CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR Y EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ, Contrato 002 de 2010, por lo tanto manifiestan el conocimiento y aceptación de las siguientes actas suscritas: *Acta de inicio* del 8 de febrero de 2010, *Acta de suspensión* del 18 de febrero de 2010 y *Documento de cambio del representante legal* del 14 de abril de 2010. De la misma forma aceptan que a la fecha de la firma del presente documento el avance del contrato corresponde al cero por ciento (0%) de ejecución, así como la situación financiera del mismo y los gastos que se han causado por la legalización y administración del contrato, por lo que renuncian expresamente al ejercicio de cualquier acción indemnizatoria o de desequilibrio económico respecto de los Cedentes, así como al ejercicio de acciones dirigidas a la rendición de cuentas o



Fecha: 10-Marzo-2020
Firma: Mafosa Udo



devolución de sumas de dinero diferentes a las que aquí se entregan.

PARAGRAFO 2.- BALANCE DEL CONTRATO - El contrato celebrado entre el CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR Y EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ, tiene el siguiente Balance a la fecha de suscripción de este Documento:

CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

NIT 900.333.021-9

BALANCE GENERAL


Ajustado

A 24 DE MAYO - 2010

ACTIVOS			
11	DISPONIBLE		8,046,987,679.01
1105	CAJA	4,654,311,072.00	
110505	CAJA GENERAL	4,654,311,072.00	
1110	BANCOS	763,750.00	
1110	CTA CTE 3-1610-000463-9 AGRARIO	763,750.00	
1120	CUENTAS DE AHORROS	3,391,907,857.01	
11200501	CTA AHORRO 4-2422-0-03655-8 CHIRIGUANA	66,075,036.00	
11200502	CTA AHORRO 4-1610-0-02062-0 BARRANQUILLA	3,325,832,820.44	
13	DEUDAS		89,707,299.68
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	89,707,299.68	
135515	RETENCION EN LA FUENTE	89,707,299.68	
TOTAL ACTIVOS			8,136,689,978.72
PASIVOS			
28	OTROS PASIVOS		(8,970,729,968.50)
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	(8,970,729,968.50)	
280510	SOBRE CONTRATOS	(8,970,729,968.50)	
28051001	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA	(8,970,729,968.50)	
TOTAL PASIVO			(8,970,729,968.50)
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO		834,039,989.78
3610	PERDIDA DEL EJERCICIO	834,039,989.78	
TOTAL PATRIMONIO			834,039,989.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(8,136,689,978.72)

PARAGRAFO 3.- Se reconoce y acepta que los gastos que se han causado por la legalización y administración del contrato No. 002 de 2010 son los siguientes:

GASTOS ADMINISTRATIVOS



24
444

NIT	PROVEEDOR - CONCEPTO	VALOR
800096585-0	ALC CHIRIGUANA/INDUSTRIA Y COMERCIO	89,707,229.00
800096585-0	ALC CHIRIGUANA/ESTAMP. PROCULTURA ANTICIPO	179,414,599.37
800096585-0	ALC CHIRIGUANA/TASA DE CULTURA ANTICIPO	179,414,599.37
800096585-0	ALC CHIRIGUANA/FMD ANTICIPO	89,707,299.68
800096585-0	ALC CHIRIGUANA/PRODESARROLLO ANTICIPO	89,707,299.68
800096585-0	ALC CHIRIGUANA/PROELECTRIFICADORA ANTICIPO	89,707,299.68
860026182-5	COLSEGUROS/POLIZA	95,860,169.00
800037800-8	BANCO AGRARIO - GASTOS BANCARIOS	764,919.00
800037800-8	BANCO AGRARIO - GMF	19,756,575.00
		834,039,989.78

CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

NIT 900.333.021-9

ESTADO DE RESULTADOS

Ajustado

01 DE ENERO A 24 DE MAYO - 2010

INGRESOS


COSTOS

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		
GASTOS OPERACIONALES		(813,518,495.78)
INDUSTRIA Y COMERCIO	(89,707,229.00)	
OTROS	(627,951,097.78)	
CUMPLIMIENTO	(95,860,169.00)	
UTILIDAD OPERACIONAL		(813,518,495.78)
OTROS INGRESOS		
OTROS EGRESOS		(20,521,491.00)
GASTOS BANCARIOS	(582,899.00)	
COMISIONES	(75,667.00)	
OTROS	(106,353.00)	
GMF GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	(19,756,575.00)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(834,039,989.78)
PERDIDA NETA		(834,039,989.78)

TRATAMIENTO DEL ANTICIPO

%	CONCEPTO	VALOR
	VALOR DEL CONTRATO	17,941,459,937.00
	VALOR DEL ANTICIPO	8,970,729,968.50
	DESCUENTOS	
1.00%	RETEFUENTE	89,707,299.69
1.00%	FONDO MUNICIPAL DE DESARROLLO	89,707,299.69
1.00%	PRODESARROLLO	89,707,299.69
1.00%	PROELECTRIFICADORA	89,707,299.69
2.00%	TASA DE CULTURA	179,414,599.37
2.00%	ESTAMPILLA PROCULTURA	179,414,599.37
5.00%	IMPUESTO DE SEGURIDAD	448,536,498.43
	TOTAL ANTICIPO RECIBIDO	7,804,535,071.60
25 - FEB - 2010	REPOSICION DE IMPDT A SEGURIDAD	448,536,498.43
	DINERO FINALMENTE RECIBIDO POR EL CONSORCIO COMO ANTICIPO	8,253,071,571.02

11 JUN 2010
CONSEJO QUE RESE ALIENIA
CONSEJO QUE RESE ALIENIA



25
945

PARAGRAFO 4.- Los dineros provenientes del anticipo del contrato de obra No. 002 de 2010 entregado por el Municipio de Chiriguaná al Consorcio Ambientes escolares del Cesar, **DISPONIBLES EN CAJA Y EN BANCOS** por valor de **OCHO MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$8.046'982.679.04)** los cuales son resultantes de las operaciones administrativas se entregan al Señor **DAVID OROZCO MALDONADO**, Designado Expresamente por los Adquirentes como Nuevo Representante Legal del Consorcio, en la siguiente forma: **CUATRO MIL SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$4.065'642.056)** en efectivo; el cheque de gerencia número **00001** del Banco BBVA por valor de **QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DIECISEIS PESOS M/CTE (\$588'669.016)** que conforman el disponible en caja del Consorcio, **SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$763.750)** en la cuenta corriente No. **3-1610-0-00463-9** del Banco Agrario, **SESENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$66.075.036,71)** en la cuenta de ahorros No. **4-2422-0-03655-8** del Banco Agrario y **TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$3.325.832.820,44)** en la cuenta de ahorros No. **4-1610-0-02062-0** del Banco Agrario que conforman el componente de recursos en Bancos. Se deja constancia por las partes que los dineros en caja y en bancos fueron entregados a la firma de este documento junto con los extractos bancarios que confirman los saldos en las cuentas. Se procederá al cambio de firmas en los bancos a los bancos una vez se cumpla con el requisito de la cláusula tercera, a más tardar a los diez días hábiles siguientes a la firma de este contrato Declarándose a paz y salvo por todo concepto **PARAGRAFO 5.-** Las partes expresamente renuncian al ejercicio de Acciones dirigidas a la resolución de este contrato, a su rescisión o resciliación y en general a cualquier acción que pretenda endilgar responsabilidad alguna a los cedentes respecto del contrato suscrito por el Consorcio con el Municipio de Chiriguaná. **PARAGRAFO 6.-** Los adquirentes asumirán directa y exclusivamente las multas o sanciones que se deriven de la ejecución del Contrato 002 de 2010 suscrito entre el Consorcio Ambientes Escolares del Cesar y el Municipio de Chiriguaná y mantendrán indemnes a los Cedentes de cualquier daño o perjuicio originado por todo tipo de reclamaciones provenientes de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de sus

10 Marzo 2020
Mr. Jose Uides

26
446

subcontratistas con ocasión de la ejecución del contrato No. 002 de 2010 para lo cual se establece que pagarán no solo el importe de las sumas de dinero que se deriven de multas o sanciones por incumplimiento del contrato de obra sino que pagarán cualquier perjuicio causado a los Cedentes en razón de la ejecución del contrato No. 002 de 20 de enero de 2010 celebrado con el Municipio de Chiriguaná cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ DEPARTAMENTO DEL CESAR". TERCERO.- FIRMEZA DEL DOCUMENTO DE CESION Y GARANTIAS: el presente documento de cesión quedara en firme una vez se de alguno de los siguientes situaciones: a) Las garantías establecidas por los primeros consorciados mediante la póliza numero RCCU-563 ante la aseguradora COLSEGUROS se restituyan totalmente por parte de la compañía aseguradora a los cedentes (primeros consorciados) y que se constituyan nuevas garantías con los nuevos consorciados (adquirientes de la cesión) ó b) los nuevos consorciados constituyan una nueva póliza y esta a su vez tenga el aval y aprobación escrita por parte de la oficina jurídica del Municipio de Chiriguaná toda vez que esta se constituye como contratante dentro del contrato de obra No 002 de 2010 la cual fue otorgado a el CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR, con el fin de que esta siga respaldando las obligaciones contractuales pactadas, de lo contrario se declara nulo el documento de cesión, caso en el cual los adquirientes o cesionarios, deberán restituir el total de los dineros entregados, y los derechos, obligaciones y deberes de los consorciados iniciales se mantendrán CUARTO.- PAZ Y SALVO: con la firma de este documento de cesión se ratifica la entrega total del anticipo correspondiente al contrato No. 002 de 20 de enero de 2010 celebrado con el Municipio de Chiriguaná cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ DEPARTAMENTO DEL CESAR". recibido por los cedentes de parte de la Alcaldía de Chiriguaná y que hacen entrega a los nuevos adquirientes o cesionarios para que den cumplimiento del contrato en mención, siendo responsables del correcto manejo e inversión del anticipo, así como de la presentación de informes que la entidad contratante solicite con relación al mismo, así como de la entrega de rendimientos financieros generados por el anticipo que se deberán regresar al municipio de Chiriguaná, adicionalmente se comprometen los adquirientes o cesionarios a mantener indemnes a los cedentes en todo lo relacionado con la ejecución del contrato, cualquier daño, afectación o perjuicio originado por

Fecha: 10- marzo-2020

Firma: M^a Jose Vides

27
447

todo tipo de reclamaciones provenientes de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas con ocasión de la ejecución del contrato No. 002 de 2010, de responsabilidades y requerimientos, del cumplimiento de las obligaciones formales tributarias derivadas del contrato, ya sean nacionales, departamentales o municipales, de los impuestos, gravámenes, tasas y contribuciones de ámbito nacional, departamental o municipal, de las obligaciones laborales, contractuales y de toda índole; que desarrolle o adquieran los adquirentes o cesionarios, de las demandas, sanciones y cualquier proceso administrativo o judiciales que se deriven del incumplimiento de los adquirentes con terceros o subcontratistas QUINTO.- Forman parte integral del presente contrato de cesión de derechos consorciales los siguientes documentos: Estados financieros del Consorcio Ambientes Escolares del Cesar recibidos a satisfacción y suscritos por el representante legal designado por los adquirentes, DAVID OROZCO MALDONADO y contador público, extractos bancarios que confirman los saldos, las cartas de cesión de la cuenta corriente No. 3-1610-0-00463-9 del Banco Agrario, cuenta de ahorros No. 4-2422-0-03655-8 del Banco Agrario y cuenta de ahorros No. 4-1610-0-02062-0 del Banco Agrario suscritas por MARIO VALDERRAMA CORDERO.

Para constancia de lo anterior se firma en Bucaramanga el veinticuatro (24) de mayo del año dos mil diez (2010).

CEDENTES

MARIO VALDERRAMA CORDERO
CC. 13.541.216 de Bucaramanga
RL. VALCO CONSTRUCTORES Y
CONSULTORES LTDA
NIT. 900.010.332-8


RODOLFO SIERRA GOMEZ
CC. 5.706.194 de Piedecuesta
RL. COOPMUNICIPAL
NIT. 804.010.427-0


FERNANDO VALDERRAMA CORDERO
CC. 91.270.374 de Bucaramanga
RL. CONSTRUCTORA VC LTDA
NIT. 804.005.319-3


JOSE ANTONIO ALVAREZ DELGADO
CC. 91.237.454 de Bucaramanga
RL. CODENCO
NIT. 820.003.227-3


28
448

ADQUIRENTES



DAVID OROZCO MALDONADO
CC. 8.703.083 de Barranquilla


GERMAN VILLANUEVA CALDERON
CC. 12.547.660 de Santa Marta



VICTOR CABELLO LONDOÑO
CC. 85.459.388 de Santa Marta
RL. CONSTRUSOCIAL LTDA
NIT. 819.002.537-3


LEONARDO DAVID DELGHANS PABON
CC. 79.987.361 de Santa Marta
RL. BB INGENIEROS LTDA
NIT. 830.005.282-4

ACEPTO LA DESIGNACION COMO NUEVO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO
AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR


DAVID OROZCO MALDONADO
CC. 8.703.083 de Barranquilla

ACEPTAMOS Y AVALAMOS LA CESION OBJETO DE ESTE CONTRATO Y LA
DESIGNACIÓN DEL NUEVO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO AMBIENTES
ESCOLARES DEL CESAR:


JULIO HERNAN ESPINEL MARTINEZ
CC. 19.390.017 de Bogotá
CORPORACION OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A.
NIT. 830.006.821-9

RAMON ARTURO DIAZ CORZO
CC. 77.169.930 de Valledupar
ALCALDE MUNICIPAL
CHIRIGUANA CESAR

Fecha: 10-Marzo-2020
Firmado: Mr. Jose Uides

REP.

11 MAR 2010

29
449

**PÓLIZA O GARANTÍA DEL CONTRATO DE OBRAS
CIVILES No. 002 DEL 20 DE ENERO DE 2010.**

FINANCIERA P
10-Marzo-2020
Firma: Mr Jose Vides

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Referencia 010004036895-49	Sucursal Expedidora BARRANQUILLA	Cod. Sucursal 510	Codigo Punto Venta 0	Ramo 25	No. Póliza 300018730	Anexo 0
Fecha Expedición Día Mes Año 24 05 2010	Vigencia Desde Día Mes Año 19 05 2010	A las Horas 00:00	Vigencia Hasta Día Mes Año 19 05 2015	A las Horas 00:00	Tipo de Movimiento EXPEDICION	Hoja 1/1

DATOS DEL TOMADOR / AFIANZADO

Nombre : CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR	Identificación 900.333.021-9
Dirección : 0	Ciudad : BARRANQUILLA, ATLANTICO
Tipo de contragarantía : PERSONAL/PAGARE/PAGARE	N° Contragarantía : A90460

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Asegurado : MUNICIPIO DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR	Identificación : 892.300.604-2	Teléfono :
Beneficiario : MUNICIPIO DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR	Identificación : 892.300.604-2	Teléfono :

OBJETO DEL SEGURO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO EN VIRTUD DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y ADECUACION DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR.

NOTA : LA VIGENCIA DE ESTABILIDAD ES POR CINCO AÑOS Y COMIENZA A REGIR A PARTIR DEL ACTA FINAL DE OBRAS.

NOTA: EL TOMADOR/AFIANZADO DE LA POLIZA EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR, SE OBLIGA A ABRIR UNA CUENTA BANCARIA QUE SERA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA EL MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRAS ADJUNTO. EN VIRTUD DE DICHO COMPROMISO EL ASEGURADO SOLO PODRA DESEMBOLSAR LOS DINEROS CON CARGO AL CONTRATO ADJUNTO AFIANZADO POR LA COMPANIA, CON EL AVAL DEL INTERVENTOR QUE SEA DESIGNADO PARA TAL EFECTO. EL INCUMPLIMIENTO DE LA ANTERIOR GARANTIA OCASIONARA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO CELEBRADO SEGUN EL ART. 1061 DEL CODIGO DE COMERCIO.

AMPAROS

TIPO DE RIESGO: EJECUCION DE OBRA CIVIL

AMPAROS

	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	PRIMA
CUMPLIMIENTO	19/05/2010	19/09/2011	1,794,145,993.70	7,196,246
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	19/05/2010	19/09/2011	8,970,729,968.50	35,981,229
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZ	19/05/2010	19/05/2014	897,072,996.85	8,970,730
ESTABILIDAD DE LA OBRA	19/05/2010	19/05/2015	1,794,145,993.70	26,926,936

ACLARACIONES

ESTA COPIA COINCIDE CON EL DOCUMENTO ORIGINAL QUE FUE A LA VISTA

11 JUN 2010

Valor Prima \$ 79,075,141	Gastos Expedición \$ 1,000	Total a Pagar \$ 81,076,141	Fecha Límite de Pago 24 / 05 / 2010

Valor Asegurado Total \$ 13,456,094,952.75	Valor Asegurado en Letras TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE.

INTERMEDIARIO

COASEGURO

Nombre	Clave	% de Part.	Nombre Compañía	% Part.	Valor Asegurado
ANAYA DE ROPERO JUVENTIA ISABEL	1544	100.00			


CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR
FIRMA INTERMEDIARIA

10-Marzo-2020
Ma Jose Vides
FIRMA TOMADOR



31
451

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CONTRATOS EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

Referencia 010004036896-90	Sucursal Expedidora BARRANQUILLA	Cod. Sucursal 510	Código Punto Venta 0	Ramo 56	No. Póliza 300003429	Anexo 0
Fecha Expedición Día Mes Año 24 05 2010	Vigencia Desde Día Mes Año 19 05 2010	A las Horas 00:00	Vigencia Hasta Día Mes Año 19 05 2011	A las Horas 00:00	Tipo de Movimiento EXPEDICIÓN	Hoja 1 / 1

DATOS DEL TOMADOR

Nombre : CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR	Identificación : 900.333.021
Dirección : 0	Ciudad : BARRANQUILLA, ATLANTICO Teléfono : 0

DATOS DEL ASEGURADO

Asegurado : MUNICIPIO DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR	Identificación : 892.300.604-2
Dirección : NO DEFINIDA	Ciudad : BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL Teléfono :

DATOS DEL BENEFICIARIO

Beneficiario : TERCEROS AFECTADOS	Identificación :	Teléfono :

OBJETO DEL SEGURO

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y ADECUACION DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR.

EXCLUSIONES:

R.C. CONTRACTUAL

R.C. PROFESIONAL

UBLIMITE : 30% EVENTO/VIGENCIA.

AMPAROS

TIPO DE RIESGO: PREDIOS LABORES Y OPERACIONES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	PRIMA
P.L.O. PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	19/05/2010	19/05/2011	3,588,291,987.40	14,353,168

DEDUCIBLE : 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo: 100.00 SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE

ESTA COPIA CONTROL CON EL DOCUMENTO
ORIGINAL QUE DEBE A LA ENTIDAD

ACLARACIONES


Fecha: 20-05-2010
Firma: MA JOSE VILLO


CONDOR S.A.

Valor Prima \$ 14,353,168	Gastos Expedición \$ 14,353,168	IVA \$ 1,435,316.80	Total a Pagar \$ 15,788,484.80	Fecha Límite de Pago 24 / 05 / 2010

Valor Asegurado Total \$ 3,588,291,987.40	Valor Asegurado en Letras TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MCTE.

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIDO		
Nombre	Clave	% de Part.	Nombre Compañía	% Part.	Valor Asegurado
ANAYA DE ROPERO JUVENTA ISABEL	1544	100.00			


CONDOR S.A.
CIENDE ALFONSO VILLALBA


CIENDE TOMADOR



~~32~~
412-

**ACTAS DE INICIO, SUSPENSIÓN Y REINICIO DE
OBRAS DEL CONTRATO DE OBRAS CIVILES No. 002
DEL 20 DE ENERO DE 2010.**

RECIBIDO
FECHA 10-Marzo-2020
Firma. MA José Vides



CHIRIGUANA
EN BUENAS MANOS

Secretaría de Planeación y Obras Públicas - Municipio de Chiriguana
Departamento del Cesar
República de Colombia

ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRAS N° 002 DEL 20 DE ENERO DE 2.010

CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE CHIRIGUANA
CONTRATISTA :	CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR DAVID OROZCO MALDONADO Representante Legal
INTERVENTOR (E) :	LUIS RAFAEL ROCHA VILLEGAS Secretario de Planeación y Obras Públicas
CONTRATO N°	002 DEL 20 DE ENERO DE 2.010
MODALIDAD :	CONTRATO DE OBRAS
OBJETO :	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA - DEPARTAMENTO DEL CESAR.
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE, (\$ 17.941.459.937.00).
ANTICIPO :	50% DEL VALOR DEL CONTRATO OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 50 CENTAVOS, \$8.970.729.968.50
DURACIÓN:	365 DIAS DE EJECUCION DE OBRA.
FECHA DE INICIO :	FEBRERO 08 DE 2.010
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 08 DE 2.011

En el Municipio de Chiriguana – Departamento del Cesar, se reunieron en el despacho de la secretaria de Planeación y Obras Públicas Municipal los señores: **LUIS RAFAEL ROCHA VILLEGAS**, Secretario de Planeación y Obras Públicas; en su calidad de Supervisor del Contrato y actuando como Interventor de mismo y el señor **DAVID OROZCO MALDONADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.703.083 de

Chiriguana en buenas manos

Dirección calle 7 nro. 5-40 teléfonos 095-5760290 – 5760240 – 5760068.




Secretaria de Planeación y Obras Publicas - Municipio de Chiriguana
Departamento del Cesar
República de Colombia


ACTA DE INICIO
CONTRATO DE OBRAS N° 002 DEL 20 DE ENERO DE 2.010

Barranquilla actuando en representación Legal del **CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR**, identificado con el NIT No. 900.333.021-9, en su calidad de contratista, con el objeto de darle inicio al Contrato de obras N° 002 de fecha 20 de enero de 2.010, y con el fin de aprobar la iniciación de los trabajos, previa las siguientes consideraciones:

1. Que el día 28 de Enero de 2.010, la Alcaldía Municipal de Chiriguana giró el Anticipo correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del Valor del Contrato No. 002 del 20 de enero de 2.010; siendo las 4:00 pm.
2. Que al no existir Interventoría externa contratada por el Municipio de Chiriguana - Cesar, el Secretario de Planeación y Obras Públicas quien es el supervisor del Contrato asume las labores de Interventoría del mismo.

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Chiriguana - Departamento del Cesar a los ocho (08) días del mes de Febrero de 2.010.


LUIS RAFAEL ROCHA-VILLEGAS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS


DAVID OROZCO MALDONADO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR
NIT 900-333.021-9
CONTRATISTA

Chiriguana en buenas manos

Dirección calle 7 nro. 5-40 teléfonos 095-5760290 - 5760240 - 5760068.

10. Marzo 2010
Firma: Ma. Jose Vides



1943



1944



CHIRIGUANA
EN BUENAS MANOS
ALCALDIA MUNICIPAL - FEBRERO 2011

Secretaría de Planeación y Obras Públicas - Municipio de Chiriguana
Departamento del Cesar
República de Colombia

ACTA DE SUSPENSION N° 001- FEBRERO 18 DE 2.010
CONTRATO DE OBRAS N° 002 DEL 20 DE ENERO DE 2.010

CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ
CONTRATISTA :	CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR DAVID OROZCO MALDONADO Representante Legal
INTERVENTOR (E) :	LUIS RAFAEL ROCHA VILLEGAS Secretario de Planeación y Obras Públicas
CONTRATO N°	002 DEL 20 DE ENERO DE 2.010
MODALIDAD :	CONTRATO DE OBRAS
OBJETO :	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA - DEPARTAMENTO DEL CESAR.
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE. (\$ 17.941.459.937.00).
ANTICIPO :	50% DEL VALOR DEL CONTRATO OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 50 CENTAVOS. \$8.970.729.968.50
DURACIÓN :	365 DIAS DE EJECUCION DE OBRA
ACTA DE INICIO :	FEBRERO 08 DE 2.010
ACTA SUSPENSION N° 001:	FEBRERO 18 DE 2.010
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	08 DE FEBRERO DE 2.011

En el Municipio de Chiriguana – Departamento del Cesar, se reunieron en el despacho de la secretaría de Planeación y Obras Públicas Municipal los señores: **LUIS RAFAEL**

Chiriguana en buenas manos

Dirección calle 7 nro. 5-40 teléfonos 095-5760290 – 5760240 – 5760068.





Secretaría de Planeación y Obras Públicas - Municipio de Chiriguana
Departamento del Cesar
República de Colombia

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 001- FEBRERO 18 DE 2.010
CONTRATO DE OBRAS N° 002 DEL 20 DE ENERO DE 2.010

ROCHA VILLEGAS, Secretario de Planeación y Obras Públicas; en su calidad de Supervisor del Contrato y actuando como Interventor de mismo y el señor **DAVID OROZCO MALDONADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.703.083 de Barranquilla actuando en representación Legal del **CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR**, identificado con el NIT No. 900.333.021-9 en su calidad de contratista, con el objeto de suspender el Contrato de obras N° 002 de fecha 20 de enero de 2.010, de suspender las actividades, previa las siguientes consideraciones:

1. Que el día 08 de Febrero se realizó el Acta de Inicio entre la **CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR**, Representada por la Dr. **DAVID OROZCO MALDONADO** y la Oficina de Planeación y Obras Públicas de este Municipio, asumió la Interventoría temporal de la obra en referencia, mientras la Administración contrataba una Interventoría Externa, esta oficina tuvo la voluntad de asumir esta responsabilidad pero en el transcurso del tiempo y notando la falta de personal idóneo, capacitado y la falta de tiempo del personal adscrito a la oficina para hacerle el control respectivo a dicho contrato, hoy vemos que realmente no tenemos la capacidad operativa para ejercerla por lo anteriormente sustentado, lo que recomendamos, esperar a que el proceso contractual para contratar al Interventor externo, ya sea persona natural o jurídica que tenga el tiempo, el personal idóneo y capacitado para ejercer esta Interventoría de manera eficiente.
2. En cumplimiento con lo establecido en el contrato de la referencia, se realizó con El secretario de Planeación y Obras Públicas, Arq. Luis Rafael Rocha Villegas, en su calidad de Supervisor del Contrato y actuando como Interventor (E) del mismo y el señor David Orozco Maldonado, Representante Legal del Consorcio, las visitas a los colegios objeto del presente contrato, para verificar el alcance en cada uno de ellos, durante estas se recogieron una serie de recomendaciones realizadas por los directores y coordinadores de estas instituciones en las cuales expresaron unas nuevas necesidades que en el acta de concertación del proyecto con fecha Mayo 28 del 2.009, no fueron contempladas. Por tal motivo se estudiarán estas necesidades. (VER ANEXO)
3. Que al no existir Interventoría externa contratada por el Municipio de Chiriguana - Cesar, se suspende las actividades concernientes a este contrato hasta que el Municipio realice la contratación respectiva.




CHIRIGUANA
EN BUENAS MANOS
MUNICIPIO DE CHIRIGUANA - DEPARTAMENTO DEL CESAR


Secretaría de Planeación y Obras Públicas - Municipio de Chiriguana
Departamento del Cesar
República de Colombia

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 001- FEBRERO 18 DE 2.010
CONTRATO DE OBRAS N° 002 DEL 20 DE ENERO DE 2.010

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Chiriguana – Departamento del Cesar, a los dieciocho (18) días del mes de Febrero de 2.010.


LUIS RAFAEL ROCHA VILLEGAS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS
PÚBLICAS


DAVID OROZCO MALDONADO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES
DEL CESAR
NIT 900-333.021-9
CONTRATISTA

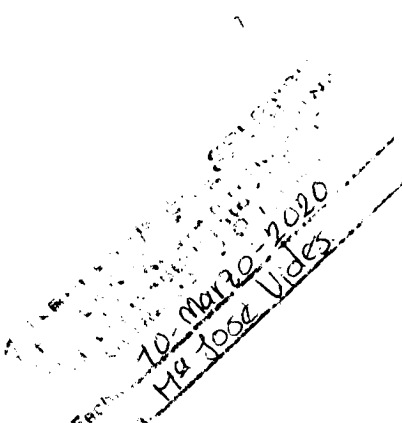
Fecha: 10-Marzo-2020
Firma: Ma Jose Vides

Chiriguana en buenas manos

Dirección calle 7 nro. 5-40 teléfonos 095-5760290 – 5760240 – 5760068.



CHIRIGUANA
EN BUENAS MANOS

Secretaría de Planeación y Obras Públicas - Municipio de Chiriguana
Departamento del Cesar
República de Colombia

ACTA DE REINICIO
CONTRATO DE OBRAS Nº 002 DEL 20 DE ENERO DE 2.010

CONTRATANTE :	MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ
CONTRATISTA :	CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR DAVID OROZCO MALDONADO Representante Legal
INTERVENTOR:	UNION TEMPORAL CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEGUNDA ETAPA. R/L. ING. RAFAEL PEREZ BRIZNEDA
CONTRATO Nº	002 DEL 20 DE ENERO DE 2.010
MODALIDAD :	CONTRATO DE OBRAS
OBJETO :	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA - DEPARTAMENTO DEL CESAR.
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE. (\$ 17.941.459.937.00).
ANTICIPO :	50% DEL VALOR DEL CONTRATO OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 50 CENTAVOS. \$8.970.729.968.50
DURACIÓN :	365 DIAS DE EJECUCION DE OBRA.
FECHA DE INICIO :	FEBRERO 08 DE 2.010
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	FEBRERO 08 DE 2.011
FECHA DE SUSPENSION Nº 001	18 DE FEBRERO DE 2.011

En el Municipio de Chiriguana - Departamento del Cesar
la secretaria de Planeación y Obras Públicas
ROCHA VILLEGAS, Secretario de Planeación
Supervisor del Contrato, el señor **DAVID O**
cédula de ciudadanía No. 8.703.083 de Barranquilla

Chiriguana en buenas manos

Dirección calle 7 nro. 5-40 teléfonos 095-5760290 - 5760240 - 5760000

10-marzo-2010
Firma: *Ha Jose Vides*



39
459


ACTA DE REINICIO
CONTRATO DE OBRAS N° 002 DEL 20 DE ENERO DE 2.010


del **CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR**, identificado con el NIT No. 900.333.021-9, en su calidad de contratista, y el **ING. RAFAEL PEREZ BRIZNEDA EN REPRESENTACION DE LA UNION TEMPORAL CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEGUNDA ETAPA**, con el objeto de dar **reinicio** al Contrato de obras N° 002 de fecha 26 de julio de 2.010.


1. Debido a que la **INTERVENTORIA EXTERNA**, ya fue contratada por el Municipio de Chiriguana - Cesar, y será asumida por la **UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEGUNDA ETAPA**, según contrato de Interventoría N° 037 del 17 de marzo de 2.010.
2. Que la reconfiguración **CONSORCIAL** que el contratista de obras civiles solicito al Municipio y la nueva póliza de garantía refrendada por la nueva estructura organizacional (contratista de obra), fueron debidamente aprobadas por la Administración y avaladas por la Interventoría después del cumplimiento de todos los requisitos exigidos tanto en los pliegos de condiciones de la licitación pública que dio a origen a dicho contrato de obra, como a las cláusulas contractuales que rigen el mismo.

Para mayor constancia se firma en el Municipio de Chiriguana - Departamento del Cesar, a los veintiséis (26) días del mes de julio de 2.010.


LUIS RAFAEL ROCHA VILLEGAS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS


RAFAEL ANGEL PEREZ BRIZNEDA
INTERVENTOR EXTERNO CONTRATADO



DAVID OROZCO MALDONADO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO
DEL CESAR
NIT 900.333.021-9
COP


Fecha: 10-Marzo-2020
Firma: M4 Jose Vido

70
460

**CERTIFICACIONES DEL PAGO DE PARAFISCALES
DENTRO DEL CONTRATO DE OBRAS CIVILES No. 002
DEL 20 DE ENERO DE 2010.**

Fecha 10-marzo-2020
Firma Ma Jose Udes



CONSTANCIA DE PAGO AFILIADOS

Fecha de Creación Reporte: sábado, 05 febrero 2011 10:42:56

Periodo Cotización: 2011-01

Planilla Nro: 8903490668

Se certifica que en la fecha 2011/02/04, la empresa JAIRO TORRES, con documento de identificación N72053864, cancelo los aportes de seguridad social correspondientes los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

I. DATOS DE AFILIADOS:										
1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MIN.	11. Pagó ESAP.
CC 7218261	ACUÑA ROBERTO	PORVENIR	DAFESALUD MEDICINA PREPAGADA (EPS)	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	SI	SI	No	SI	SI
CC 77103988	CAAMANO CARLOS	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S. PENSIONES	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	SI	SI	No	SI	SI
CC 85441322	CADENA AQUILINO	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S. PENSIONES	EPS SURA	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	SI	SI	No	SI	SI
CC 77175850	CASTRILLO ALEJANDRO	HORIZONTE	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	SI	SI	No	SI	SI
CC 77191714	DAZA JUAN	ING FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	SI	SI	No	SI	SI
CC 1003121687	FLOREZ JOEL	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S. PENSIONES	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	SI	SI	No	SI	SI
CC 7438962	GONZALEZ JOSE	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S. PENSIONES	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	SI	SI	No	SI	SI
CC 8727776	GONZALEZ PEDRO	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S. PENSIONES	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	SI	SI	No	SI	SI
CC 7867	GUERRA ARMANDO	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S. PENSIONES	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	SI	SI	No	SI	SI
	GUERRA ARMANDO	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S. PENSIONES	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	SI	SI	No	SI	SI
		INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S. PENSIONES	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	SI	SI	No	SI	SI
		HORIZONTE	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	SI	SI	No	SI	SI
		INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S. PENSIONES	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	SI	SI	No	SI	SI
		PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	SI	SI	No	SI	SI
		PORVENIR	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	SI	SI	No	SI	SI
		PORVENIR	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	SI	SI	No	SI	SI

Página 1 de 2

Bogotá 485 4485 - Cali 485 9444 - Medellín 604 2727 y 448 2727 - Barranquilla 385 2444 - Otras ciudades 018000 519977. Línea Ética: 018000 517806

segúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.


461

Se certifica que en la fecha 2011/02/04, la empresa JAIRO TORRES, con documento de identificación N72053864, cancelo los aportes de seguridad social correspondientes los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

I. DATOS DE AFILIADOS:										
1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. AFP	6. CCF	7. Pago ICBF	8. Pago SEHA	9. Pago FSP	10. Pago IAN	11. Pago ESAP
CC 1083433006	PACHECO JUAN	INPS FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	Si	Si	No	Si	Si
CC 92096697	PEINADO MANUEL	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S. PENSIONES	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	Si	Si	No	Si	Si
CC 87673432	PEREZ EVARISTO	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S. PENSIONES	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	Si	Si	No	Si	Si
CC 72147564	POLO LUIS JAVIER	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S. PENSIONES	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	Si	Si	No	Si	Si
CC 15077052	PRIMERA ALBERT	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S. PENSIONES	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	Si	Si	No	Si	Si
CC 0540069	RAMOS UBALDO	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	Si	Si	No	Si	Si
CC 7818604	ROCHA GUSTAVO	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S. PENSIONES	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	Si	Si	No	Si	Si
CC 92058829	RODRIGUEZ MARCIAL	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S. PENSIONES	SOLSALUD E.P.S. S.A.	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	Si	Si	No	Si	Si
CC 7616869	SEGOLIA ROBERTO	PORVENIR	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	Si	Si	No	Si	Si
CC 10940746	VEGA MACARIO	PORVENIR	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	Si	Si	No	Si	Si
CC 7462247	VILLAFANE FELIX	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S. PENSIONES	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL	Si	Si	No	Si	Si

Firma: *[Firma]*
 Fecha: 10 Mayo 2020
 Hija Jose Udes

462
42



CONSTANCIA DE PAGO AFILIADOS

Fecha de Creación Reporte: sábado, 05 febrero 2011 10:42:50

Periodo Cobertura: 2011-01

Planilla Nro: 8903490668

Código Sucursal: 01

Nombre Sucursal: PRINCIPAL

Se certifica que en la fecha 2011/02/04, la empresa JCSUMINISTRO, con documento de identificación N44205128, cancelo los aportes de seguridad social correspondientes los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

I. DATOS DE AFILIADOS:											
1. Documento	2. Apellidos y Nombres		3. AFP	4. EPS	5. ARP	6.CCF	7. Pagó ICBF.	8. Pagó SENA.	9. Pagó FSP	10. Pagó MIN.	11. Pagó ESAP.
CC 7950717	MEYER	OROZCO	NINGUNA AFP	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	No	No	No	No	No
CC 7961599	GEME	ZAMORA	NINGUNA AFP	EPS SURA	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	No	No	No	No	No
CC 2241442	AHUMADA	ALBERTO	NINGUNA AFP	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	No	No	No	No	No
CC 1049532190	VILLA	OROZCO	NINGUNA AFP	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	NINGUNA CCF	No	No	No	No	No
	RAYNEL	DAVID									

Fecha: 10-Marzo-2010
Firma: Ha Jose Uldes

Página 1 de 1

ILACE OPERATIVO, Líneas de Servicio al Cliente: Bogotá 485 4485 - Cali 485 9444 - Medellín 604 2727 y 448 2727 - Barranquilla 385 2444 - Otras ciudades 018000 519977. Línea Ética: 018000 517806

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

463

44
464

INFORMACIÓN TÉCNICA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
Ministerio de Salud
Instituto Nacional de Salud
Fecha: 10-marzo-2020
Firma: M^{ra} Jose Udes.

45
465

DISEÑO DE MEZCLAS DE LOS CONCRETOS VACIADOS EN OBRA.

10-Marzo-2020
Ma. Jose Vides

46
466

FERNANDO ANAYA CARRASQUILLA
INGENIERO CIVIL – ESTUDIOS DE SUELOS
GEOTECNIA Y MATERIALES - CONTROL DE CALIDAD

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO

Solicitante: CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR
Obra: Construcción Y Adecuación De Ambientes Escolares En Las Instituciones Y Centros Educativos Del municipio De Chiriguana Departamento Del Cesar
Fecha: 26 de Julio de 2.010
Resistencia: 3000 PSI a la compresión a 28 días Asentamiento: 3 pulgadas
Materiales: Cemento Tipo Portland
Agregado Grueso: Granzón Cantera Agregados Chiriguana Ltda.
Agregado Fino: Arena lavada del Rio la Mula.

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Cemento:	Peso Específico	3150 kg/M3
	Peso Unitario	1300 kg/M3

Agregado grueso:

Peso específico bulk	2460 kg/M3
Peso específico SSS	2543 kg/M3
Peso específico aparente	2683 kg/M3
Absorción	3.4%
Peso unitario suelto	1329 kg/M3
Peso unitario compactado	1464 kg/M3
Tamaño máximo	1"

Agregado fino:

Peso específico bulk	2585 kg/M3
Peso específico SSS	2604 kg/M3
Peso específico aparente	2635 kg/M3
Absorción	0.72%
Unitario suelto	1506 kg/M3
Unitario compactado	1735 kg/M3
Módulo de finura	3.2

Fact. 10-Marzo-2020
H. J. J. Vides

47
467

FERNANDO ANAYA CARRASQUILLA
INGENIERO CIVIL – ESTUDIOS DE SUELOS
GEOTECNIA Y MATERIALES - CONTROL DE CALIDAD

PROPORCIONES EN VOLUMEN SUELTO POR M3 DE CONCRETO

Agua	0.178 M3
Cemento	0.279 M3 = 7.3 bultos de cemento
Agregado fino	$725/1506 = 0.48$ M3
Agregado grueso	$1126 / 1329 = 0.87$ M3

PROPORCIONES EN VOLUMEN SUELTO

C	A	T
1	:	1.8 : 3.1

PROPORCIONES PARA UN BULTO DE CEMENTO

Agua	24.4 Lts
Cemento	1 bulto (50 kg)
Agregado Fino	0.065 M3
Agregado Grueso	0.119 M3

RECIBIDO EN LA OFICINA DE
INGENIERIA CIVIL - ESTUDIOS DE SUELOS
Y MATERIALES - CONTROL DE CALIDAD
FECH: 10-marzo-2020
Firma: Ma Jose Vides

48
468

FERNANDO ANAYA CARRASQUILLA
INGENIERO CIVIL – ESTUDIOS DE SUELOS
GEOTECNIA Y MATERIALES - CONTROL DE CALIDAD

VOLUMEN DE LOS AGREGADOS

$$1.00 \text{ M}^3 - 0.295 \text{ M}^3 = 0.705 \text{ M}^3$$

VOLUMEN DE LOS AGREGADOS GRUESOS

$$v_c = b/b_o = 0.79$$

$$b_o = 1464/2683 = 0.545 \text{ M}$$

$$b_o = 0.79 / 0.545 = 0.430 \text{ M}^3$$

VOLUMEN DEL AGREGADO FINO

$$V_{af} \text{ } 0.705 \text{ M}^3 - 0.430 \text{ M}^3 = 0.275 \text{ M}^3$$

PESO DE LOS MATERIALES SECOS POR METRO CÚBICO DE CONCRETO

Agua	178 lts
Cemento	363 kgs
Arena	$0.0275 \times 2635 = 724.6 \text{ kgs}$
Agregado Grueso	$0.43 \times 2683 = 1154.0 \text{ kgs}$

RELACIÓN AGUA CEMENTO

$$R = A/C = 0.53$$

$$\text{AGUA} = 178 \text{ lts}$$

$$\text{CEMENTO } 363 \text{ kgs}$$

VOLUMEN DE LA PASTA

Aire	0.010 M ³
Agua	0.178 M ³
Cemento	<u>0.010 M³</u>
	0.295 M ³

Fact. 10 marzo 2020
Firma: Mr. José Vides

49
4609

**ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS
AGREGADOS FINOS Y GRUESOS DE LOS CONCRETOS
VACIADOS EN OBRA.**


10 - marzo 2020
H# José Vides

50
470

FERNANDO ANAYA CARRASQUILLA
INGENIERO CIVIL - ESTUDIOS DE SUELOS
GEOTECNIA Y MATERIALES - CONTROL DE CALIDAD

PROYECTO:	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR	FECHA:	26 DE JULIO DE 2010
LOCALIZACIÓN:			
DESCRIPCIÓN:	GRANZON CANTERA AGREGADOS CHIRIGUANA LTDA	SOLICITANTE:	JORGE BARRERA
SONDEO No.:	PROFUNDIDAD:	MUESTRA No.:	1

LÍMITE LÍQUIDO			
No de golpes			
Log No. Golpes			
Vidrio No.			
P1			
P2			
P3			
% Humedad			

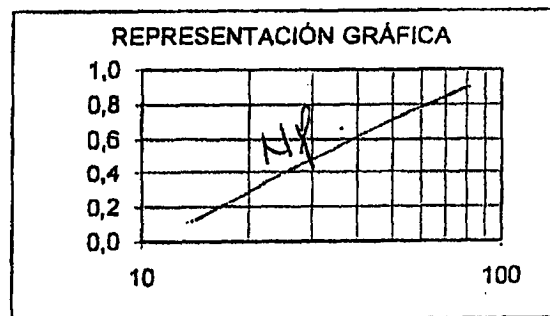

LÍMITE PLÁSTICO		
Vidrios No.		
P1		
P2		
P3		
% Humedad		

Humedad 2,8
 Límite Líquido NL
 Límite Plástico NP
 Índice Plasticidad NP
 Índice de Grupo 0
 A.A.S.H.T.O.:
 U.S.C.

Cc: _____
 Cu: _____
 M.Org: _____
 Turba: _____

GRADACIÓN						
P1=	1170	P2=			Norma	Norma
Tamiz	Reten	% Reten	% Ret Acum	% Pasa		
Pulg.						
3"						
2 1/2"						
2"						
1 1/2"	0	0		100	90-100	
1"	505,5	43,2		57,0	20-55	
3/4"	354,8	30,0		27,0	0-15	
1/2"	244,3	21,0		6,0		
3/8"	48	4,0		2,0	0-5	
4	11	1,0		1,0		
FONDO	6,4	1,0				

Fecha: 10-marzo-2020
 Firma: Ma José Vides

OBSERVACIONES:

LABORATORISTA

INGENIERO
 2009202-1255 AH.


54
47f

FERNANDO ANAYA CARRASQUILLA
INGENIERO CIVIL – ESTUDIOS DE SUELOS
GEOTECNIA Y MATERIALES - CONTROL DE CALIDAD

PROYECTO:	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR	FECHA:	28 DE JULIO DE 2010
LOCALIZACIÓN:			
DESCRIPCIÓN:	ARENA LAVADA DE RIO		
SONDEO No.	PROFUNDIDAD:	MUESTRA No.:	1
		SOLICITANTE:	JORGE BARRERA

LÍMITE LÍQUIDO			
No de golpes			
Log No. Golpes			
Vidrio No.			
P1			
P2			
P3			
% Humedad			

LÍMITE PLÁSTICO		
Vidrios No.		
P1		
P2		
P3		
% Humedad		

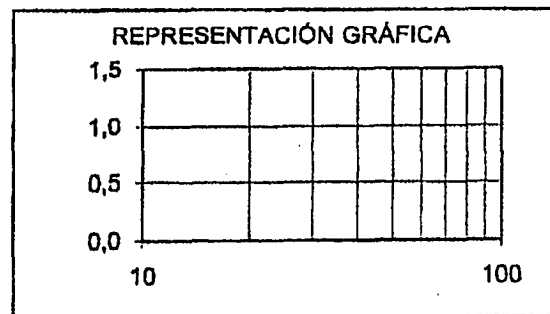

Humedad	3,6
Límite Líquido	NL
Límite Plástico	NP
Índice Plasticidad	NP
Índice de Grupo	0
A.A.S.H.T.O.:	
U.S.C.	SM

GRADACIÓN				
P1=	1033	P2=	950	Norma
	Tamiz Pulg.	Peso - Reten	% Reten % Pasa	
	8	0	100	80-100
	10	0	100	
	16	0	100	50-85
	30	368,3	35,635,6	64,4
	40	286,4	25,8	38,8
	50	163,9	15,9	22,7
	100	151,4	14,6	8,1
	FONDO	83,9	8,1	
	MF		2,67	

10-marzo-2020
 Ma Jose Vides

OBSERVACIONES:

[Signature]
 LABORATORISTA

[Signature]
 Vo.Bo. INGENIERO
 008202-12555 AT1.

~~52~~
472

**ENSAYOS DE LABORATORIO O PRUEBAS DE
RESISTENCIA DE LOS CONCRETOS VACIADOS EN
OBRA.**

FECHAS DE EJECUCIÓN DE LOS ENSAYOS
10-marzo-2020
Firma: M^a Jose Vides

53
473

COLEGIO MANUEL GERMAN CUELLO - RINCONHONDO		
RELACION DE FUNDICION DE CONCRETO		
FECHA	ACTIVIDAD	TESTIGO
05/02/2011	FUNDICION DE COLUMNA DE LOS EJES M1-H1	CILINDRO No 25
09/02/2011	FUNDICION DE VIGAS DE CIMENTACION DE LOS EJES M9,P8 Y P6	CILINDRO No 26
10/02/2011	FUNDIDA DE VIGA CIMIENTO DE LOS EJES M6-P6	CILINDRO No 27
11/02/2011	FUNDIDA DE PEDESTAL EJES F2, H2, Y H1	CILINDRO DE PRUEBA No 21
12/02/2011	FUNDIDA DE COLUMNAS DEL EJE 05, g5-g4, e4-g4, g4-j4	CILINDRO DE PRUEBA No 22
17/02/2011	FUNDIDA DE VIGAAS DE CIMIENTOS DE LOS EJES MO-01-01-02-M1-M2	CILINDRO DE PRUEBA No 23
14/02/2011	FUNDIDA DE VIGAAS DE CIMIENTOS DE LOS EJES MO-01-01-02-M1-M2	CILINDRO DE PRUEBA No 24
15/02/2011	FUNDIDA DE VIGAAS DE CIMIENTOS DE LOS EJES MO-01-01-02-M1-M3	CILINDRO DE PRUEBA No 25
22/02/2011	FUNDIDA DE VIGAS DE CIMIENTOS DE LOS EJES F2,F1-F1H1,H1,J1	CILINDRO DE PRUEBA No 26
17/02/2011	FUNDIDA DE VIGAAS DE CIMIENTOS DE LOS EJES MO-01-01-02-M1-M5	CILINDRO DE PRUEBA No 27
18/02/2011	FUNDIDA DE VIGAAS DE CIMIENTOS DE LOS EJES MO-01-01-02-M1-M6	CILINDRO DE PRUEBA No 28


 Fecha: 10- marzo-2020
 Firma: Ma Jose Uides

54
474

COLEGIO SANTA RITA DEL CRUCE		
RELACION DE FUNDICION DE CONCRETO		
FECHA	ACTIVIDAD	TESTIGO
FEB-01-11	FUNDICION DE PRIMER TRAMO DE RAMPA	CILINDRO DE PRUEBA No 29

10-Marzo-2020
Ma Jose Vides

55
475

COLEGIO DE LA SIERRA		
RELACION DE FUNDICION DE CONCRETO		
FECHA	ACTIVIDAD	TESTIGO
FEB-02-11	FUNDIDA DE ESTRUCIURA DE LOSA ENTREPISO	CILINDRO No 30 Y 31
FEB-04-12	FUNDIDA DE PLANTILLA DE LOSA ENTREPISO	CILINDRO No 32

Fecha 10 marzo 2020
Firma M^a Jose Vela

56
476

Fecha 10-Marzo-2020
Firma: Mr. Jose Vides

**INFORME DE AVANCE DE OBRAS DEL CONTRATO
DE OBRAS CIVILES No. 002 DEL 20 DE ENERO DE
2010.**

57

477

FECHA: 10-Marzo-2020
Firma: M4 Jose Vides

ESTADO DE AVANCE DE LAS OBRAS EN LOS PLANTELES EN EJECUCIÓN.



INTERVENTORIA

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS OBRAS

CONTRATO: CONSTRUCCION Y ADECUACIONES DE
AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y
CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA

CONTRATISTA: CONSORCIO AMBIENTES
ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISION DEL CONTRATO: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS
PUBLICAS

PERIODO: ENERO DEL 2011 A FEBRERO DEL 2011
FECHA: FEBRERO 26 DEL 2011

OBRA	% DE AVANCE	CUMPLE CON EL CRONOGRAMA S/N	OBSERVACIONES
INSTITUCION RAFAEL ARGOTE VEGA SEDE B	90,00%	NO	SE ESTA CUMPLIENDO CON LO PACTADO EN EL CRONOGRAMA, EN ESTE MOMENTO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ACABADOS.
ESCUELA DE LA ESTACION	93,00%	NO	NO SE HA CUMPLIDO CON EL CRONOGRAMA INICIAL DE LA OBRA DEBIDO A QUE ESTA SE REINICIO HACE POCO CON LO CUAL NO ESTA ACORDE CON LA PROGRAMACION DE LA OBRA.
ESCUELA DE SANTA RITA EL CRUCE	69,00%	NO	NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LO PACTADO EN EL CRONOGRAMA DE OBRAS.
ESCUELA LA SIERRA	60,00%	NO	NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LO PACTADO EN EL CRONOGRAMA, EN ESTE MOMENTO SE FUNDIÓ LA LOSA DE ENTREPISO DEL BLOQUE DE APOYO ACADEMICO.
INSTITUCION MANUEL GERMAN CUELLO No 1	9,00%	NO	NO SE HA CUMPLIDO CON EL CRONOGRAMA INICIAL DE LA OBRA DEBIDO A QUE FALTA MAS PERSONAL EN EL SITIO DE LAS OBRAS Y A PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.

Firma:

Nombre: ARQ. MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA

478
85



59
4709

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO COMO CONSTANCIA DE VERIFICACIÓN DEL RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

GOBIERNO DEL DISTRITO DE
MUNICIPIO DE CHIRIQUÍ
ALCALDIA MUNICIPAL
Este Documento es Fiel
Copia de su Original.
Fecha: 10-Marzo-2020
Firma: M^{te} José Vides.

COMITÉ TÉCNICO DE OBRA No 004

CONTRATO DE OBRA 002 DEL 2010

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ

CONTRATO No: 002 del 2010
FECHA: 18 Febrero del 2011
LUGAR : Oficina de Planeación y Obras Públicas.
HORA : 11:00 A.M.

60
480

MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ
ALCALDIA MUNICIPAL
Copia de su Original.
10- marzo-2020
M^{re} José Vides

ASISTENTES: Dr., **RAMON ARTURO DIAZ CORZO**, Alcalde Municipal, Dr. **WILLIAM ELIAS CASTRO DAZA** Asesor Jurídico Externo del Municipio de Chiriguana, Arquitecto **LUIS RAFAEL ROCHA VILEGAS**, Secretario de Planeación y Obras públicas, Arquitecto **JAIME MERCADO RUIZ** Coordinador Técnico de Interventoría, Arquitecto **MIGUEL ANTONIO VARGAS** Coordinador Administrativo de Interventoría, Arquitecto **XAVIER BERDUGO** Residente de Interventoría todos ellos, en representación directa de la Unión Temporal **Consultoría INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA**, encargada de la Interventoría, y por otra parte; el Arquitecto **ERNESTO ARDUZ** en su condición de Coordinador de las Obras en las Instituciones Educativas, y el Arquitecto **JAIRO HERAZO** como Residente del proyecto Rafael Argote Vega sede B, en representación directa del Consorcio **AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR**, quien tiene a su cargo las obras Civiles objeto del contrato No.002 de 2010.

OBJETO: Dar inicio al comité de obra No 004 del Contrato de obra No 002 del 2010 cuyo Objeto es: "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ."

MOTIVACION:

La Administración Municipal "CHIRIGUANA EN BUENAS MANOS", convoca el presente Comité Técnico, como herramienta administrativa ajustada con la normatividad aplicable, tomando como referentes las inquietudes de la supervisión ejercida por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas y a los reiterados llamados de Atención y Oficios que la Interventoría ha enviado hasta la fecha al Contratista de las Obras con relación al atraso evidente que presentan las obras referentes al Contrato de obra No 002-2010.- Con base en lo anteriores considerandos, el presente Comité Técnico tiene como objeto, analizar y discutir los diferentes factores que vienen generando esta situación. Los temas a tratar se derivan de las diferentes situaciones que se presentan en atención de la ejecución de las obras previstas derivadas del Contrato 002-2010 y de la adecuada inversión de los recursos del Estado en beneficio de la comunidad educativa asociada al fortalecimiento de la cobertura educativa en las Instituciones Educativas oficiales intervenidas.

ANTECEDENTES:

En el desarrollo de los Comité anteriores, se trataron los siguientes temas:

TRANSPORTE Y VIÁTICOS.- La Interventoría solicitó al Contratista, darle solución definitiva a lo referente al transporte de los Profesionales Residentes del Contratista, desde su sitio de origen al sitio de las Obras al inicio de las labores semanales, evitándole a la Interventoría tener que suspender las actividades de la Obra en los diferentes frentes de trabajo, donde NO se podrán iniciar labores hasta tanto no se haga presente el responsable de la misma.

CAJA MENOR.- La Interventoría hizo énfasis en la carencia de una caja menor acorde con el monto del Contrato y lo que es mucho más grave, en algunos frentes de obra, ni siquiera existe

COMITÉ TÉCNICO DE OBRA No 004

CONTRATO DE OBRA 002 DEL 2010

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ

caja menor; por lo cual, en muchas oportunidades, se han tenido que suspender actividades indispensables en las obras, porque físicamente no hay dinero para comprar elementos que surjan de algún imprevisto o para combustibles, transportes etc., lo que ha impedido el normal y correcto avance de las obras.

PROGRAMACIÓN DEL SUMINISTRO OPORTUNO DE MATERIALES EN LOS DISTINTOS FRENTE DE OBRA. La Interventoría ha hecho observaciones sobre el tema relacionado con Los materiales o insumos básicos necesarios para la ejecución del proyecto, los cuales son remitidos desde la Oficina de Barranquilla del Contratista de Obras a los diferentes sitios o frentes de trabajo, éstos deben hacerse con la suficiente antelación, dentro del tiempo estipulado y en las cuantías estipuladas en los pedidos, para de esta forma no afectar la programación de obras como ha venido sucediendo.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS EN OBRA. Para el óptimo desarrollo de las obras, se han hecho observaciones por medio escrito, en las que se le exige al contratista, que en cada uno de los diferentes frentes de trabajo, cuente "in situ" (no estar trasladándolos permanentemente de plazas) con los equipos y herramientas requeridos y acordes con las actividades a realizar en cada fecha.- Igualmente, proceda a hacersele mantenimiento periódico y preventivo a los equipos, para evitar traumatismos en las obras.

LISTADO DEL PERSONAL LABORANDO.- Se ha hecho énfasis por parte de la Interventoría en el reporte semanal oportuno, por parte de los Residentes de Obra, del listado del personal que labora en cada uno de los frentes durante ese periodo de tiempo, como principio elemental de organización y porque además, esto le permite hacer un seguimiento y corroborar a la Interventoría que el Contratista de Obras esté a paz y salvo con el sistema de salud, pensiones y riesgos profesionales, pues la Interventoría no dejará realizar ninguna actividad de obra, hasta tanto, todo el personal esté debidamente asegurado y que cuente con los elementos mínimos de seguridad industrial.

PAGO OPORTUNO Y COMPLETO DE LOS ROLES DE PERSONAL.- Con extrañeza y mucha preocupación, esta Interventoría ha venido observando en reiteradas oportunidades, el inconformismo manifestado públicamente por los oficiales y maestros de obra, quienes se quejan permanentemente de que las nóminas son recortadas aparentemente sin justa causa o explicación alguna, desde la oficina matriz del contratista en Barranquilla.- Es casi que un hecho cumplido en cada pago, las quejas permanentes y el inconformismo del personal, lo cual afecta el normal desarrollo de las labores en obra, pues muchas veces se ha dado el caso de paralización de labores o el retiro o abandono voluntario de algún personal de obreros y oficiales. Es importante para el normal desarrollo de las obras, que el Contratista de Obras supere estos impases, mediante el acuerdo claro y preciso con sus trabajadores, de una metodología que deberá implementar en tal sentido y un listado de precios de mano de obra pre-establecidos.

Anotado lo anterior se da inicio a las intervenciones objeto del presente comité:

- Los Arquitectos JAIME MERCADO RUIZ y MIGUEL ANTONIO VARGAS, Residentes de Interventoría, en su calidad de Coordinadores Técnico y Administrativo de Campo **respectivamente, hacen un análisis** y una verificación exhaustiva entre la Programación de Obras presentada por el Contratista y el Avance Real de las Obras de las Cinco (5) Instituciones que se encuentran actualmente en ejecución, anotando lo siguiente:

1- La Institución Educativa del Corregimiento de La Sierra comenzó sus actividades el día 15 de Octubre del 2010, teniendo un plazo de entrega inicial de cuatro meses, es decir se entregaría esta obra el día 15 de Febrero del 2011, pero hasta la fecha de hoy el porcentaje de avance es del 51%,

COPIA DEL DOCUMENTO
AL CALIFICADO MUN. CIRA
Este Documento es Fiel
Copia de su Original.
10-Marzo-2010

61
481

COMITÉ TÉCNICO DE OBRA No 004

CONTRATO DE OBRA 002 DEL 2010

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ

por motivos derivados del fuerte invierno que ha azotado esta región del país se realizó una Reprogramación de las obras quedando esta para entrega final en la segunda semana del mes de Marzo del 2011, pero debido al lento avance de las obras de esta Institución esta Interventoría ve poco probable su terminación para la fecha antes descrita, por lo que en términos generales el contratista ha incumplido con los términos inicialmente pactados.

2- La Institución Educativa Santa Rita del Cruce de La Sierra comenzó sus actividades el día 13 de Septiembre del 2010, teniendo un plazo de entrega inicial de cuatro meses, es decir se entregaría esta obra el día 15 de Enero del 2011, según el ajuste a la programación inicial de las obras debido al invierno, se haría entrega final de esta obra en la segunda semana del mes de Marzo, pero hasta la fecha de hoy el porcentaje de avance es del 60%, por lo que en términos generales para la Interventoría el contratista ha incumplido con los términos inicialmente pactados ya que el tiempo es muy corto para terminar esta escuela.

3- La Institución Educativa La Estación comenzó sus actividades el día 11 de Octubre del 2010, teniendo un plazo de entrega inicial de dos meses, es decir se entregaría esta obra el día 11 de Diciembre del 2010, según el ajuste a la programación inicial de las obras debido al invierno, se haría entrega final de esta obra para el día 30 de Enero del 2011, pero hasta la fecha de hoy el porcentaje de avance es del 91%, por lo que en términos generales para la Interventoría el contratista ha incumplido con los términos inicialmente pactados ya que el tiempo para la entrega de esta obra se termino.

4- La Institución Educativa Rafael Argote Vega Bloque B comenzó sus actividades el día 26 de Julio del 2010, teniendo un plazo de entrega inicial de dos meses, es decir se entregaría esta obra el día 11 de Diciembre del 2010, según el ajuste a la programación inicial de las obras debido al invierno, se haría entrega final de esta obra para el día 30 de Enero del 2011, pero hasta la fecha de hoy el porcentaje de avance es del 91%, por lo que en términos generales para la Interventoría el contratista ha incumplido con los términos inicialmente pactados ya que la fecha de entrega pasó y no se concluyeron las obras.

La Institución Educativa Manuel Germán Cuello No1 del Corregimiento de Rincón Hondo comenzó sus actividades el día 11 de de Octubre del 2010, teniendo un plazo de entrega inicial de seis meses, es decir se entregaría esta obra el día 11 de Abril del 2011, según el ajuste a la programación inicial de las obras debido al invierno, se haría entrega final de esta obra para el día 30 de Junio del 2011, pero hasta la fecha de hoy el porcentaje de avance es de solo el 7%, y debido a los tropiezos técnicos y administrativos que ha tenido el contratista en esta obra, esta Interventoría ve poco probable la culminación de esta obra para la fecha pactada.

Con base en lo anterior la Interventoría hace énfasis en que el contratista presenta un retraso considerable en la ejecución de la obras y si se procede a aplicar algo de simple lógica, se concluye que si en siete (7) meses no se han terminado cinco (5) colegios, en los cinco meses restantes al plazo contractual más algún plazo prudente adicional que por lo consignado en las bitácoras y en los estudios del tiempo que esta Interventoría ha venido realizando y presentando dentro de los informes de avances de obra mensuales, no debe ser superior a dos (2) meses más, o sea unos siete (7) meses aproximadamente como plazo pendiente total, en este idéntico plazo tendría que ejecutar y terminar los trabajos en catorce (14) escuelas más, para completar las 19 Instituciones objeto del Contrato de Obra No 002-2010, lo cual consideramos poco probable, si el contratista a partir del 1º de Marzo no realiza un gran esfuerzo y triplica el ritmo de las acciones y actividades hasta ahora implementadas.

Se le recuerda al contratista que el incumplimiento de los plazos inicialmente pactados en la propuesta presentada al Municipio de Chiriguana será causal de multas y sanciones, previstas en

Este Documento es Fiel
Copia de su Original.
10-Marzo-2020
ALCALDIA MUN. CHIRIGUANÁ

COMITÉ TECNICO DE OBRA No 004

CONTRATO DE OBRA 002 DEL 2010

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ

la CLAUSULA DECIMO PRIMERA: que literalmente dice: "En caso de que el contratista incurra en mora e incumplimiento injustificado (como hasta ahora se tipifica en este caso) de las obligaciones contractuales originadas en este contrato, el Municipio mediante acto motivado, podrá imponerle en calidad de multa, sanciones pecuniarias equivalentes al 1% del valor del contrato las cuales sumadas entre si no podrán exceder del 10% de dicho valor, salvo de casos de fuerza mayor o casos fortuitos; las cuales se harán efectivas descontándolas del saldo a pagar del valor del contrato, sin perjuicio de la declaratoria de caducidad, cuando el Municipio lo considere procedente.

Para evitarse estos inconvenientes y liberarse por parte de la Interventoría y del Municipio de Chiriguana, de la imposición de multas y sanciones pecuniarias, se REQUIERE CON CARÁCTER DE URGENCIA que el contratista proceda a abrir de forma INMEDIATA, nuevos frentes de trabajo, en cuantía no inferior a cinco más y corregir los problemas que genera el atraso en la llegada de los materiales a las obras, cubrir los frentes de trabajo con más personal, y agilizar el pago de los salarios al personal de obra para evitar paros.

Realizado el anterior análisis, por parte de la Interventoría, hacen uso de la palabra los siguientes miembros de las partes que intervienen en esta reunión técnica:

-El Alcalde del Municipio de Chiriguana manifiesta que las obras son de buena calidad y teniendo claro conocimiento del desarrollo y contenido de las obras, también evidencia el atraso de las obras.

-El Arquitecto ARNOL ALMEIDA en representación del contratista de obra se compromete a iniciar Cinco (5) nuevos frentes de trabajo en las siguientes escuelas: Luis Felipe Centeno No 1 y 2, Juan Mejía Gómez Bachillerato, Juan Mejía Gómez Sede No 3 y La Aurora, para los primera semana del mes de MARZO, y manifiesta que el representante legal del contratista de obras, piensa subcontratar estos frentes, para agilizar y avanzar la ejecución del contrato.

- El Asesor Jurídico del Municipio, WILLIAM CASTRO, manifiesta al contratista que si se va a subcontratar se debe notificar al Municipio de Chiriguana y a la Interventoría para que estos autoricen y/o aprueben lo anterior.

- El Secretario de Planeación y Obras Publicas el Arquitecto LUIS RAFAEL ROCHA, manifiesta que envió un oficio a la Interventoría con copia al contratista solicitando la nueva reprogramación de las obras y un análisis de las obras programadas vs las obras ejecutadas, para tomar las decisiones que lleven al caso.

La Interventoría manifiesta que el anterior análisis acerca del desarrollo de los frentes hasta ahora en ejecución confrontados contra la programación elaborada por el contratista, consignado dentro de la presente acta contesta de manera resumida su preocupación que es la misma que le asiste a la Interventoría con relación al retraso de las obras y como constancia de lo anterior, anexa dentro de la documentación que sirve de soporte a este comité técnico de obra, fotocopia de los oficios enviados al Contratista, recordándole los compromisos adquiridos con el Municipio, de los cuales hasta la fecha no se ha recibido respuesta alguna por parte del contratista, así como también copia de las actas No 001 a No 006 de evaluación de avance de obras y de las condiciones contractuales para cada plantel educativo, por lo cual la reprogramación de las obras será tomada de manera inmediata al supervisor del contrato, una vez el contratista proceda a hacerle entrega a la Interventoría de dicha reprogramación, su retraso en la entrega será una de las causas para seguir cabalgando el contratista de obras hacia la penalización o multas.

63
489

RECIBIDO
COMITÉ TECNICO DE OBRA No 004
10- MARZO-2020
Firma: HU 102 Ubes

64
484

COMITÉ TECNICO DE OBRA No 004

CONTRATO DE OBRA 002 DEL 2010

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS
INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ

Para mayor constancia se firma por los asistentes y participantes en este comité celebrado a los
18 días del mes de Febrero del 2011.

MUNICIPIO DE CHIRIGUANA - CESAR

Dr, RAMÓN ARTURO DIAZ CORZO
Alcalde Municipal

ARQ. LUIS RAFEL ROCHA VILLEGAS
Secretario de Planeación

DR. WILLIAM ELIAS CASTRO DAZA
Asesor Jurídico Externo

UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

ARQ. JAIME MERCADO RUIZ
Coordinador técnico de Interventoría

ARQ. MIGUEL ANTONIO VARGAS
Coordinador administrativo de Interventoría

ARQ. XAVIER BERDUGO
Residente de Interventoría

CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

ARQ. ERNESTO ARDUZ
Director de Obra

ARQ. ARNOLD ALMEIDA
Coordinador técnico de Obra

ARQ. JAIRO HERAZO
Residente del proyecto

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ
Este Documento es Copia de su Original
Fecha: 10 marzo 2020
Firma: MA Jose Vides

COMITÉ TECNICO DE OBRA No 004

CONTRATO DE OBRA 002 DEL 2010

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS
INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ

Con Copia :

- Ing. DAVID OROZCO

R.L. CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

-Arq., LUIS RAFAEL ROCHA VILLEGAS

Supervisor del Contrato

Secretario de Planeación y Obras Públicas

-Ing. RAFAEL PÉREZ BRIZNEDA.

Director de Interventoría.

65
485

RECEBIDO DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ
UNIDAD ADMINISTRATIVA LOCAL
Esta es una copia de su Original
Fecha: 10-Marzo-2020
Firma: Mr. José Vides

66
486

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Esta Documento es Original
Copia de su Original
Fecha: 10- marzo-2020
Firma: Ma José Vides

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
RAFAEL ARGOTE VEGA
SEDE B**

67
487

RECEBIDO DEL GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE GUAYAMA
UNIDAD DE MANEJO DEL AGUA
Esta Documento es una
Copia de su Original
Fecha: 10-marzo-2020
Firma: M4 José Vides

**INFORME DE AVANCE DE OBRAS DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL ARGOTE VEGA
SEDE B.**

**INTERVENTORIA:
CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA**



**INFORME DE INTERVENTORIA OBRAS RAFAEL ARGOTE VEGA SEDE B
PERIODO ENERO 26 DEL 2011 A FEBRERO 26 DEL 2011**

27 DE ENERO DEL 2011

Se continua con la instalación de los pisos de cerámica de las aulas, se aplica el puliplast en las aulas del primer piso se continua con de enchape de los baños de preescolar, y se colocan los zócalos, se continua con la instalación de la parrilla del cielo raso, y se continua con la construcción de las cerchas para la cubierta de la cancha múltiple.

28 DE ENERO DEL 2011

Se continua con la instalación de la parrilla del cielo raso, y se continua con la construcción de las cerchas para la cubierta de la cancha múltiple, se aplica el puliplast en las aulas del primer piso y de la fachada se hace plantilla de piso en el patio con juntas en tablón de gress se continua con de enchape de los baños de preescolar.

29 DE ENERO DEL 2011

Se continua con la instalación de los pisos de cerámica y se colocan los zócalos se continua con la plantilla de piso en el patio con juntas en tablón de gress. Se continúa con la construcción de las cerchas para la cubierta de la cancha múltiple.

31 DE ENERO DEL 2011

Se continua con la construcción de las cerchas para la cubierta de la cancha múltiple se hace cimientito y se levanta el muro de la jardinera del patio se termina plantilla de piso en el patio con juntas en tablón de gress.

01 DE FEBRERO DEL 2011

Se continúa con la construcción de las cerchas para la cubierta de la cancha múltiple, y se programa una limpieza general de la obra.

02 DE FEBRERO DEL 2011 Y 03 DE FEBRERO DEL 2011

Se continua con la construcción de las cerchas para la cubierta de la cancha múltiple, y se hace el pañete de la jardinera del patio se hace zócalo en piedra china del corredor.

Oficina: Calle 106 No 50-102 Oficina 7

Tel: 3785058 Fax: 3739606

Barranquilla - Colombia

E-mail: rafaelperez333@hotmail.com

Oficina Chiriguana: Calle 8 No 1-203 Chiriguana- Cesar

Cel: 311 6505205 - 311 4113087

E-mail: arq.miguelvargas@hotmail.com

RECEIVED
SECRETARIA DE EDUCACION
Calle 106 No 50-102 Oficina 7
Barranquilla - Colombia
10- MARZO-2011
MA José Vides

INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA



04 DE FEBRERO DEL 2011

Se inicia la instalación del cielo raso del primer piso y se hace una reunión con el personal de obra para explicarles la importancia de tener puestos los implementos de seguridad industrial.

05 DE FEBRERO DEL 2011

Se continua con la instalación de los pisos de cerámica de las aulas, se aplica el puliplast en las aulas del primer piso se continua con de enchape de los baños de preescolar.

07 DE FEBRERO DEL 2011

Se repañeta el muro de la fachada oeste para poder aplicar el puliplast, ya que el existente estaba construido de manera rustica por que se iba a instalar ladrillo verde como acabado.

08 DE FEBRERO DEL 2011

Se colocan wines de aluminio, se hace el gotero de la fachada norte en súper board se aplica el puliplast en las aulas del primer piso se continua con la construcción de las cerchas para la cubierta de la cancha múltiple se continua con el zócalo en piedra china del corredor del primer piso.

09 DE FEBRERO DEL 2011

Se aplica pintura en el muro de la fachada oeste, se continua con el cableado de las aulas del primer piso se continua con el zócalo en piedra china del corredor del primer piso, debido a la mala presentación se procede a demoler el granito abusardado para aplicar puliplast en esa área se continua con la construcción de las cerchas para la cubierta de la cancha múltiple.

10 DE FEBRERO DEL 2011.

Se instala piso en tableta de cerámica en el corredor del segundo piso, se aplica pintura en el área de los muros exteriores se continua con la construcción de las cerchas para la cubierta de la cancha múltiple.

11 DE FEBRERO DEL 2011.

Se instala piso en tableta de cerámica en el corredor del segundo piso, igualmente se traza el piso para el corredor del piso, se coloca el zócalo en piedra china, se pañeta el cuarto de aseo se colocan las puertas del cuarto de aseo y del cuarto eléctrico y de los baños existentes y se continua con la colocación del cielo raso en súper board además se continua con la construcción de las cerchas para la cubierta de la cancha múltiple.

Oficina: Calle 106 No 50-102 Oficina 7

Tel: 3785058 Fax: 3739606

Barranquilla - Colombia

E-mail: rafaelperez333@hotmail.com

Oficina Chiriguana: Calle 8 No 1-203 Chiriguana Cesar

Cel: 311 6505205 - 311 4113087

E-mail: arq.miguelvargas@hotmail.com

10- marzo 2011
M^{ra} José Vides
Firmado

**INTERVENTORIA:
CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA**



12 DE FEBRERO DEL 2011.

Se continua con la colocación del piso en el corredor del segundo piso se continua con la colocación del cielo raso en súper board, se suspenden las actividades por falta de agua ya que en el municipio esta suspendido el servicio desde hace tres días.

14 DE FEBRERO DEL 2011.

Se continua con la colocación del piso en el corredor del segundo piso, se continua con la colocación del cielo raso en súper board, se instala y se coloca la reja de división de la zona de preescolar y la cancha.

15 DE FEBRERO DEL 2011.

Se continúa con la colocación del piso en el corredor del segundo piso, se hace la plantilla en junta en tablón de gress en la zona de la cancha y las gradas, se sigue presentando problemas con el abastecimiento de agua para la obra.

16 DE FEBRERO DEL 2011.

Se instala el piso de tableta de gress en el corredor exterior del primer piso Se continua con la colocación del piso en el corredor del segundo piso, se hace la plantilla en junta en tablón de gress en la zona de la cancha y las gradas se continua con la colocación del cielo raso en súper board, se continua con la construcción de las cerchas para la cubierta de la cancha múltiple.

17 DE FEBRERO DEL 2011.

Se continua con la instalación del piso de tableta de gress en el corredor exterior del primer piso Se continua con la colocación del piso en el corredor del segundo piso, se continua con la construcción de las cerchas para la cubierta de la cancha múltiple, se inician las actividades de instalación del ladrillo verde de fachada.

18 DE FEBRERO DEL 2011.

Se continua con la instalación del ladrillo verde de fachada Se continua con la colocación del piso en el corredor del segundo piso, se levanta un muro de 40 centímetros para darle mas capacidad de carga al alero de fachada

19 DE FEBRERO DEL 2011.

Se continua con la instalación del ladrillo verde de fachada, Se continua con la instalación del piso de tableta de gress en el corredor exterior del primer piso, se aplica sellante de juntas en mastique para cielo raso.

21 DE FEBRERO DEL 2011.

Se continua con la colocación del cielo raso en súper board se continua con la construcción de las cerchas para la cubierta de la cancha múltiple. Se continúa con la instalación del ladrillo verde de fachada.

Oficina: Calle 106 No 50-102 Oficina 7

Tel:3785058 Fax: 3739606

Barranquilla - Colombia

E-mail: rafaelperez333@hotmail.com

Oficina Chiriguana: Calle 8 No 1-203 Chiriguana- Cesar

Cel: 311 6505205 - 311 4113087

E-mail: arq.miguelvargas@hotmail.com

RECIBIDO
LA SECRETARIA DE EDUCACION
Calle 106 No 50-102 Oficina 7
Barranquilla - Colombia
10- marzo - 2011
Ma José Urdaz
Firma

**INTERVENTORIA:
CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA**



21 DE FEBRERO DEL 2011.

Se continua con la colocación del piso en el corredor del segundo piso, se continua con la colocación del cielo raso en súper borrar, se instala y se coloca la reja de división de la zona de preescolar y la cancha.

22 DE FEBRERO DEL 2011 y 23 DE FEBRERO DEL 2011.

Se continua con la instalación del ladrillo verde de fachada, Se continua con la instalación del piso de tableta de gress en el corredor exterior del primer piso, se aplica sellante de juntas en mastique para cielo raso. Se sigue presentando problemas con el abastecimiento de agua para la obra. Se continúa con la construcción de las cerchas para la cubierta de la cancha múltiple.

24 DE FEBRERO DEL 2011.

Se continua con la colocación del cielo raso en súper board se continua con la construcción de las cerchas para la cubierta de la cancha múltiple. Se continúa con la instalación del ladrillo verde de fachada.

25 DE FEBRERO DEL 2011.

Se continúa con la colocación del piso en el corredor del segundo piso, se hace la plantilla en junta en tablón de gress en la zona de la cancha y las gradas, se inician las actividades de instalación del ladrillo verde de fachada. Se continúa con la construcción de las cerchas para la cubierta de la cancha múltiple.

26 DE FEBRERO DEL 2011.

Se instala el piso de tableta de gress en el corredor exterior del primer piso Se continua con la colocación del piso en el corredor del segundo piso, se hace la plantilla en junta en tablón de gress en la zona de la cancha y las gradas se continua con la colocación del cielo raso en súper board, se continua con la construcción de las cerchas para la cubierta de la cancha múltiple.

Recibido en la Oficina de
Luz Delgadillo
Fecha: 10- mayo-2020
Firma: M^{te} José Vides

Oficina: Calle 106 No 50-102 Oficina 7
Tel: 3785058 Fax: 3739606
Barranquilla - Colombia
E-mail: rafaelperez333@hotmail.com
Oficina Chiriguana: Calle 8 No 1-203 Chiriguana - Cesar
Cel: 311 6505205 - 311 4113087
E-mail: arq.miguelvargas@hotmail.com

72
492

**RESUMEN FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRAS
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL ARGOTE
VEGA SEDE B.**

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Calle 14 No. 10-10
Fecha: 10- marzo-2020
Firma: M⁴ José Vides



INTERVENTORIA:
INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	ARGOTE VEGA SEDE B		
PERIODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	01	DE	28
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR


SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CABECERA MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

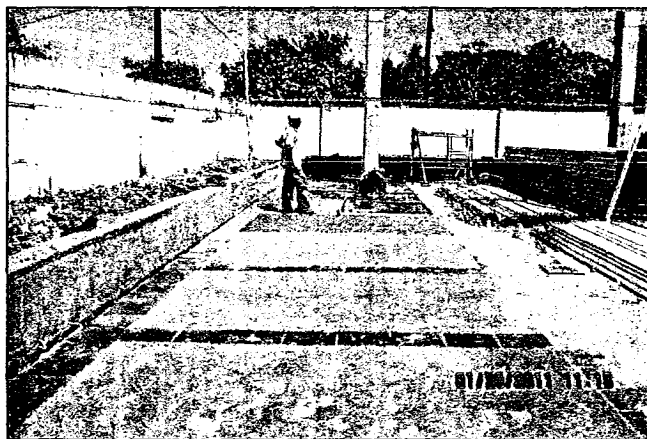

CONTENIDO: DETALLE. CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO CON JUNTA EN TABLON VITRIFICADO. ANDEN DE CIRCULACIÓN EXTERIOR.

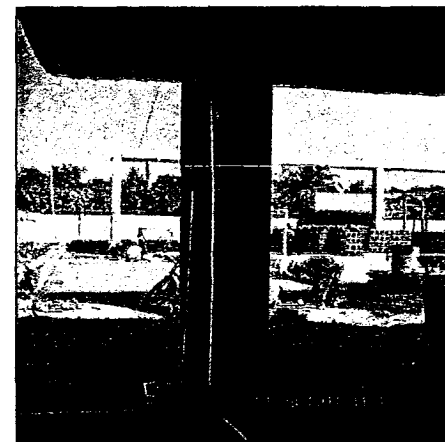

CONTENIDO: DETALLE. BAJANTES DE TUBERIAS HIDROSANITARIAS, HIDRAULICAS Y ELECTRICAS.

Firma

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TECNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.

Fecha: 10-02-2011
Firma: [Signature]

499
73



INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA:CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	ARGOTE VEGA SEDE B		
PERIODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	O2	DE	28
FECHA	26	O2	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CABECERA MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

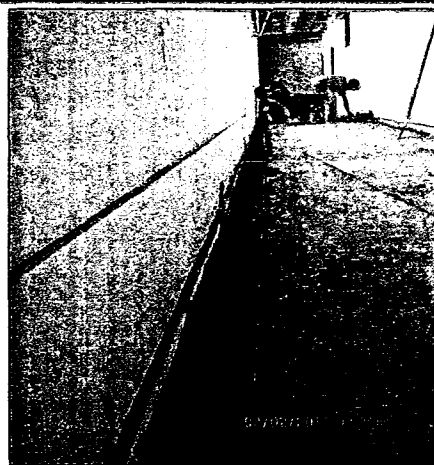

CONTENIDO: DETALLE, JUNTA EN PIDRA CHINA, PASILLO DE CIRCULACIÓN, SEGUNDO PISO.



CONTENIDO: ESTUCADO DE MURO EN PULIPLAS, FACHADA PRINCIPAL.

Firma

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.

RECIBIDO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
CHIRIGUANÁ
10-Marzo-2020
Firma: Hª Jose Vides

494
74



INTERVENTORIA:
INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	ARGOTE VEGA SEDE B		
PERÍODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	03	DE	28
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR


SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CABECERA MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRAFICO

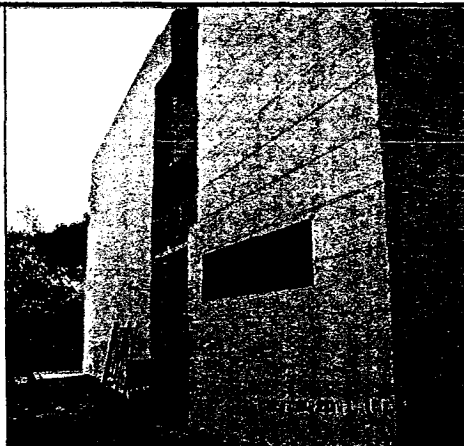

CONTENIDO: ESTUCADO DE MURO EN PULIPLAS. FACHADA LATERAL.

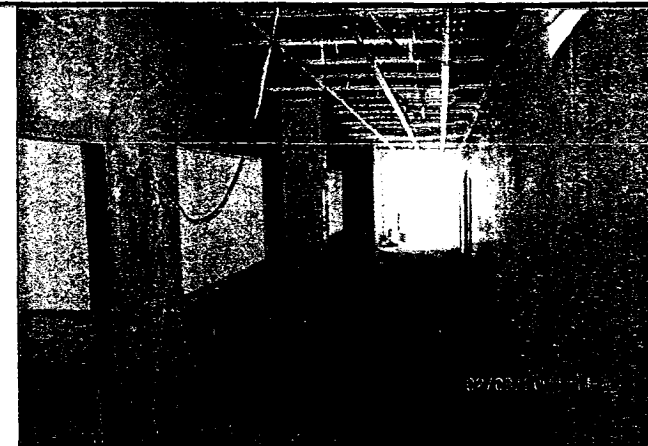

CONTENIDO: ARMADO DE ESTRUCTURA METALICA, PARA CIELO RAZO, PASILLO INTERNO PRIMER PISO Y DETALLE DE MURO (ESTUCADO, EN PULIPLAS)

Firma

[Handwritten signature]

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TECNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Firma

[Handwritten signature]

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.

Fecha: 20-Marzo-2011
Firma: M. J. J. U. J. J.

16/1
CK

	INTERVENTORIA:		INSTITUCIÓN		ARGOTE VEGA SEDE B	
	INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		PERIODO		26/01/11-26/02/2011	
			PÁGINA	O5	DE	28
			FECHA	26	O2	2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.		CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: CABECERA MUNICIPAL
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
CONTENIDO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA (SUPERBOARD) Y DETALLE DE LA ESTRUCTURA METALICA, AREA DE AULAS DE CLASES Y PASILLO INTERNO PRIMER PISO.						
Firma: <u> JEL </u>		Firma: <u> MVS </u>				
Nombre: <u> JAIME MERCADO RUIZ </u> COORDINADOR TECNICO		Nombre: <u> MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ </u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO				
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO		Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.				

Fecha: 10 de marzo de 2011
 Firmado: H4 JESÚS UDES
 Firmado: JESÚS UDES

497
 LA



INTERVENTORIA:
INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	ARGOTE VEGA SEDE B		
PERIODO	26/01/11-28/02/2011		
PÁGINA	06	DE	28
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CABECERA MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: EXCAVACIÓN DE CIMIENTO PARA LEVANTE DE ACABADO DEMURO DE FACHADA PRINCIPAL.



CONTENIDO: DETALLE DE ENCHAPE DE MURO DIM (0.20 X 0.20) H. 2.00 Y INSTALACIÓN DE CIELO RAZO. AREA DE BAÑOS PREESCOLAR.

Firma

[Handwritten signature]

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TECNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Firma

[Handwritten signature]

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.

[Handwritten notes and stamps:]
Firma: *[Signature]*
Fecha: 10-Marzo-2011
Firma: *[Signature]*
Fecha: 10-Marzo-2011

[Handwritten notes:]
498
78



INTERVENTORIA:
INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	ARGOTE VEGA SEDE B		
PERÍODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	07	DE	28
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CABECERA MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONTENIDO: DETALLE DE JUNTA EN PIEDRA CHINA, PASILLO INTERNO.



CONTENIDO: FUNDIDA DE PLANTILLA. EN CONCRETO (esp 0.07) ZONA DE BAÑOS PARA DISCAPACITADOS.

Firma

[Handwritten signature]

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Firma

[Handwritten signature]

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.

Señalado por el
Firma: *[Handwritten signature]*
10-Marzo-2010
Firma: *[Handwritten signature]*
14-Marzo-2010

[Handwritten marks]



INTERVENTORIA:
INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	ARGOTE VEGA SEDE B		
PERÍODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	08	DE	28
FECHA	26	02	2011



OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CABECERA MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

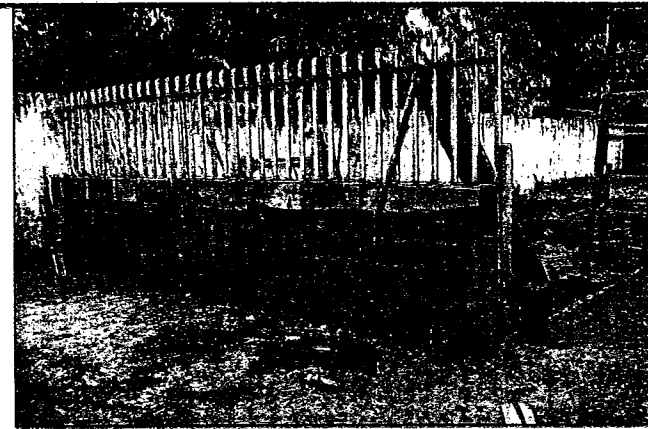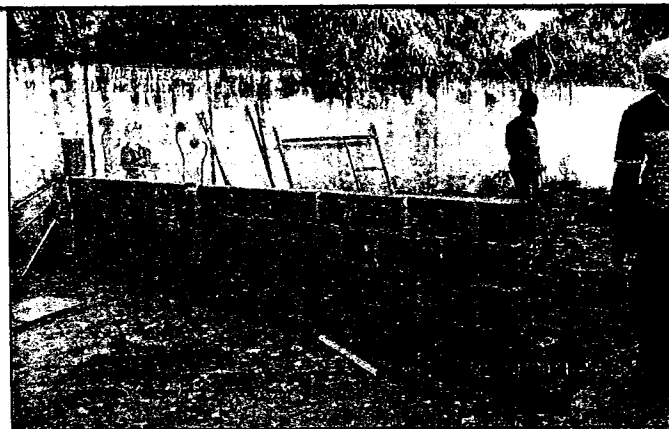

CONTENIDO: LEVANTE DE MURO EN BLOQUE SAMO, (H. 1,00m) Y FUNDICIÓN DE VIGUETAS DE CONFINAMIENTO, AREA DE CERRAMIENTO, PARA PREESCOLAR.

CONTENIDO: DETALLE DEL CERRAMIENTO EN TUBERÍA, GALVANIZADA (DIMAMETRO 1,1/2") Y FUNDICIÓN DE VIGUETA, AREA DE CERRAMIENTO, PARA PREESCOLAR.

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.

Recibido en el Municipio de Chiriguana, Cesar, a las 10:00 horas del día 26 de febrero de 2011.
Firma: Ha Jose Uides



INTERVENTORIA:
INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	ARGOTE VEGA SEDE B		
PERIODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	09	DE	28
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CABECERA MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

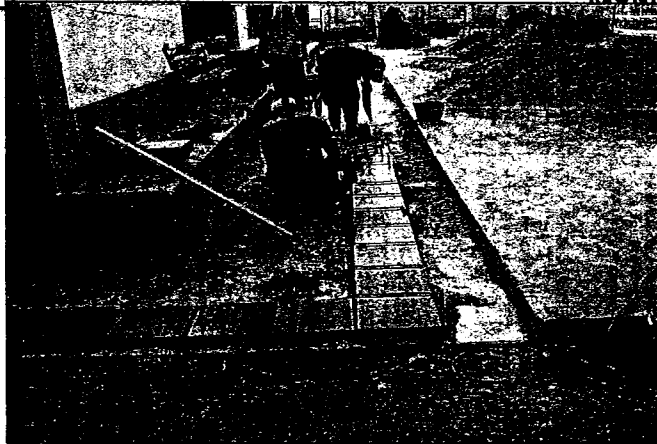

CONTENIDO: CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO (ESP 0.07) Y JUNTA EN TABLON VITRIFICADO, ZONA DE CIRCULACIÓN (CANCHA MULTIPLE).

Firma

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.

Fecha: 10-Mar-2011
Firma: Ha Jose Vides

561
18



INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA:CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	ARGOTE VEGA SEDE B		
PERÍODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	10	DE	28
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CABECERA MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

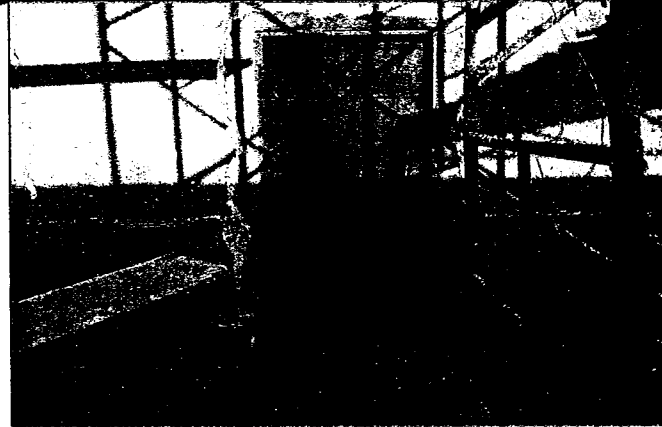

CONTENIDO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA, METALICA (DIM 2.00 X 1.00) (ENTAMBORADA) AREA DE BAÑOS, EXISTENTES

CONTENIDO: DETALLE, CONSTRUCCIÓN DE CERCAS METALICAS. EN TUBERIA, GALVANIZADA (DIMAMETRO 2") (CANCHA MULTIPLE)

Firma

[Handwritten signature]

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Firma

[Handwritten signature]

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.

Recibido
10 de marzo de 2011
Firma: [Handwritten signature]

702
[Handwritten signature]



INTERVENTORIA:
INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	ARGOTE VEGA SEDE B		
PERÍODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	11	DE	28
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CABECERA MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: DETALLE DE INSTALACIÓN DEL PISO, EN TABLETA DE GRES, PASILLO INTERNO SEGUNDO PISO.



CONTENIDO: VISTA GENERAL DEL PISO, EN TABLETA DE GRES, PASILLO INTERNO SEGUNDO PISO.

Firma

[Handwritten signature]

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Firma

[Handwritten signature]

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.




Fecha: 14 de marzo de 2011
Firma: *[Handwritten signature]*

[Handwritten marks]

	INTERVENTORIA: INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		INSTITUCIÓN		ARGOTE VEGA SEDE B	
			PERIODO		26/01/11-26/02/2011	
	PÁGINA		12	DE	28	
	FECHA		26	02	2011	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.		CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: CABECERA MUNICIPAL
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
CONTENIDO: ANDEN DE CIRCULACIÓN EXTERIOR, ACAVADO DE PISO EN TABLETA DE GRES, Y JUNTA EN PIEDRA CHINA (FACHADA POSTERIOR)						
Firma <u> </u> Nombre: <u>JAIME MERCADO RUIZ</u> COORDINADOR TECNICO Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO			Firma <u> </u> Nombre: <u>MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ</u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO Matrícula No.: 08700-69126 Atlántico.			

Fecha: 10 de Marzo de 2020
 Firma: Ha Jose Uido

104
 14

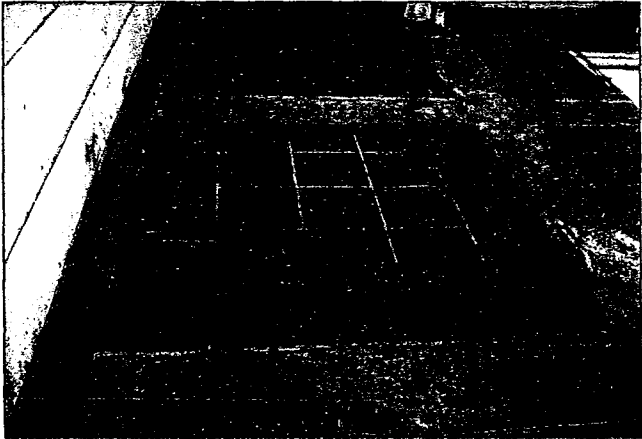	INTERVENTORIA:		INSTITUCIÓN		ARGOTE VEGA SEDE B	
	INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		PERÍODO		26/01/11-26/02/2011	
			PÁGINA	13	DE	28
			FECHA	26	02	2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.		CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: CABECERA MUNICIPAL
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
CONTENIDO: DETALLE Y FRAGUADO DE PISO, EN TABLETA DE GRÉS. PASILLO DE CIRCULACIÓN SEGUNDO PISO.			CONTENIDO: APLOMADA DE MURO EN FACHADA PRINCIPAL (ACAVADO)			
Firma 			Firma 			
Nombre: <u>JAIME MERCADO RUIZ</u> COORDINADOR TÉCNICO Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO			Nombre: <u>MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ</u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.			

Recibido
 10 marzo 2020
 Por Jose Vides

505
 55



INTERVENTORIA:

INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	ARGOTE VEGA SEDE B		
PERIODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	14	DE	28
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE
AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS
EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR


SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CABECERA
MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

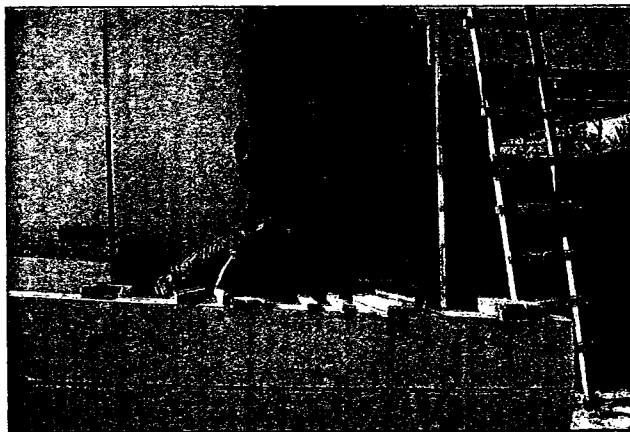

CONTENIDO: DETALLE LEVANTE DE MURO, EN BLOQUE SAMO, FACHADA
PRINCIPAL

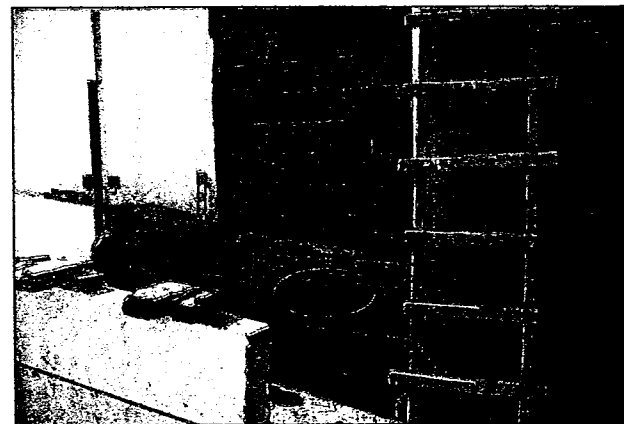

CONTENIDO: DETALLE, ACAVADO DE MURO EN BLOQUE ABUSARDADO,
FACHADA PRINCIPAL

Firma

[Signature]

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Firma

[Signature]

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.

Fecha: 10 marzo 2011
Firma: Miguel Vargas

[Handwritten marks]



INTERVENTORIA:
INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	ARGOTE VEGA SEDE B		
PERIODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	15	DE	28
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CABECERA MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: DETALLE, RESANE DE JUNTAS DE CIELO RAZO EN SUPERBOAR.



CONTENIDO: DETALLE, APLICACIÓN DE YESO SOBRE CIELO RAZO EN LAMINA DE SUPERBOAR. AREA AULA DE CLASE, SEGUNDO PISO

Firma

[Handwritten signature]

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Firma

[Handwritten signature]

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No. : 08700-69126 Atlántico.

Firma: *[Handwritten signature]*
Nombre: *[Handwritten signature]*
Matrícula No.: *[Handwritten signature]*

Firma: *[Handwritten signature]*
Nombre: *[Handwritten signature]*
Matrícula No.: *[Handwritten signature]*



INSTITUCIÓN	ARGOTE VEGA SEDE B		
PERIODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	16	DE	28
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CABECERA
MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRAFICO

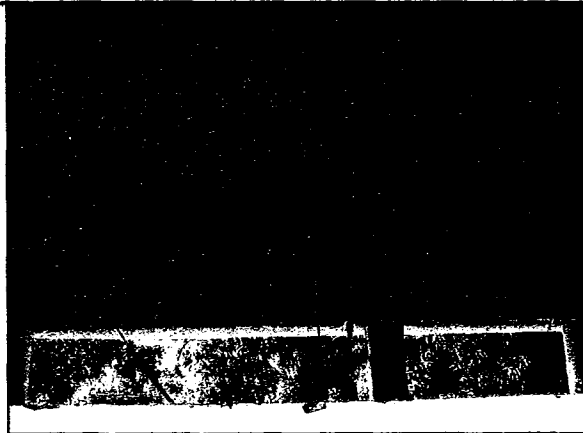

CONTENIDO: DETALLE ACAVADO DE CIELO RAZO.

Firma

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TECNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÀNTICO

Firma

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No. : 0B700-69126 Atlántico.

10-Mar-20-2020
H4-Jose Vides

100



INTERVENTORIA:

INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN

ARGOTE VEGA SEDE B

PERIODO

26/01/11-26/02/2011

PÁGINA

17

DE

28

FECHA

26

02

2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE
AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS
EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CABECERA
MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

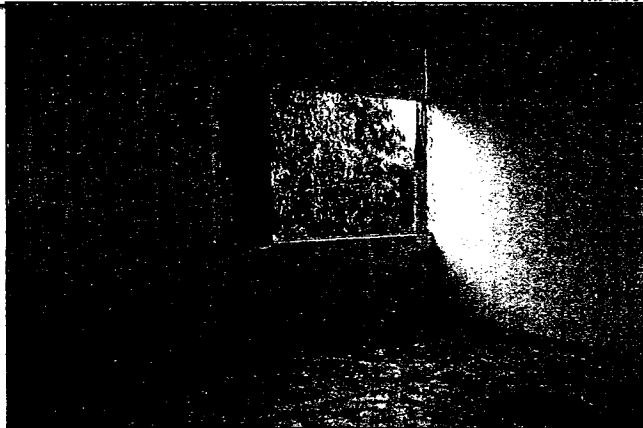

CONTENIDO: DETALLE DE FILETE DE VENTANA, AREA SALA DE PROFESORES.

CONTENIDO: LEVANTE DE MURO (ANTEPECHO), AREA DE VIGA CANAL (CANCHA
MULTIPLE)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ

COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.

Fecha: 10 de marzo de 2020
Firma: 114-1026-01085

1026
114



INTERVENTORIA:

INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	ARGOTE VEGA SEDE B		
PERÍODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	18	DE	28
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE
AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS
EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CABECERA
MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: DETALLE, FRAGUADO DE PISO EN CERAMICA, ZONA DE AULAS
DE CLASES. (PREESCOLAR.)



CONTENIDO: INSTALACIÓN DE ZOCALOS ZONA DE AULAS DE CLASES.
(PREESCOLAR.)

Firma

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.

Recibido en el
Municipio de Chiriguana
el 10 de marzo de 2011
Hecho a las 11:05 AM

SIC
eb



INTERVENTORIA:

INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	ARGOTE VEGA SEDE B		
PERIODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	19	DE	28
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE
AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS
EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CABECERA
MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

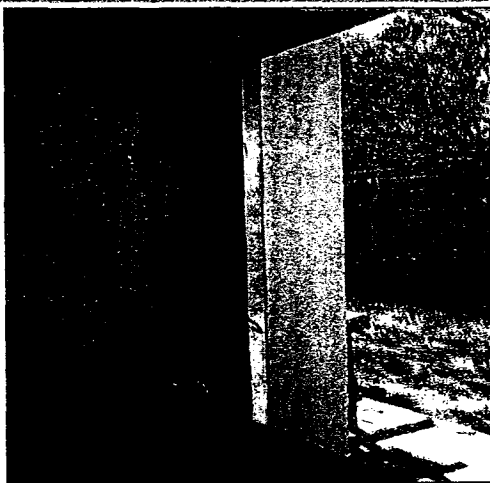

CONTENIDO: DETALLE, FILETE DE COLUMNA, CARA INTERNA.



CONTENIDO: VISTA PREVIA DE COLUMNA PANELADA, AMBAS CARAS.

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ

COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.

10-Marzo-2020
Ma 1034 Vides

51
46



INTERVENTORIA:
INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	ARGOTE VEGA SEDE B		
PERIODO	26/01/11-28/02/2011		
PÁGINA	20	DE	28
FECHA	26	02	2011



OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CABECERA MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

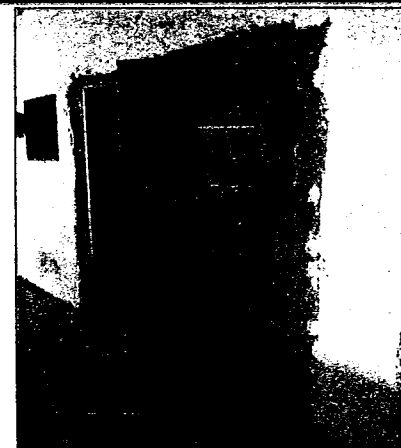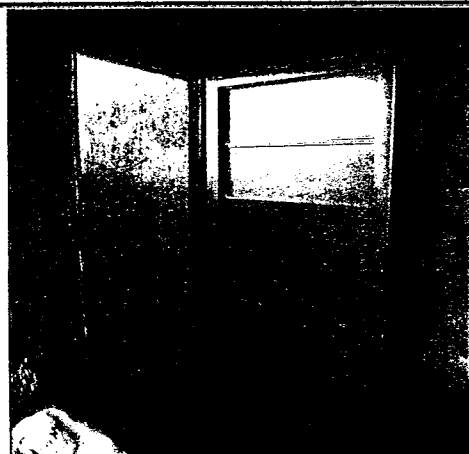

CONTENIDO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA (ENTAMBORADAS), CUARTO DE ASEO. DIM (2.00X1.00)

CONTENIDO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA (ENTAMBORADAS), AREA DEL CUARTO ELECTRICO. DIM (2.00X1.00)

Firma

[Handwritten signature]

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TECNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLANTICO

Firma



[Handwritten signature]

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLANTICO.

Recibido
Firma: 10-Mar-2011
Firma: 14-Mar-2011

512

72

	INTERVENTORIA:		INSTITUCIÓN		ARGOTE VEGA SEDE B	
	INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		PERÍODO		26/01/11-26/02/2011	
			PÁGINA	21	DE	28
			FECHA	26	02	2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.		CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: CABECERA MUNICIPAL
REGISTRO FOTOGRAFICO						
						
CONTENIDO: LEVANTE DE MURO EN BLOQUE SAMO. AREA DE DEPOSITO.		CONTENIDO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA (ENTAMBORADAS). DIM (2.00X1.00) AREA DE BAÑOS ESCOLARES. EXISTENTES				
Firma 		Firma 				
Nombre: <u>JAIME MERCADO RUIZ</u> COORDINADOR TECNICO Matricula No.: 08700-51664 ATLANTICO		Nombre: <u>MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ</u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO Matricula No.: 08700-69126 Atlántico.				

Fecha: 10-Marzo-2020
 Firma: H. Jose Vides

513
 26



INTERVENTORIA:
INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	ARGOTE VEGA SEDE B		
PERIODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	22	DE	28
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CABECERA MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

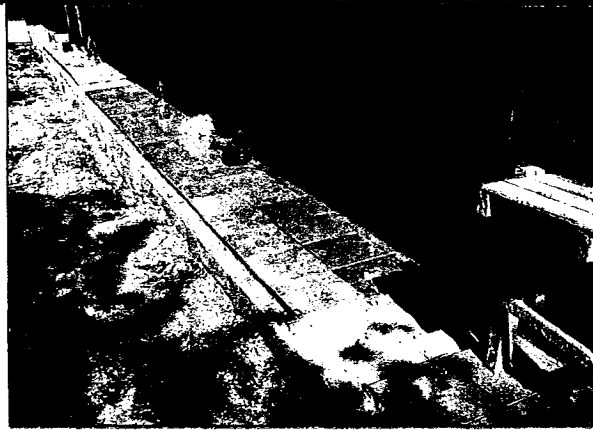

CONTENIDO: FRAGUADO DE PISO, EN TABLETA DE GRES, ANDEN EXTERIOR FACHADA POSTERIOR.

CONTENIDO: INSTALACIÓN DE PISO EN TABLETA DE GRES, ANDEN EXTERIOR FACHADA POSTERIOR.

Firma Jaime Mercado Ruiz

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Firma Miguel Antonio Vargas Sanchez

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.

10-Marzo-2020
H. José Urdó

514
94



INTERVENTORIA:
INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	ARGOTE VEGA SEDE B		
PERIODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	23	DE	28
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE
AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS
EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CABECERA
MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

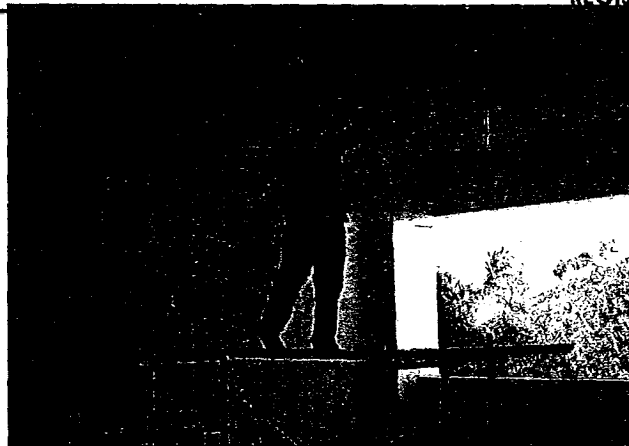

CONTENIDO: DETALLE DE ACAVADO DE CIELO RAZO, (LIJADO) ZONA DE AULAS DE CLASES. SEGUNDO PISO

Firma

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TECNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 Atlántico.

Fecha: 10-Marzo-2011
Firma: J. J. J. J. J.

515
95



INTERVENTORIA:

INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	ARGOTE VEGA SEDE B		
PERIODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	24	DE	28
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE
AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS
EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CABECERA
MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

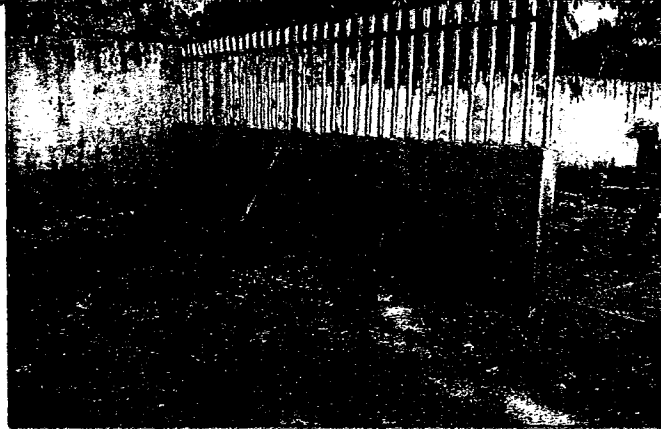

CONTENIDO: PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO DE CERRAMIENTO, AREA DE
PREESCOLAR. FACHADA PRINCIPAL.



CONTENIDO: PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO DE CERRAMIENTO, ÁREA DE
PREESCOLAR. FACHADA POSTERIOR. (EN TUBERIA GALVANIZADA 1.1/2")

Firma

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.

Firma: 10 Marzo 2011
Firma: Ha Jose Vido

SIC 96



INTERVENTORIA:
INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	ARGOTE VEGA SEDE B		
PERÍODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	25	DE	28
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CABECERA MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONTENIDO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RAZO, EN LAMINA DE SUPERBOAR. AREA DE PASILLO DE AULAS, SEGUNDO PISO.

CONTENIDO: DETALLE DE FIJACIÓN DE LAMINA DE SUPERBOAR SOBRE AREA DE ACCESO PASILLO INTERNO Y RAMPA PRIMER PISO.

Firma

[Handwritten signature]

Firma

[Handwritten signature]

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.

Recibido
16 marzo 2010
H. José Uides

514
46



INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	ARGOTE VEGA SEDE B		
PERIODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	26	DE	28
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CABECERA MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRAFICO

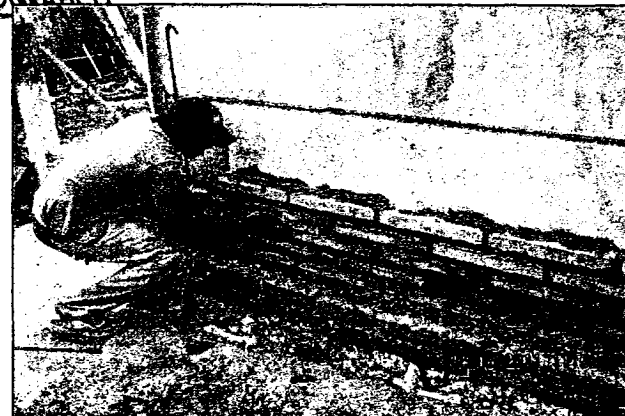

CONTENIDO: DETALLE, ACAVADO DE MURO EN BLOQUE ABUSARDADO, FACHADA PRINCIPAL.

Firma

[Handwritten signature]

Firma

[Handwritten signature]

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.

Fecha: 26-02-2011
Firma: *[Handwritten signature]*
14-10002 UNDES
10-MAR-2011
10-2011

118
86



INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	ARGOTE VEGA SEDE B		
PERIODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	27	DE	28
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR


SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CABECERA MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

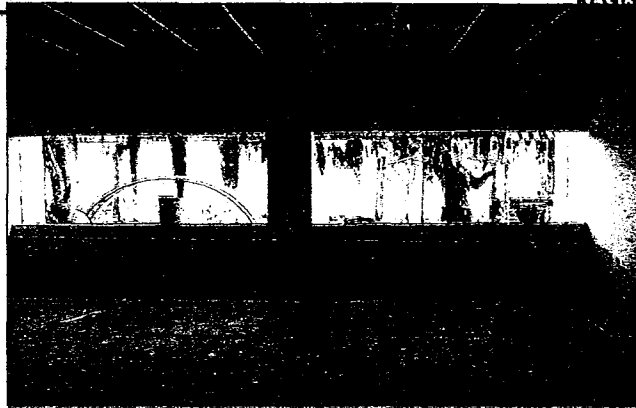

CONTENIDO: DETALLE, APLICACIÓN DE PULIPLAS SOBRE FILETES DE VANOS. AREA DE SALONES DE CLASES EXISTENTES, PRIMER PISO.

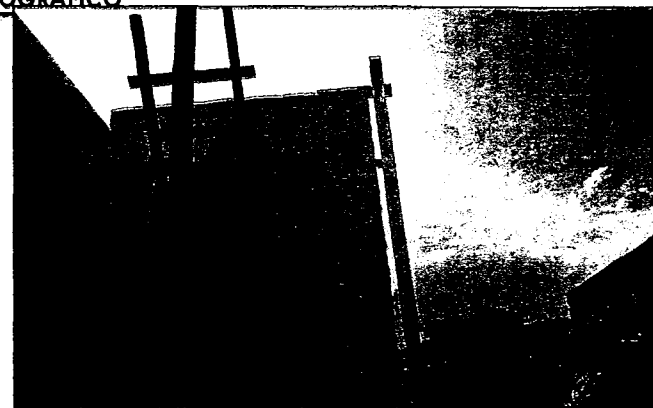

CONTENIDO: DETALLE, ACAVADO EN PULIPLAS, SOBRE MURO. (FACHADA PRINCIPAL)

Firma

[Handwritten signature]

Firma

[Handwritten signature]

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 Atlántico.

Firma: *[Handwritten signature]*
Fecha: 10-03-2011
Matrícula: 11410061106

[Handwritten signature]



INTERVENTORIA:
INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	ARGOTE VEGA SEDE B		
PERIODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	28	DE	28
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CABECERA MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO

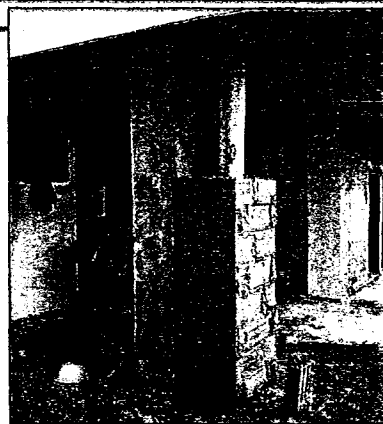

CONTENIDO: LEVANTE DE MURO EN BLOQUE SAMO (BUITRON) Y ACAVADO DE PISO EN TABLETA DE GRES. (PASILLO DE CIRCULACIÓN AREA DE AULAS DE CLASES EXISTENTES)

Firma

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.

Firma: 14-05-2011
10-04-2011
14-05-2011

S20
100

101
521

**PROGRAMACIÓN DE OBRAS.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL ARGOTE VEGA.
SEDE B**

10-Marzo-2004
H4 Jose Vides

PROGRAMACION DE OBRAS

RAFAEL ARGOTE VEGA 2 B

	DICIEMBRE						ENERO											
	semana 12						semana 13						semana 14					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
PRELIMINARES																		
EXCAVACIONES Y RELLENOS																		
ESTRUCTURALES																		
OBRAS VARIAS																		
ESTRUCTURAS																		
MAMPOSTERÍA Y PREFABRICADOS																		
PAÑETES																		
CUBIERTAS																		
PISOS																		
ACABADOS																		
CARPINTERIA METALICA																		
INSTALACIONES HIDRAULICAS																		
INSTALACIONES SANITARIAS																		
INSTALACIONES ELECTRICAS																		
OBRAS COMPLEMENTARIAS																		

10-Marzo-2020
 Rafael Argote Vega

122
 102

10
523

**FOTOCOPIA DE LA BITÁCORA QUE MUESTRA EL
AVANCE DE OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
RAFAEL ARGOTE VEGA SEDE B.**

10-Marzo-2020
H. Jose Vides

ENERO 25/2011

SE CONTINUO CON INSTALACION DE PISOS. - COLOCACION DE PARRILLAS PARA CIELO RASO EN CORREDOR SEGUNDO PISO - SE HACE TAMBIEN LA APLICACION DE PULIPLAST EN AULAS DE PRIMER PISO. SE HACEN PRUEBAS HIDRAULICAS EN BAÑOS. SE CONTINUA CON CERCHAS METALICAS PARA CUBIERTA DE CUNCHA MULTIPLE

X 11/1

ENERO 26/2011.

SE CONTINUO CON LA INSTALACION DE PISOS EN VESTIBULOS. - TAMBIEN SE INSTALA EL ENCHAFE DE MUROS EN BAÑO PRE ESCOLAR - SE CONTINUA CON LA APLICACION DE PULIPLAST EN AULAS DE PRIMER PISO. - SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE CERCHAS PARA CUBIERTA DE CUNCHA MULTIPLE - SE SIGUE CON LA ESTRUCTURA PARA CIELO RASO.

X 11/1

ENERO 27/2011 -

SE CONTINUO CON LA INSTALACION DE PISOS EN VESTIBULOS PARA AULAS. - SE SIGUE APLICANDO PULIPLAST EN AULAS DE PRIMER PISO. - TAMBIEN SE CONTINUA EL ENCHAFE EN BAÑO DE PRE ESCOLAR. SE COLOCAN ZOCLOS. - SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE LAS PARRILLAS DEL CIELO RASO. CONTINUO TAMBIEN LA CONSTRUCCION DE CERCHAS METALICAS PARA CUNCHA -

10-marzo-2010
Ma José U. de

ENERO 28/2011 -

CONTINUO LA INSTALACION DE PARRILLAS PARA CIELO

105
21

POLIPLAST EN MURO DE PISO EN ESTE - SE HACE PLANTILLO EN PISO CON JUNTAS EN TABLON DE GRESS. SE SIGUE LA COLOCACION DEZ ENCHAPÉ EN BANDO DE PRE ESCOLAR - SE CONTINUA LA CONSTRUCCION DE CERCAS METALICAS PARA ENCHES MULTIPLES -

X 11/1
B

ENERO 29/2011

SE SIGUE APLICANDO POLIPLAST EN MURO DE FACHADA ESTE SE CONTINUA INSTALANDO PISOS Y ZOCALOS EN CERAMICAS - SE SIGUE HACIENDO PLANTILLO EN PISO CON JUNTAS EN TABLON DE GRESS SE SIGUE HACIENDO LA PARRILLA PARA CIERRO PISO TAMBIEN SE ENCHAPÉ BANDO DE PRE ESCOLAR SE COLOCAN UNOS. SE CONTINUA CERCAS

X 11/1
B

ENERO 31/2011

SE CONTINUA EL DESARROLLO DE CERCAS PARA CUBIERTOS DE ENCHES MULTIPLES - SE HACE CEMENTO Y SE LEVANTA MURO PARA JARDINEROS EN PISO - Y SE TERMINA PLANTILLO DE PISO CON JUNTAS EN TABLON DE GRESS

X 11/1
B


FEBRERO 1°/2011

SE CONTINUA CON EL DESARROLLO DE LAS CERCAS PARA ENCHES MULTIPLES - SE HACE DESARROLLO DE REJERISLES (ENTRADA DE ARENA) LIMPIEZA DE LA OBRA.

10-MAR-2011
H4 JOSE VIDES
B


FEBRERO 2/2011-106

SE CONTINUA REFORZANDO O CONSTRUCCIÓN DE CERCHAS. PARA CUBIERTAS MÚLTIPLES SE HACE ZOCLO DE MATERIALES ENTRADA DE ARENAS. —




FEBRERO 3/2011.

- SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CERCHAS. PARA CUBIERTAS MÚLTIPLES SE HACE PUNETE DE JARDINERÍA. TAMBIÉN SE HACE ZOCLO EN PIEDRA CHINA. EN CORRIDOR AULAS 2º PISO.




SE TRANSFIERE LA INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN EL PRIMER PISO. — SE HACE ASO EN LA OBRA.




FEBRERO 5/2011

SE CONTINUA CON INSTALACIÓN PERILLA PARA CIELO RASO. — TAMBIÉN SE APLICA PULPLAST A MUROS EN FICHADOS.



FEBRERO 7/2011.

SE REPOSICIONA MURO DE FICHADOS DESTE PARA PODER APLICAR PULPLAST Y A QUE EL PUNETE APLICADO ERA ARRASADO POR QUE SE LE COLOCABA ENCHUFE EN PIEDRA VERDE — SE CONTINUA CON INSTALACIÓN DE CIELO RASO


10-MAR-2011
MA JOSE VILLALBA

FEBRERO 8/2011.

(97)

El comisionado de las prisiones - se comisiona con la estructura de los prisioneros y la estructura de las prisiones. Se comisiona con la estructura de las prisiones y la estructura de las prisiones.

FEBRERO 9/2011.

- Se comisiona con la estructura de las prisiones y la estructura de las prisiones.
- Se comisiona con la estructura de las prisiones y la estructura de las prisiones.
- Se comisiona con la estructura de las prisiones y la estructura de las prisiones.

Se comisiona con la estructura de las prisiones y la estructura de las prisiones.

Se comisiona con la estructura de las prisiones y la estructura de las prisiones.

Se comisiona con la estructura de las prisiones y la estructura de las prisiones.

Se comisiona con la estructura de las prisiones y la estructura de las prisiones.

Se comisiona con la estructura de las prisiones y la estructura de las prisiones.

Se comisiona con la estructura de las prisiones y la estructura de las prisiones.

Se comisiona con la estructura de las prisiones y la estructura de las prisiones.

Se comisiona con la estructura de las prisiones y la estructura de las prisiones.

Se comisiona con la estructura de las prisiones y la estructura de las prisiones.

Se comisiona con la estructura de las prisiones y la estructura de las prisiones.

Se comisiona con la estructura de las prisiones y la estructura de las prisiones.

10-MAR-2011
10-MAR-2011
10-MAR-2011

FEBRERO 11/2011

SE INSTALA PISO EN TABLETAS PERSIANAS EN CORREDOR DEL SEGUNDO PISO. - DELA MISMA MANERA SE TRAS EL PISO PARA EL CORREDOR PRIMER PISO (colocacion de) zoclo en piedra china. - SE PONE EL CUARTO DE ASEO. SE COLOCAN PUERTAS DE C. ASEO. C. ELECT. Y BAÑOS EXISTENTES. SE CONTINUA PINTURA DE MUROS Y SE COMIENZA CON LA COLOCACION DEL CIELO RASO EN SUPER BOARD, SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE CERCAS.

X 11/1

B.

FEBRERO 12/2011

CONTINUA INSTALACION DE PISO EN CORREDOR SEGUNDO PISO. TAMBIEN SE SIGUE LA INSTALACION DEL CIELO RASO SUPER BOARD. NO SE PUEDE TRABAJAR A PLENITUD POR FALTA DE AGUA Y A QUE ~~HA~~ SE HABIA AGOTADO TODA LA RESERVA DE AGUA EN LA OBRA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE SEVEDUCTO EN EL MUNICIPIO POR TRES DIAS DESDE EL DIA VIERNES SE CONTINUA ARMANDO CERCAS PARA ~~ARMANDO~~ MULTIPLE

10 MARZO 2011
HA JOSE JIMES

X 11/1

B.

FEBRERO 14/2011.

SE CONTINUA INSTALANDO PISO DE TABLETAS METALIZADA EN CORREDOR SEGUNDO PISO. SE INSTALA Y SE HACE DELA DIVISION ZONA PREESCOLAR Y ESNCAS. SE CONTINUA CON INSTALACION CIELO RASO. Y CON LA CONSTRUCCION DE LAS CERCAS SE INICIA HOY LA CONSTRUCCION DE LA N. E.

X 11/1

B.

SE CONTINUA CON EL PISO EN CORREDOR 2° PISO
TAMBIEN SE HACE PLANTILLA CON JUNTAS EN TABLON
EN ZONO ENTRE GRADOS Y ESCUCHAS. - SE CON-
TINUA CON LA CERCAS N° 6. - LAS OBRAS SIGUEN
SIN RESERVO DE AGUA. - SE TRAE AGUA DE
LA SIERRA EN LA CAMIONETA PARA PODER ADELAN-
TAR ALGUNOS TRABAJOS

X 18

B

FEBRERO 16/2011.

SE INSTALA PISO TABLETAS VITRIFICADAS EN
CORREDOR EXTERIOR PRIMER PISO. SE HACE
TAN PARA ZONAS EN PIEDRAS CHINAS. EN CORREDOR
VULS PRIMER PISO - SE CONTINUA TAMBIEN CON
LA INSTALACION DEL CIERO RASO - SE COLOCAN
JUNTAS EN TABLON Y SE HACE PLANTILLA EN EL
VARGO ENTRE LA ESCUCHA Y GRADOS. SE COLOCA
EL ENCHAFE VERDE EN MURO DE FACHADA NORTE
SE CONTINUA CON RESOLANDAS DE LAS CERCAS DE
LA CUBIERTA PARA GRUPOS MULTIPLES

10-Marzo-2011
H. Jose Vides

X 18

B


FEBRERO 17/2011

SE CONTINUA INSTALACION DE PISO EN TABLETAS
DE CERSAIES. - EN EL PERIMETRO DEL EDIFICIO.
TAMBIEN SE CONTINUA CON EL ENCHAFE VERDE
EN EL MURO DE FACHADA NORTE - SE SIGUE
CON INSTALACION Y ACABADOS CIERO RASO. SE
CONTINUA RESOLANDANDO LAS CERCAS PARA
LA ESCUCHA MULTIPLE

X 18
B

110
FEBRERO 18/2011


SE CONTINUO CON LA COLOCACION DE ENCHAPÉ VERDE EN LOS MUROS DE LA FACHADA NORTE, SE LEVANTA MURO DE CERRAMIENTO ALREDEDOR DE CERRAMIENTO EN CERRAMIENTO MULTIPLE PARA DAR MAYOR CAPACIDAD Y VISTA AL NORO. SE CONTINUO CON PISOS ALREDEDOR DEL EDIFICIO DE AULAS, TAMBIEN SE SIGUE CON EL VIERO RASO COLOCACION DE LAMINAS SUPER BOARD., SE CONTINUO CON EL RESALADO DE LAS CERCAS PARA CERCAS (~~XXXXXX~~). MULTIPLE



FEBRERO 19/2011.


SE CONTINUO COLOCACION DE ENCHAPÉ VERDE EN MUROS - SE LEVANTA CERRAMIENTO EN CERRAMIENTO MULTIPLE - SE SIGUE CON LOS PISOS EN TABLON DE GRES ALREDEDOR DEL EDIFICIO DE AULAS. SE SIGUE CON EL VIERO RASO COLOCACION DEL SUPER BOARD. SE LE APLICAN SELANTE DE JUNTAS Y EL CEMENTO

10-marzo-2011
Ha Jose Udes



FEBRERO 21/2011.

SE COLOCA PISO ENTUBADOR DE GRES EN ALREDEDOR DE AULAS PRIMER PISO - SE CONTINUA CON EL VIERO RASO (COLOCACION DE CERRAMIENTO Y SELLO DE JUNTAS DE LAMINAS CON MASTIC. SE HACEN CORTES DEL ENCHAPÉ EN EL BANDO PREESCOLAR



FEBRERO 22/2011.



SE CONTINUO CON SUSTITUCION VIERO RASO EN SUETAPAS DE REBOSOS. - SE INSTALA PISO EN TABLON DE GRES. SE APLICAN PULPAST EN MUROS. FACHADAS. SUR. SE

FEBRERO 23/2011. 

SE CONTINUA CON INSTALACION PISO EN TABLETA DE GRES.



EN CORREDOR primer piso - SE SIGUE CON LA APLICACION DEL puliplast - EN TACHOS SUR - SE RECIBE VISITA DEL DR. WILBER HERRERA DEL D.N.P.


QUE EN ES ATENDIDO POR EL DR. ARNOLD ORTIZ POR PARTE DEL CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES.

FEBRERO 24/2011.

SE CONTINUA CON INSTALACION PISO EN TABLETA DE GRES - SE SIGUE TAMBIEN CON EL ACABADO DEL CIELO PISO. CON CIELOS Y AUSTIC. SE HACE LIMPIEZA EN LA OBRA - TAMBIEN SE INICIA EL ENCHAFE EN EL BAÑO DE DISPOSITIVOS - CONTINUA LA APLICACION DEL puliplast EN MUROS - EXTERIOR TACHOS SUR Y EN CORREDOR primer piso


FACI 10-marzo-2020
Firma M^a JOSE VILLAS

H2
572

**CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL ARGOTE
VEGA. SEDE B.**

10-MARZO-2020
HA JOSE VIDES

113

535





INTERVENTORIA:
CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	CONTRATISTA: CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SITIO: CABECERA MUNICIPAL
INSTITUCIÓN RAFAEL ARGOTE VEGA SEDE 2			
PERIODO 26/01/2011 AL 26/02/2011			
FECHA FEBRERO 26 DEL 2010			
SITIO CABECERA MUNICIPAL			

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Si/Bueno	No/Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	x		
- Regularidad del mantenimiento	X		NO HAY PROBLEMA CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS
- Vibraciones /Ruidos	x		
- Protecciones / Guardas / Frenos	x		
- Idoneidad operarios		x	
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	x		
- Buen estado	x		
- Fácil acceso y operación	x		
- Uso según zona de trabajo		x	NO APLICA POR QUE EL CAMPAMENTO ES GENERAL PARA CADA OBRA.
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	x		LA DOTACION ES INCOMPLETA EN LA MAYORIA DE LOS OBREROS
- Buen estado	x		
- Uso según zona de trabajo	x		NO APLICA
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		NO EXISTE UNA RUTA DE EVACUACION DISEÑADA PARA LOS TRABAJADORES DE LA OBRA.
- Uso según zona de trabajo	X		SI EXISTE ILUMINACION ARTIFICIAL, PUES SE HAN TENIDO UNAS JORNADAS NOCTURNAS.
VIGILANCIA			
- Personal suficiente	x		EL PERSONAL ES SUFICIENTE PARA DESARROLLAR ESTA LABOR
- Diurna	x		LA VIGILANCIA DIURNA CORRE POR CUENTA DEL ALMACENISTA
- Nocturna	x		EXISTE PERSONAL INFORMAL COMO VIGILANCIA NOCTURNA.
EMERGENCIAS			
- Afiliación del Personal al Sistema de Seguridad Social y ARP	x		
	x		

Firma: 
 MIGUEL VARGAS SÁNCHEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA

Firma: 
 JAIME MERCADO RUIZ
 COORDINADOR TÉCNICO DE INTERVENTORIA

10-marzo-2020
 174 Jose Vides

117
534

**CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL ARGOTE
VEGA. SEDE B.**

10-MARZO-2020
119 Jose VDO

445
 535



CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

CONTROL DE ROL DEL ESTADO DEL TIPO

CONTRATO: CONSTRUCCION Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA

SUPERVISION DEL CONTRATO: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

INSTITUCION

RAFAEL ARGOTE VEGA SEDE 2

PERIODO

ENE 26 -11 A FEB 26 -11

SITIO


CABECERA MUNICIPAL

FECHA

FEBRERO 26 DEL 2011

No.	FECHA	HORAS SOL	HORAS LLUVIA	LLUVIA EN LA NOCHE	OBSERVACIONES
1	26/12/2011	8	0	SI NO	
2	27/12/2011	6	2	X	
3	28/12/2011	8	0	X	
4	29/12/2011	8	0	X	
5	30/12/2011	8	0	X	
6	01/01/2011	8	0	X	
7	02/01/2011	8	0	X	
8	03/01/2011	8	0	X	
9	04/01/2011	8	0	X	
10	05/01/2011	8	0	X	
11	06/01/2011	8	0	X	
12	07/01/2011	8	0	X	
13	08/01/2011	8	0	X	
14	09/01/2011	8	0	X	
15	10/01/2011	8	0	X	
16	11/01/2011	8	0	X	
17	12/01/2011	8	0	X	
18	13/01/2011	8	0	X	
19	14/01/2011	8	0	X	
20	15/01/2011	8	0	X	
21	16/01/2011	8	0	X	
22	17/01/2011	8	0	X	
23	18/01/2011	8	0	X	
24	19/01/2011	8	0	X	FUERTE LLUVIA DESDE LAS 10:0 AM HASTA LAS 4:0 PM
25	20/01/2011	8	0	X	
26	21/01/2011	8	0	X	
27	22/01/2011	8	0	X	
28	23/01/2011	8	0	X	
29	24/01/2011	8	0	X	
30	25/01/2011	8	0	X	
31	26/01/2011	8	0	X	

SOL 246
LLUVIA 2



Firma: 
Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TECNICO DE INTERVENTORIA


Firma: 
Nombre: MIGUEL VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA

10-marzo-2020
 Ma Jose Vides

H6
576

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

10-marzo-2020
H4 Jose Vides

	CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		INSTITUCIÓN		RAFAEL ARGOTE VEGA SEDE B																											
			PERIODO		26/01/1 A 26/02/1																											
			PAGINA	1	DE	1																										
			FECHA	26	2	2011																										
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.			CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR			SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: CABECERA MUNICIPAL																								
CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA																																
PERSONAL	DIA	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
NILMERO HERRERA																																
ARIS OROZCO																																
NIVALDO PADILLA																																
DANIEL BOLAÑOS																																
PEDRO TRUJILLO																																
ALEXANDER PEREZ																																
AQUILINO CADENA																																
LEIDER MENDOZA																																
MANUEL JIMENEZ																																
VICTOR JIMENEZ																																
CARLOS CAAMAÑO																																
Firma _____ Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS COORDINADOR ADMINISTRATIVO Matrícula No. : 08700-69126 ATLÁNTICO 																																

10- MAR 20 2010
 14:300 UDES


52X


H8

S28

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

10-marzo-2020
Mr Jose Uides



FECHA	26	02	11

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONVENCIONES
ACTIVO = A
REPARACION = R
INACTIVO = I
NO APLICA = N

Nombre: MIGUEL VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA

[illegible]

1281

120
540

ESCUELA RURAL MIXTA LA ESTACIÓN

10-mar-10-2020
H4 José Vides

127
541



INTERVENTORIA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	CONTRATISTA: CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SITIO: VEREDA LA ESTACION
INSTITUCION	LA ESTACION		
PERIODO	26/01/2011 AL 26/02/2011		
FECHA	FEBRERO 26 DEL 2010		
SITIO	VEREDA LA ESTACION		

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Si/Bueno	No/Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	N.A		
- Regularidad del mantenimiento			
- Vibraciones /Ruidos	x		
- Protecciones / Guardas / Frenos	x		
- Idoneidad operarios		X	POR LO GENERAL UN OBRERO ES EL ENCARGADO DE MANEJAR LOS EQUIPOS
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	x		
- Buen estado	x		
- Fácil acceso y operación	x		
- Uso según zona de trabajo		x	NO APLICA POR QUE EL CAMPAMENTO ES GENERAL PARA CADA OBRA.
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	x		LA DOTACION BASICA ES COMPLETA (CASCO, GUANTES, BOTAS, GAFAS.)
- Buen estado	x		
- Uso según zona de trabajo	x		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		NO EXISTEN RUTAS DE EVACUACION DEL PERSONAL DE LA OBRA.
- Uso según zona de trabajo	X		SE UTILIZA SOLAMENTE CUANDO HAY JORNADA NOCTURNA LA CUAL NO ES MUY HABITUAL.
VIGILANCIA			
- Personal suficiente	x		NO EL PERSONAL NO ES SUFICIENTE
- Diurna	x		EL ALMACENISTA HACE LABORES DE VIGILANCIA
- Nocturna	x		CELADURIA NOCTURNA A CARGO DE PERSONAL CONTRATADO POR EL CONTRATISTA.
EMERGENCIAS			
- Afiliación del Personal al Sistema de Seguridad Social y ARP	x		
	x		

Firma: Miguel Vargas Sánchez
 MIGUEL VARGAS SÁNCHEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA

Firma: Jaime Mercado Ruiz
 JAIME MERCADO RUIZ
 COORDINADOR TÉCNICO DE INTERVENTORIA

10 marzo 2020
 Ha José Vides

122

542

**CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO.
ESCUELA RURAL MIXTA LA ESTACIÓN.**


10-Mar-20-2020
Ha José Lides


123
543

INTERVENTORIA:					
CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA					
CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO					
CONTRATO: CONSTRUCCION Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA					
CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR					
SUPERVISION DEL CONTRATO: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS					
INSTITUCION					
LA ESTACION					
PERIODO					
ENE 26-11 A FEB 26-11					
SITIO					
VEREDA LA ESTACION					
FECHA					
FEBRERO 26 DEL 2011					
No.	FECHA	HORAS SOL	HORAS LLUVIA	LLUVIA EN LA NOCHE	OBSERVACIONES
1	26/12/2010	6	2	SI	NO
2	27/12/2010	6	2		X
3	28/12/2010	8	0		X
4	29/12/2010	8	0		X
5	30/12/2010	8	0		X
6	01/01/2011	8	0		X
7	02/01/2011	8	0		X
8	03/01/2011	8	0		X
9	04/01/2011	8	0		X
10	05/01/2011	8	0		X
11	06/01/2011	8	0		X
12	07/01/2011	8	0		X
13	08/01/2011	8	0		X
14	09/01/2011	8	0		X
15	10/01/2011	8	0		X
16	11/01/2011	8	0		X
17	12/01/2011	8	0		X
18	13/01/2011	8	0		X
19	14/01/2011	8	0		X
20	15/01/2011	8	0		X
21	16/01/2011	8	0		X
22	17/01/2011	8	0		X
23	18/01/2011	8	0		X
24	19/01/2011	6	2		X FUERTE LLUVIA EN HORAS DE LA TARDE
25	20/01/2011	8	0		X
26	21/01/2011	8	0		X
27	22/01/2011	8	0		X
28	23/01/2011	8	0		X
29	24/01/2011	8	0		X
30	25/01/2011	8	0		X
31	26/01/2011	8	0		X

SOL 242
LLUVIA 6

LLUVIA 2%
SOL 98%



Firma: 
ARQ. JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TECNICO DE INTERVENTORIA

Firma: 
ARQ. MIGUEL ANTONIO VARGAS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA

10-Mar-20-2020
M4 Jose Vides

124

544

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

10-marzo-2020
Mu Jose Udes

	CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA																				INSTITUCION	LA ESTACION									
																					PERIODO	26/01/1 A 26/02/1									
																					PAGINA	1	DE	1							
																					FECHA	26	2	2011							
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.										CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR										SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS				SITIO: VEREDA DE CHIRIGUANA							
CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA																															
DIA	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
PERSONAL																															
RAFAEL GARCIA																															
FREDDY MURE TROYA																															
FREDY MURE																															
WALBERTO MACHUCA																															
ESTEBAN NAVARRO																															
FELIX VILLAFANE																															
REINALDO DITA																															
Firma: 																															
Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS COORDINADOR ADMINISTRATIVO Matrícula No. : 08700-69126 ATLÁNTICO																															

10-Marzo-2010
 HA 1304

545
 125

126
546

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

70-marzo-2020
Mr Jose Vides



CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCION	LA ESTACION		
PERIODO			
PAGINA	1	DE	1

FECHA 26 02 11

CONTRATISTA

CONSTRUCCION Y ADECUACIONES DE AMBIENTES
ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS
EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANASUPERVISION DEL
CONTRATOSECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS
PUBLICAS

SITIO: LA ESTACION

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA MAQ/EQUI.	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
MEZCLADORA	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
VIBRADOR	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
SIERRA ELECTRICA	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
VIBROCOMPACTADO R TIPO RANA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOBOMBA	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I
GATOS	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
CERCHAS	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
CHAZAS	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
ANDAMIOS	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

CONVENCIONES

ACTIVO = A
REPARACION = R
INACTIVO = I
NO APLICA = N

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TECNICO DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA54x
127

~~128~~

548

ESCUELA RURAL MIXTA SANTA RITA – EL CRUCE

10-marzo-2020
Mr José Vides


~~129~~
549

**INFORME DE AVANCE DE OBRAS DE LA
ESCUELA RURAL MIXTA SANTA RITA
- EL CRUCE -**

10-marzo-2020
H. José Vides

130
550

**INTERVENTORIA:
CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA**



**INFORME DE INTERVENTORIA OBRAS ESCUELA SANTA RITA DEL
CRUCE CORREGIMIENTO DE LA SIERRA
PERIODO ENERO 26 DEL 2011 A FEBRERO 26 DEL 2011**

ENERO 27 DEL 2011

Se realizó actividades de pañete allanado fachada exterior espesor 2 centímetros, en el área de aulas de clase, filetes de puertas y ventanas de la misma área, se comenzó la construcción del gotero del alero del eje B del bloque de aulas, se continuo con resanes de puntos eléctricos, se continuo con la actividad de levante del piso del bloque de apoyo estudiantil, se hizo formaleta e instalo el acero de refuerzo de la rampa de acceso correspondiente al primer tramo en el bloque de apoyo académico, se continuo con las actividades de corte y replanteo para la plazoleta.

ENERO 28 DEL 2011

Se continua realizando gotero en el eje B en las aulas y detalles en filetes interiores, se resanaron perforaciones en la cuchillas del eje B del área de aulas para anclaje de vigas, se continua con el levante en bloque No 4 para el bloque de apoyo académico, se funde viga dintel sobre el eje 1 en el área de la sala de profesores, se continua los cortes y nivelación de terreno para la plazoleta.

ENERO 29 DEL 2011

Se continúa con el levante en bloque No 4 para el área de apoyo académico, se comenzó a fundir la plantilla en concreto para la plazoleta entre el bloque de aulas y el bloque de apoyo académico.

ENERO 31 DEL 2011

Se inicio actividad de pañete del área de bodega del bloque de apoyo académico en el primer piso, se comienza la actividad de levante en bloque como segundo piso bloque de apoyo académico, fundida e instalación de dinteles bloque de apoyo académico en el primer piso, se fundió la segunda columna de soporte de la rampa de acceso al segundo piso del bloque de apoyo académico, se inicia pañete exterior sobre muro de la fachada exterior del bloque de apoyo académico se continua los cortes y nivelación de terreno para la plazoleta.

FEBRERO 01 DEL 2011

Se continua con el pañete interior de la bodega y la sala de profesores en el primer piso del bloque de apoyo académico, se continua con los pañetes de las fachadas, se continua con el armado de hierro de la losa del segundo piso en el bloque de apoyo académico, levante en el primer piso de la misma área, se funde el primer tramo de la rampa de acceso al segundo piso del bloque de apoyo académico, se inicia la actividad de levante de sobre nivel correspondiente al segundo tramo de la rampa de acceso.

Oficina: Calle 106 No 50-102 Oficina 7

Tel: 3735058 Fax: 3739606

Banquillo - Colombia

E-mail: rafaelperez333@hotmail.com

Oficina Chiriguano: Calle 8 No 1-203 Chiriguano

Cel: 311 6505205 - 311 4113067

E-mail: arq.miguelvargas@hotmail.com

10-marzo-2011
Jose Vides

13T
551

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA ESCUELA RURAL MIXTA LA ESTACIÓN.

10 - marzo - 2020
Ma José Vides

132

552

**CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO.
ESCUELA RURAL MIXTA SANTA RITA – EL CRUCE**

10-Marzo-2020
Ma José Vides

133


SSB

INFORME DE AVANCE DE OBRAS DE LA ESCUELA RURAL MIXTA LA ESTACIÓN.

10-Marzo-2020
H4 Jose Udes.

134
554

**INTERVENTORIA:
CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA**



**INFORME DE INTERVENTORIA OBRAS ESCUELA DE LA VEREDA LA
ESTACION
PERIODO ENERO 26 DEL 2011 A FEBRERO 26 DEL 2011**

27 DE ENERO DEL 2011:

Instalación de concertina sobre muros, además se realizó el levante externo del muro de la cocina, y la excavación para las instalaciones sanitarias.

28 DE ENERO DEL 2011

Se continúa con la colocación de la concertina, se instala tubería sanitaria de la cocina, se limpian los registros sanitarios.

29 DE ENERO DEL 2011.

Se continúa con la instalación de concertina sobre los muros de la escuela, levante de muros para jardineras, excavación para conectar los registros sanitarios existentes.

31 DE ENERO DEL 2011.

Se continúa con la instalación de concertina sobre los muros de la escuela, se continúa el levante de muros para jardineras, excavación para conectar los registros sanitarios existentes a los cuales se les hace limpieza y se replantean las cañuelas, arreglo de terreno para la construcción de la cuneta faltante, instalación de tubería sanitaria, solado para registro sanitario.

FEBRERO DEL 2011.

Se continúa con las actividades del día anterior y se pañeta el muro de la jardinera.

02 DE FEBRERO DEL 2011.

Fundición de dos tramos de cuneta, fundida de plantilla, excavación para tubería sanitaria, pañete para muro de jardinera, solado para registros sanitarios.

03 DE FEBRERO DEL 2011.

Adecuación y arreglo de terreno, fundida de piso, colocación de cubierta de cocina, levante de muros para continuación de jardinera.

04 DE FEBRERO DEL 2011.

Se realizan actividades de fundición de tres tramos de cuneta limpieza y reconstrucción de cañuelas de los registros sanitarios existentes.


Oficina: Calle 106 No 50-102 Oficina 7
Tel: 3785058 Fax: 3739606
Barranquilla - Colombia
E-mail: rafaelperez333@hotmail.com
Oficina Chiriguana: Calle 8 No 1-203 Chiriguana - Cesar
Cel: 311 6505205 - 311 4113087
E-mail: arq.miguelvargas@hotmail.com

10 marzo 2020
M^a Jose Lobo

135

SSS

INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA



05 DE FEBRERO DEL 2011.

Instalación de tubería sanitaria, fundida de un modulo de cuneta.

07 DE FEBRERO DEL 2011 y 08 DE FEBRERO DEL 2011.

La obra se suspendió por falta de materiales de construcción, en especial de cemento.

09 DE FEBRERO DEL 2011

Desmonte de ventanas, instalación de ventanas, y sondeo y limpieza de la tubería sanitaria existente.

10 DE FEBRERO DEL 2011

Se realiza una reunión con los obreros y el personal administrativo de la obra para clarificar la importancia de mantener puestos los elementos de seguridad industrial, demolición de muro de cocina, retiro de material sobrante, relleno de excavación sanitaria.

11 FEBRERO DEL 2011, 12 DE FEBRERO DEL 2011 y 14 DE FEBRERO DEL 2011

La obra la suspenden los trabajadores aduciendo atraso en el pago de los salarios-

15 FEBRERO DEL 2011

Levante de muros de jardinera, pringada de muros, demolición.

16 DE FEBRERO DEL 2011

Arreglo de terreno para fundición de cuneta, salpicada de muros para pañete, levante de muros de muros para jardinera-

17 DE FEBRERO DEL 2011

Levante de muros para jardinera, pañete de muro para jardinera, y fundida de dos tramos de cuneta.

18 DE FEBRERO DEL 2011

Se fundieron dos tramos de cuneta, pañete de muros de jardinera, excavación para cuneta,

19 DE FEBRERO DEL 2011

Excavación de cimientos para jardinera, fundición de cimientos para jardinera, y limpieza general de la obra-

21 DE FEBRERO DEL 2011

Replanteo para cuneta fundida de siete tramos de cuneta-

Oficina: Calle 106 No 50-102 Oficina 7

Tel: 3785058 Fax: 3739606

Barranquilla - Colombia

E-mail: rafaelperez333@hotmail.com

Oficina Chiriguana: Calle 8 No 1-203 Chiriguana- Cesar

Cel: 311 6505205 - 311 4113087

E-mail: arq.miguelvargas@hotmail.com

10 marzo 2020
Mr. José Lides

**INTERVENTORIA:
CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA**



22 DE FEBRERO DEL 2011

Replanteo y perfilamiento de terreno para función de cuneta, pañete de jardineras y filetes de los mismos.

23 DE FEBRERO DEL 2011

Acarreo de materiales de arrastre a la obra se continua con los trabajos de la jardinera.

24 DE FEBRERO DEL 2011

Se inician las actividades de piso en tablón, pañetes de muros de jardinera y excavación para la instalación de tubería sanitaria de la posa séptica, se presenta una fuerte lluvia en horas de la tarde por lo que se paralizaron las actividades desde las 2:00 PM hasta las 4:00 PM

25 DE FEBRERO DEL 2011

Fundición de cunetas, pañetes de jardinera, se programa un inventario en el almacén para saber con cuanto material se cuenta, y se programa también un a jornada de limpieza de la obra-

26 DE FEBRERO DEL 2011

Fundición de cunetas, pañetes de jardinera, se rematan los filetes de los muros de la cocina y de la jardinera.





10-Marzo-2020
Ma Jose Uides

137

SSA

**RESUMEN FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRAS
DE LA ESCUELA RURAL MIXTA LA ESTACIÓN.**




10-marzo-2010
Mu. José Vides.

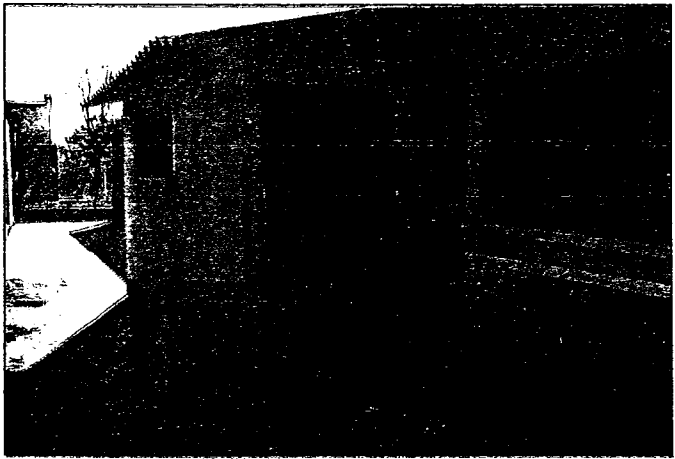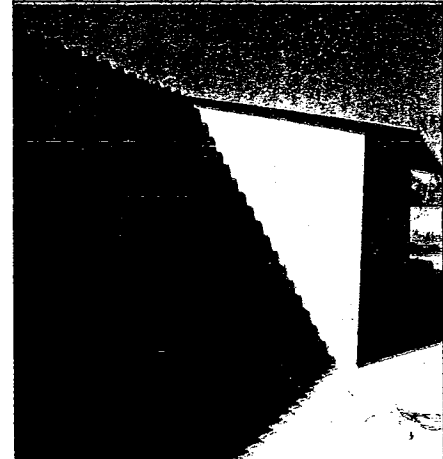	INTERVENTORÍA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		INSTITUCIÓN		LA ESTACION	
			PERÍODO		26/01-2011 AL 26/02/2011	
	PÁGINA		01	DE	9	
	FECHA		26	02	2011	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.		CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: VEREDA LA ESTACION
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
CONTENIDO: AMPLIACIÓN DE COCINA (CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE CILINDROS DE GAS.)			CONTENIDO: DETALLE. PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO (ESP 0,07) FACHADA POSTERIOR.			
Firma: 			Firma: 			
Nombre: <u>JAIME MERCADO RUIZ</u> COORDINADOR TÉCNICO Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.			Nombre: <u>MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ</u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.			

10-04-10-2010
 H. José V. J.



355

138

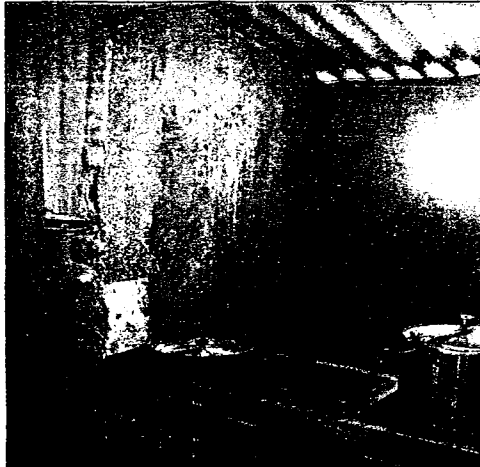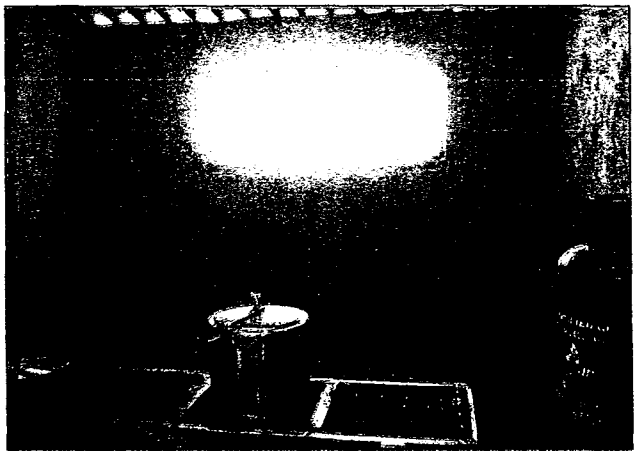	INTERVENTORÍA:		INSTITUCIÓN		LA ESTACION	
			PERIODO		26/01-2011 AL 26/02/2011	
	CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		PÁGINA		O2	DE 9
			FECHA		26	O2 2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.		CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: VEREDA LA ESTACION
REGISTRO FOTOGRAFICO						
						
CONTENIDO: DETALLE DE PANETE ALLANADO, SOBRE MURO INTERNO (ESP 0.07) E INSTALACIÓN DE VENTANERÍA, EN ALUMINIO.						
Firma 		Firma 				
Nombre: <u>JAIME MERCADO RUIZ</u> COORDINADOR TECNICO Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.		Nombre: <u>MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ</u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO				

10-Mar-12 10:05
 Ha Jose U.

511
 134

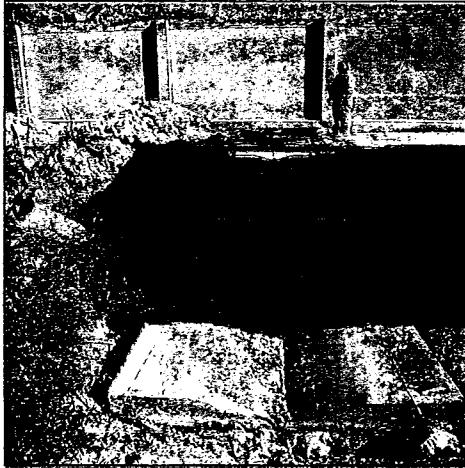
	INTERVENTORÍA:			INSTITUCIÓN		LA ESTACION	
	CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA			PERIODO		26/01-2011 AL 26/02/2011	
				PÁGINA		03 DE 9	
				FECHA		26 02 2011	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.			CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: VEREDA LA ESTACION
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
CONTENIDO: DETALLE, CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS RECOLECTORA DE AGUAS LLUVIAS. (PATIO INTERNO)				CONTENIDO: CUNETAS RECOLECTORA DE AGUAS LLUVIAS. (PATIO INTERNO)			
Firma: 				Firma: 			
Nombre: <u>JAIME MERCADO RUIZ</u> COORDINADOR TÉCNICO				Nombre: <u>MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ</u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO			
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.				Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO			

10-03-2011
 14-05-2011
 10-03-2011

560

140

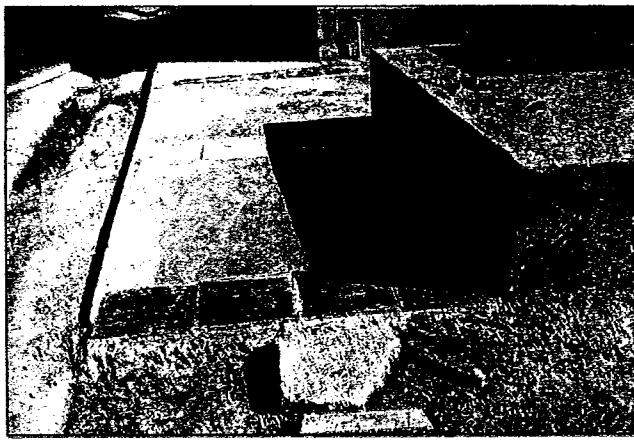

	INTERVENTORÍA:			INSTITUCIÓN		LA ESTACION	
	CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA			PERIODO		26/01-2011 AL 26/02/2011	
				PÁGINA		04 DE 9	
				FECHA		26 02 2011	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.			CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: VEREDA LA ESTACION
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
CONTENIDO: PLANTILLA EN CONCRETO, CON JUNTA EN TABLON VITRIFICADO. (AREA DE ANDEN DE CIRCULACIÓN, PATIO INTERNO)							
Firma <u> </u> Nombre: <u> </u> Matricula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.				Firma <u> </u> Nombre: <u> </u> Matricula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.			

10-01-20-2020
 14-03-20-2020
 14-03-20-2020

561
 14



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	LA ESTACION		
PERIODO	26/01/2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	05	DE	9
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: VEREDA LA ESTACION

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: EXCAVACIÓN Y REGISTRO SANITARIO PARA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA DE A.N DE LA UNIDAD SANITARIA A LA POZA SEPTICA.

CONTENIDO: DETALLE, CONSTRUCCIÓN DE FORMALETERIA PARA FUNDICIÓN DE CUNETAS RECOLECTORAS DE AGUAS LLUVIAS.

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma




Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.

10-03-2011
10-03-2011
10-03-2011

562
142

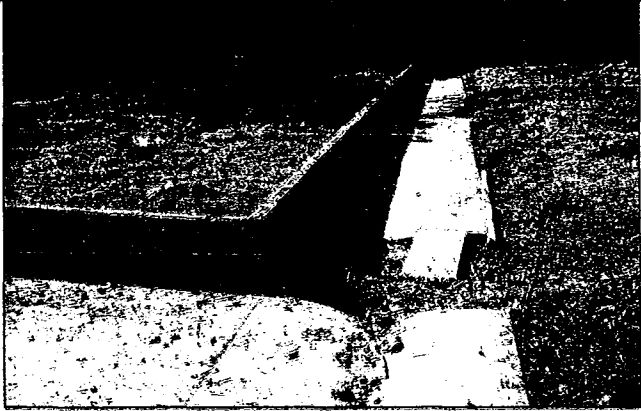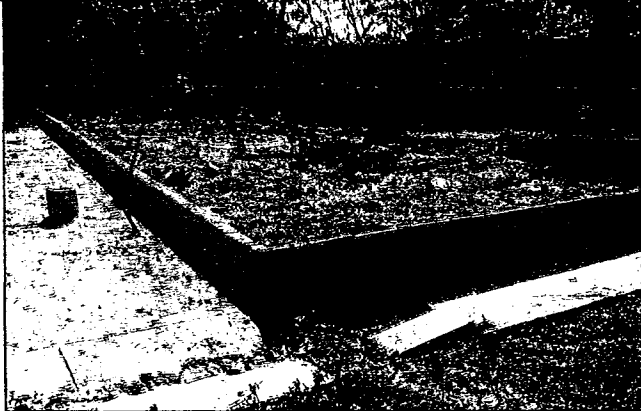	INTERVENTORÍA:		INSTITUCIÓN		LA ESTACION	
	CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		PERIODO		26/01-2011 AL 26/02/2011	
			PÁGINA	06	DE	9
			FECHA	26	02	2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.		CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: VEREDA LA ESTACION
REGISTRO FOTOGRAFICO						
 						
CONTENIDO: DETALLE. CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA, EN BLOQUE SAMO (H. 0,40)						
Firma: 			Firma: 			
Nombre: <u>JAIME MERCADO RUIZ</u> COORDINADOR TECNICO			Nombre: <u>MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ</u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO			
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.			Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO			

10-Marzo-2020
 H. José Vides



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN

LA ESTACION

PERIODO

26/01/2011 AL 26/02/2011

PÁGINA

07

DE

9

FECHA

26

02

2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: VEREDA LA ESTACION

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN DE JARDINERA.

CONTENIDO: DETALLE. CIMENTACIÓN EN CONCRETO CICLOPEO. PARA JARDINERA.

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

AD. MORT. 2020
Ha José Vides

564
114



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	LA ESTACION		
PERÍODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	08	DE	9
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: VEREDA LA ESTACION

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA, EN LADRILLO, (PATIO INTERNO)

CONTENIDO: DETALLE, PAÑETE SOBRE MURO DE JARDINERA, PATIO INTERNO.

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10-MAR-20-2020
14-JOSÉ LUIS

561
145



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	LA ESTACION		
PERIODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	08	DE	9
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: VEREDA LA ESTACION

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSERTINA.
FACHA POSTERIOR.

CONTENIDO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSERTINA.
PRINCIPAL.

FACHA

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TECNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.

17 de marzo 2011
Ha Jose Luis

SLC
HLC



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	LA ESTACION		
PERÍODO	24/01-2011 AL 24/02/2011		
PÁGINA	08	DE	9
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: VEREDA LA ESTACION



ESTRO FOTOG



CONTENIDO: CONSTRUCCIÓN Y PANETE SOBRE MURO, DE JARDINERA (PATIO INTERNO)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10. Marzo 2011
HE FOR NIGES

EX
H7



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA


INSTITUCIÓN	LA ESTACION		
PERÍODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	09	DE	9
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: VEREDA LA ESTACION

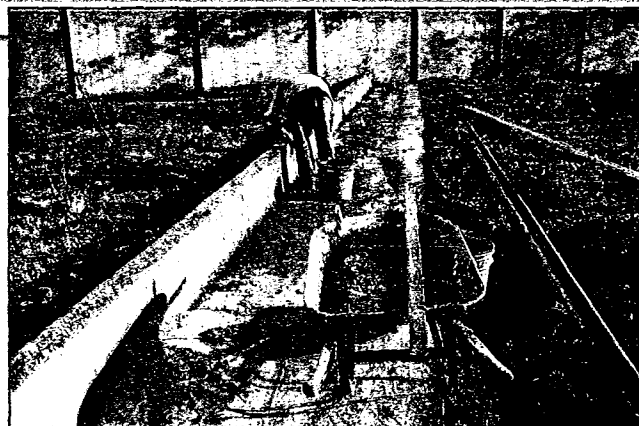

RO FOTOGRAFICO



CONTENIDO: DETALLE, PAÑETE ALLANADO Y FILETE DE MURO, (JARDINERA INTERNA)

CONTENIDO: TRAZADO Y REPLANTEO, PARA CUNETAS RECOLECTORA DE AGUAS LLUVIAS.

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10- mayo-2020-
H. José O. B.

548
158

149

569

PROGRAMACIÓN DE OBRAS DE LA ESCUELA RURAL MIXTA LA ESTACIÓN.

10-marzo-2020
Mr José Vides

PROGRAMACION DE OBRAS

LA ESTACION

	DICIEMBRE																								ENERO																									
	semana 9						semana 10						semana 11						semana 12						semana 13						semana 14						semana 13						semana 14							
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
PRELIMINARES																																																		
EXCAVACIONES Y RELLENOS ESTRUCTURALES																																																		
OBRAS VARIAS																																																		
ESTRUCTURAS																																																		
MAMPOSTERÍA Y PREFABRICADOS																																																		
PAÑETES																																																		
CUBIERTAS																																																		
PISOS																																																		
ACABADOS																																																		
CARPINTERIA METALICA																																																		
INSTALACIONES HIDRAULICAS																																																		
INSTALACIONES SANITARIAS																																																		
INSTALACIONES ELECTRICAS																																																		
OBRAS COMPLEMENTARIAS																																																		

10-Marzo-2020
T+ Jose Udes

STC
ASB

151
571

**FOTOCOPIA DE LA BITÁCORA QUE MUESTRA EL
AVANCE DE OBRAS DE LA ESCUELA RURAL MIXTA
LA ESTACIÓN.**

10 - marzo - 2020
Mr. José Uides

25-Enero-Martes /2011

152

- Excavación para registros sanitarios
- ~~Arro~~ Formalelas para cunetas
- Colocación de concertina

92

26-Enero-Miércoles /2011

- Colocación de concertina
- Excavación para instalaciones sanitarias
- Tendida de plantilla

27-Enero-Jueves /2011

- Colocación de concertina
- Excavación para instalaciones sanitarias
- Levante de muro en la cocina

28-Enero-Viernes /2011

- Colocación de concertina
- ~~Exc~~ instalación de tubería sanitarias
- Limpieza de registros sanitarios
- Excavación para instalaciones sanitarias

29-Enero-Sábado /2011

- Colocación de concertina
- Levante de muro para jardinera
- Excavación para instalaciones sanitarias
- ~~Limpieza~~

31-Enero-Lunes /2011

- colocación de concertina
- Excavación para instalaciones sanitarias
- arreglo de terreno y Nivelación para cunetas
- instalación de tubería sanitarias
- Solado para registros sanitarios

10-Marzo-2020
H4 José Luis

1-Febrero-Martes/2011

153

- colocación de concertina
- Excavación para tubería sanitaria
- Pañete en muro para jardinera
- instalación de tubería Sanitarias

573

2-Febrero-Miércoles/2011

- Fundida de 2 tramos de coneta (4 mts)
- Fundida de plantilla
- Excavación para tuberías Sanitarias
- pañete en muro para jardinera
- Solado para registros sanitarios

3-Febrero-Jueves/2011

- arreglo de terreno
- Fundida de piso
- colocación de cubierta en la cocina
- Excavación para tubería sanitaria
- levante de muro para jardinera
- pañete en muro de jardinera

4-Febrero-Viernes/2011

- arreglo y Nivelación de terreno para coneta
- Excavación Para tubería Sanitaria
- Se Fundieron 3 tramos de coneta
- Limpieza de registros Sanitarios

5-Febrero-Sábado/2011

- instalación para de tubería Sanitaria
- Fundida de 7 tramo de coneta

10-Marzo-2020
FHA Jose Vides

154
 - No se laboró por falta de material de construcción específicamente cemento

Febrero 7 y 8 - Lunes y Martes / 2017

- Desmonte de ventana
- Instalación de ventana
- Limp. Suelo de tuberia sanitaria existente

Febrero 10 - Jueves / 2017

- Demolicion de muro en cocina
- ~~de~~ cambios

- Relleno en excavación de tuberia sanitarias

Febrero 11 y 12 - Viernes y Sabado / 2017

- No se laboró porque los trabajadores exigian el salario para seguir laborando.

Febrero 14 - Lunes - / 2017 -

- No se laboró por falta de pago para los trabajadores

Febrero 15 - Martes / 2017

- Levante de jardinera
- Pintada de muro
- Demolicion de andén

10 marzo 2020
 Hacer unes

155
575
Febrero 16 - Miércoles /2011

- Levante de muro para jardinera
- Plingada de muro
- pañete de muro
- Areglo de terreno para cuneta

Febrero 17 - JUEVES /2011

- Levante de muro para jardinera
- pañete de muro de jardinera
- Fundida de 2 tramos de cuneta

Febrero 18 - Viernes /2011

- Fundida de 2 tramos de cuneta
- pañete en muro de jardinera
- Excavación de cuneta

Febrero 19 - Sábado /2011

- Excavación de cimiento para jardinera
- Fundida de cimiento para jardinera
- Limpieza general en la obra

Febrero 21 - lunes /2011

- Replanteo para cuneta
- Fundida de 7 tramos de cuneta

Febrero 22 - Martes /2011

- Replanteo y Nivelación de terreno para cuneta
- pañete de muro de jardinera
- colocación de ~~ladrillos~~
- Acarreo de arena

Ts

10-marzo-2020
H^a José Udes

Febrero 23 - Miércoles / 2011

156

576

- Acarreo de Arena
- Pañete en muro de jardinera
- Levante de muro en jardinera

Febrero 24 - Jueves / 2011

- piso en tablón
- Pañete en muro de jardinera
- Excavación para tubería de Sanitoria - en poza séptica

Febrero 25 - Viernes / 2011

- Fundida de coneta
- limpieza en la obra
- Pañete en muro de jardinera

Febrero 26 - Sábado / 2011

- Fundida de coneta
- achicaron registros sanitarios


10 - marzo - 2020
H# Jose Udes.

157
577

10-marzo-2020
M^a Jose Lides

INTERVENTORIA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA



FEBRERO 02 DEL 2011

Se continuó con la construcción del gotero en el área de las aulas, se continua el levante en bloque en la fachada paralela al eje A primer piso bloque de apoyo, se realiza corte en la plantilla para los cimientos del baño en el bloque de apoyo académico, se salpico con un pañete comercial las cara de las columnas del bloque de apoyo académico como preparación para el pañete de las mismas, se comenzó la actividad de levante de muros en bloque samo para el segundo piso del bloque de apoyo académico se culminan las actividades de corte, replanteo y nivelación para la plazoleta.

FEBRERO 03 DEL 2011

Se comenzó a tomar los detalles de los pañetes en el bloque de aulas y limpieza de las mismas, se fundieron las vigas de cimiento para levantes de baño bloque de apoyo del primer piso, se fundieron puntos de tomas de alumbrado del bloque de apoyo académico, se realizo actividades de levante en bloque No 4, división entre columnas B-3 y B-2 del primer piso del bloque de apoyo ecdémico, se continua levante en el segundo piso del bloque de apoyo acceso a biblioteca y al interior de la misma, además se continua levante que divide el bloque de biblioteca con salón de informática en el segundo piso, se definió con la Interventoría luego de la visita del Alcalde Municipal juegos de niños (trasladar) al lado del comedor existente y cerramiento d3e acceso existente, por lo que se hace necesario rellenar y compactar con material seleccionado dicha zona, se continua fundiendo apoyos de refuerzos al levante del segundo piso en el bloque de apoyo académico, se descofro primer tramo de acceso a rampa principal. Y se empezó a formaletear el segundo tramo y a instalar acero de refuerzo, se realizo pañete en el muro entre columnas D- 2 y C-2 área de oficinas.

FEBRERO 04 DEL 2011

Se inicio el levante de muro en bloque No 4 para baños área de la sala de profesores, se termina de armar la obra falsa para el segundo tramo de la rampa de acceso al segundo piso del bloque de apoyo académico, se realiza la actividad de construcción de registros sanitarios área sala de profesores, se continua fundiendo columnetas de apoyo para la rampa de acceso.

FEBRERO 05 DEL 2011

Se continua el armado del acero de refuerzo para el segundo tramo de la rampa de acceso se continua levante en el segundo piso del bloque de apoyo acceso a biblioteca y al interior de la misma.

FEBRERO 07 DEL 2011

Se continúa el armado del acero de refuerzo para el segundo tramo de la rampa de acceso, se inician regatas para red de tubería eléctrica.

Oficina: Calle 106 No 50-102 Oficina 7

Tel:3785058 Fax: 3739606

Barranquilla - Colombia

E-mail: rafaelperez333@hotmail.com

Oficina Chiriguanà: Calle 8 No 1-203 Chiriguanà- Cesar

Cel: 311 6505205 - 311 4113087

E-mail: arq.miguelvargas@hotmail.com

10 marzo 2020
M4 José Udes

**INTERVENTORIA:
CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA**



FEBRERO 08 y 09 DEL 2011

Excavación para cuneta de recolección de aguas lluvias entre bloque de apoyo y bloque de aulas, se fundió el segundo tramo de rampa de acceso, se comenzó a fundir plantilla en concreto para fondo de cuneta paralela entre bloque de apoyo y aulas.

FEBRERO 10 DEL 2011

Se continuo con las excavaciones de cuneta recolectora de aguas lluvias, se instalaron puntos de tomas y Swiches bloque de apoyo académico, se continuo con pañete interior primer piso bloque de apoyo.

FEBRERO 11 al 14 DEL 2011

La obra estuvo suspendida por falta de pago a los trabajadores de la misma.

FEBRERO 15 DEL 2011

Se continua con el armado de la estructura y fundida (rampa de acceso principal al bloque de apoyo académico.) se continúan actividades de pañete de muros interiores del bloque de apoyo académico en el primer piso, Suministro e instalación de cubierta en lamina, (ajover) y fijación de tornillos (torofill.).

FEBRERO 16 y 17 DEL 2011

Se continua con el pañete allanado sobre muro (esp. 0,07) área interna bloque de apoyo académico. Se continua con el levante de muro en bloque samo, área de baño (bloque de apoyo académico)

FEBRERO 18 y 19 DEL 2011

Se continua con la fundida de plantilla en concreto (esp 0,10) patio interno, entre bloque de aulas de clases y bloque de apoyo académico, Se continua con el pañete allanado sobre muro (esp. 0,07) fachada lateral (bloque de apoyo académico).

FEBRERO 21 y 22 DEL 2011

Se comienza con la fundida de plantilla en concreto (esp 0,10) patio interno, entre bloque de aulas de clases y bloque de apoyo académico Se continua con la fundida de plantilla. (esp 0,07) rampa de acceso al segundo piso.

FEBRERO 23 y 24 DEL 2011

Se continua con el pañete allanado sobre muro (esp. 0,07) y filete de ventana. fachada lateral, bloque de apoyo académico, Se continua con la construcción de cuneta, recolectora de aguas lluvias, comienza con la fundida de plantilla en concreto (esp 0,10) patio interno, entre bloque de aulas de clases y bloque de apoyo académico, se realiza levante de muros en el bloque de apoyo académico.

Oficina: Calle 106 No 50-102 Oficina 7

Tel:3785058 Fax: 3739606

Barranquilla - Colombia

E-mail: rafaelperez333@hotmail.com


Oficina Chiriguana: Calle 8 No 1-203 Chiriguana- Cesar

Cel: 311 6505205 - 311 4113087

E-mail: arq.miguelvargas@hotmail.com

10 marzo 2020
M^{te} José Vides

**INTERVENTORIA:
CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA**



160
580

FEBRERO 25 y 26 DEL 2011

Se continua con el pañete allanado sobre muro (esp. 0,07) y filete de ventana, fachada lateral, bloque de apoyo académico, Se continua con la construcción de cuneta, recolectora de aguas lluvias, comienza con la fundida de plantilla en concreto (esp 0,10) patio interno, entre bloque de aulas de clases y bloque de apoyo académico, se realiza levante de muros en el bloque de apoyo académico se realizan filetes de columnas y se programa una jornada de limpieza general de la obra, el día 26 se hace un arqueo general del almacén con el objeto de hacer un inventario de materiales, lluvia fuerte en horas de la tarde.

Oficina: Calle 106 No 50-102 Oficina 7
Tel: 3785058 Fax: 3739606
Barranquilla - Colombia

E-mail: rafaelperez333@hotmail.com

Oficina Chiriguana: Calle 8 No 1-203 Chiriguana - Cesar

Cel: 311 6505205 - 311 4113087


E-mail: arq.miguelvargas@hotmail.com

10 marzo 2020
H4 José Vides

16T
321



**RESUMEN FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRAS
DE LA ESCUELA RURAL MIXTA SANTA RITA
- EL CRUCE -**

10-marzo-2020
M^a Jose Vico

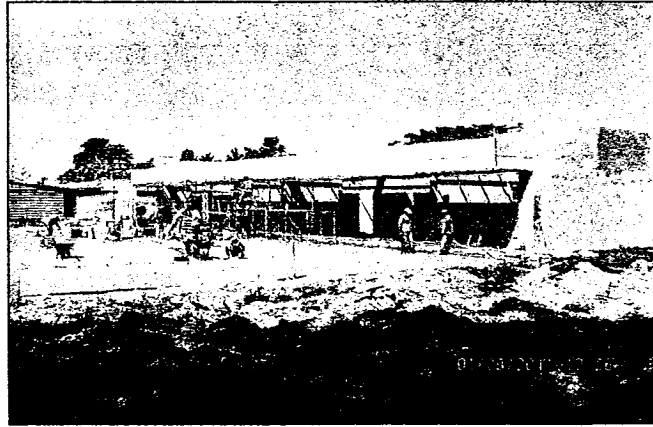	INTERVENTORIA:		INSTITUCIÓN		SANTA RITA EL CRUCE	
	INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		PERIODO		26/01/11-26/02/2011	
			PÁGINA	01	DE	19
			FECHA	26	02	2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.		CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: CRUCE DE LA SIERRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
CONTENIDO: DETALLE, LIMPIEZA, DESCAPOTE Y REPLANTEO ENTRE BLOQUE DE APOYO, ESTUDIANTIL Y BLOQUE DE AULAS DE CLASES						
Firma <u> <i>JLR</i> </u>		Firma <u> <i>MAS</i> </u>				
Nombre: <u> JAIME MERCADO RUIZ </u> COORDINADOR TÉCNICO Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO		Nombre: <u> MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ </u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.				




10-marzo-2010
Ma José Vides

102
102

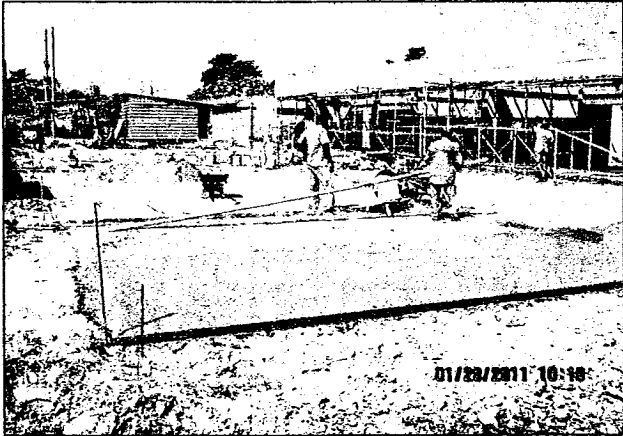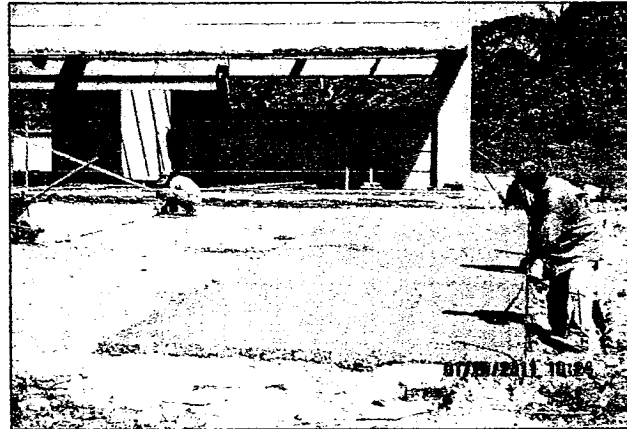	INTERVENTORIA: INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		INSTITUCIÓN		SANTA RITA EL CRUCE	
			PERIODO		26/01/11-26/02/2011	
			PÁGINA	02	DE	19
			FECHA	26	02	2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.			CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	
					SITIO: CRUCE DE LA SIERRA	
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
CONTENIDO: DETALLE, FUNDIDA DE PLANTILLA EN CONCRETO. (ESP. 0,07) ENTRE BLOQUE DE APOYO, ESTUDIANTIL Y BLOQUE DE AULAS DE CLASES						
Firma <u> <i>JLM</i> </u>			Firma <u> <i>MAS</i> </u>			
Nombre: <u> JAIME MERCADO RUIZ </u> COORDINADOR TÉCNICO Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO			Nombre: <u> MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ </u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO Matrícula No. : 08700-69126 Atlántico.			




14-Marzo-2011
 10:58 AM

163
 123

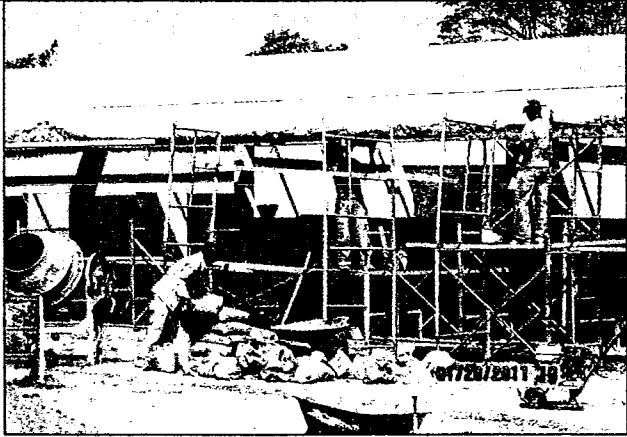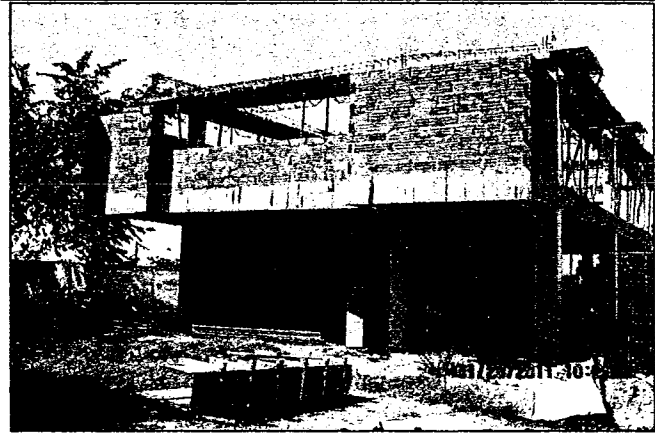	INTERVENTORÍA:		INSTITUCIÓN		SANTA RITA EL CRUCE	
	INTERVENTORIA:CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		PERIODO		26/01/11-26/02/2011	
			PÁGINA	O3	DE	19
			FECHA	26	O2	2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.		CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: CRUCE DE LA SIERRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
CONTENIDO: DETALLE. FILETE SOBRE MURO, (FACHADA PRINCIPAL (BLOQUE DE AULAS DE CLASES.)			CONTENIDO: LEVANTE EN BLOQUE SAMO, (H. 2,80mt.) FACHADA LATERAL BLOQUE DE APOYO ESTUDIANTEL.			
Firma 			Firma 			
Nombre: <u>JAIME MERCADO RUIZ</u> COORDINADOR TECNICO Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO			Nombre: <u>MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ</u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO Matrícula No. : 08700-69126 Atlántico.			

70-MAR-20-2020
 M. José UdeS

584

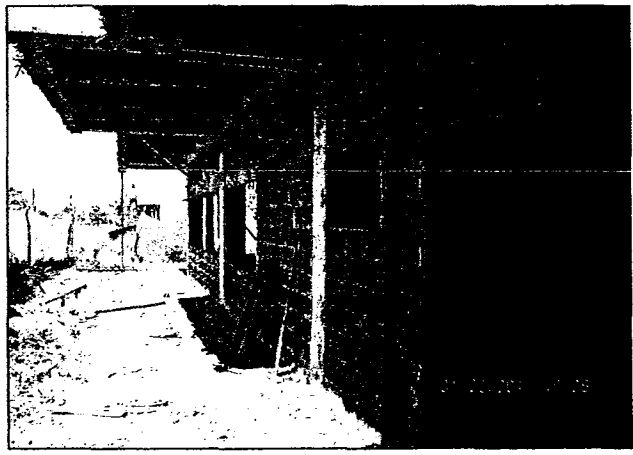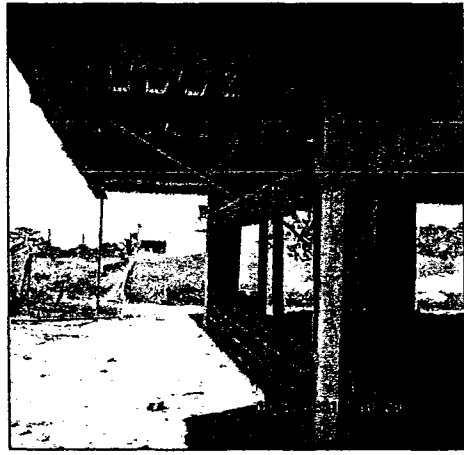
	INTERVENTORÍA:		INSTITUCIÓN		SANTA RITA EL CRUCE	
	INTERVENTORIA:CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		PERÍODO		26/01/11-26/02/2011	
			PÁGINA	O4	DE	19
			FECHA	26	O2	2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.		CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: CRUCE DE LA SIERRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
CONTENIDO: LEVANTE EN BLOQUE SAMO, (H. 2.80mt.) FACHADA POSTERIOR, BLOQUE DE APOYO ESTUDIANTIL.		CONTENIDO: DETALLE. FUNDIDA DE DINTEL EN CONCRETO, FACHADA POSTERIOR, BLOQUE DE APOYO ESTUDIANTIL.				
Firma 		Firma 				
Nombre: <u>JAIME MERCADO RUIZ</u> COORDINADOR TECNICO Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO		Nombre: <u>MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ</u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.				

10 de marzo 2011
H. 15:30
C. 15:30

181
165

~~106~~

586

10. marzo 2020
MA José Uides



INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA:CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	SANTA RITA EL CRUCE		
PERÍODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	05	DE	19
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CRUCE DE LA SIERRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

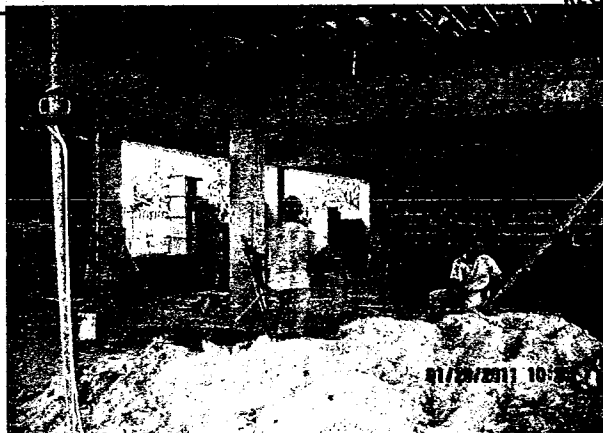

CONTENIDO: LEVANTE EN BLOQUE SAMO, (H. 2,80mt.) FACHADA LATERAL BLOQUE DE APOYO ESTUDIANTEL. AREA INTERNA



CONTENIDO: PANORAMICA, FACHADA PRINCIPAL (BLOQUE DE AULAS DE CLASES.)

Firma

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 Atlántico.

10-NAI-20-2020
Miguel Antonio Vargas Sanchez

587
107

	INTERVENTORÍA:		INSTITUCIÓN		SANTA RITA EL CRUCE	
	INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		PERIODO		26/01/11-26/02/2011	
			PÁGINA	O6	DE	19
			FECHA	26	O2	2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.		CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: CRUCE DE LA SIERRA
REGISTRO FOTOGRAFICO						
						
CONTENIDO: DETALLES. LEVANTE DE MURO, EN BLOQUE SAMO (H. 2,80mt.) AREA INTERNA SEGUNDO PISO (BLOQUE DE APOYO ESTUDIANTIL.)						
Firma <u> </u> Nombre: <u>JAIME MERCADO RUIZ</u> COORDINADOR TECNICO Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO			Firma <u> </u> Nombre: <u>MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ</u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO Matrícula No.: 08700-69126 Atlántico.			

10-Marzo-2012
 H. José

13/03/2012
 H. José



INTERVENTORIA:
INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	SANTA RITA EL CRUCE		
PERIODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	07	DE	19
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR


SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CRUCE DE LA SIERRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

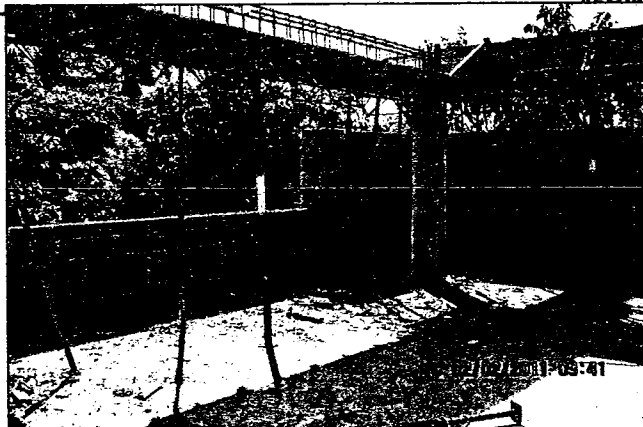

CONTENIDO: DETALLE. GUERDERAS PARA FUNDIDA DE VIGA, AEREA. SEGUNDO PISO (BLOQUE DE APOYO ESTUDIANTEL.)

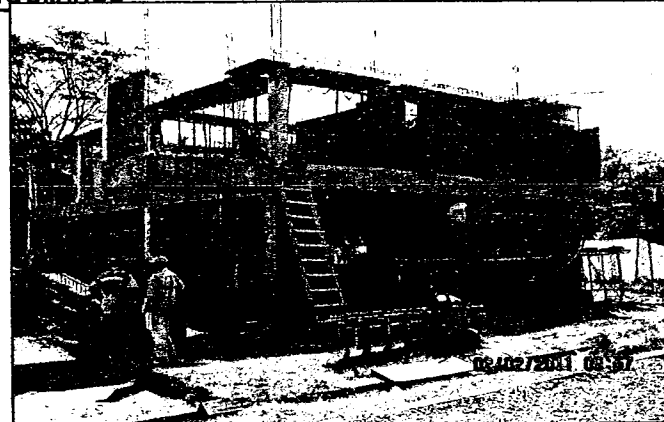

CONTENIDO: LEVANTE EN BLOQUE SAMO, (H. 2.80mt.) FACHADA LATERAL BLOQUE DE APOYO ESTUDIANTEL.

Firma

[Handwritten signature]

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO


Firma

[Handwritten signature]

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.




10-marzo-2010
Jose Ocas

[Handwritten signature]

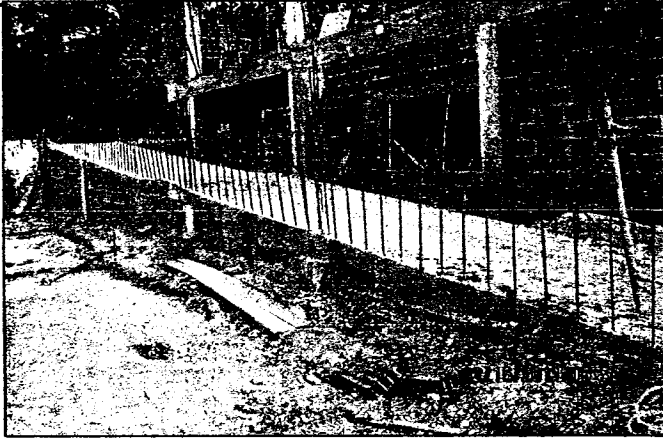	INTERVENTORIA:		INSTITUCIÓN		SANTA RITA EL CRUCE	
	INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		PERIODO		26/01/11-26/02/2011	
			PÁGINA	08	DE	19
			FECHA	26	02	2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.		CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: CRUCE DE LA SIERRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
CONTENIDO: DETALLE, ESTRUCTURA Y FUNDIDA (RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL AL BLOQUE DE APOYO ACADÉMICO.)						
Firma <u> <i>JMR</i> </u>				Firma <u> <i>MAS</i> </u>		
Nombre: <u> JAIME MERCADO RUIZ </u> COORDINADOR TÉCNICO Matricula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO				Nombre: <u> MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ </u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO Matricula No. : 08700-69126 Atlántico.		



10 MAR 20 2011
 H. JOSÉ V.

590
 470

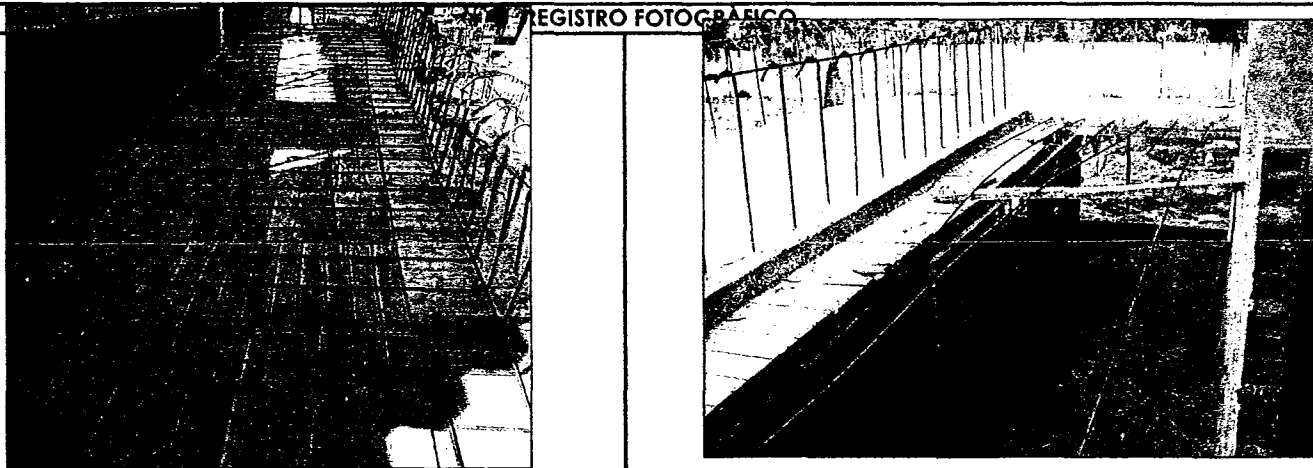	INTERVENTORÍA:		INSTITUCIÓN		SANTA RITA EL CRUCE	
	INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		PERÍODO		26/01/11-26/02/2011	
			PÁGINA	09	DE	19
			FECHA	26	02	2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.		CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: CRUCE DE LA SIERRA
						
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
CONTENIDO: DETALLE, ESTRUCTURA Y FUNDIDA DE RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL AL SEGUNDO NIVEL (BLOQUE DE APOYO ACADÉMICO.)						
Firma 			Firma 			
Nombre: JAIME MERCADO RUIZ COORDINADOR TÉCNICO			Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ COORDINADOR ADMINISTRATIVO			
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO			Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.			

10-MAR-2012
 MA José Vides

17
 197

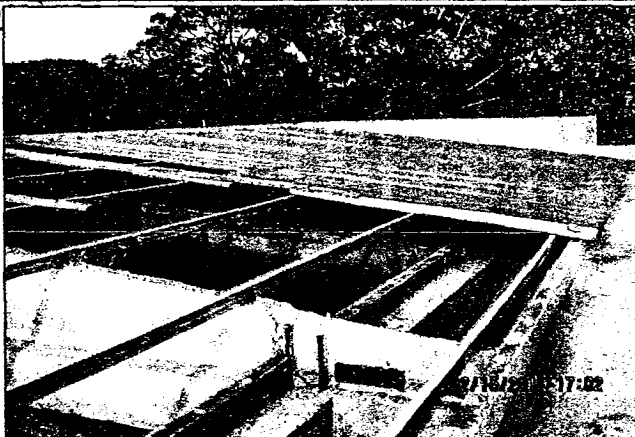	INTERVENTORIA:		INSTITUCIÓN		SANTA RITA EL CRUCE	
	INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		PERIODO		26/01/11-26/02/2011	
			PÁGINA	10	DE	19
			FECHA	26	02	2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.		CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: CRUCE DE LA SIERRA
		OTRO FOTO				
CONTENIDO: PANORAMICA GENERAL, ESTRUCTURA METALICA CON PERFILES EN PAG, PARA CUBIERTA. (BLOQUE DE AULAS DE CLASES)		CONTENIDO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LAMINA, (AJOVER) Y FIJACIÓN DE TORNILLOS (TOROFILL.)				
Firma 		Firma 				
Nombre: <u>JAIME MERCADO RUIZ</u> COORDINADOR TÉCNICO Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO		Nombre: <u>MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ</u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.				

10 MAR 20-2012
Mr José Vides

512
172



INTERVENTORIA:
INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	SANTA RITA EL CRUCE		
PERIODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	11	DE	19
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CRUCE DE LA SIERRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

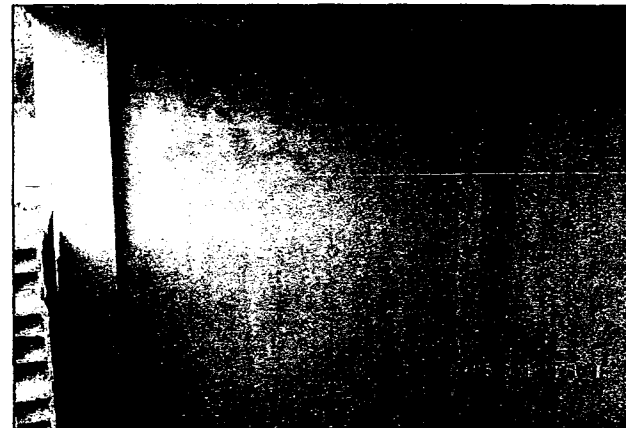

CONTENIDO: DETALLE, FACHADA PRINCIPAL (BLOQUE DE AULAS DE CLASES)

CONTENIDO: PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO (ESP. 0,07) AREA INTERNA BLOQUE DE APOYO ACADEMICO.

Firma

Firma

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO





Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.

10-Marzo-2020
H. José U. J. S.

SP3
SP3

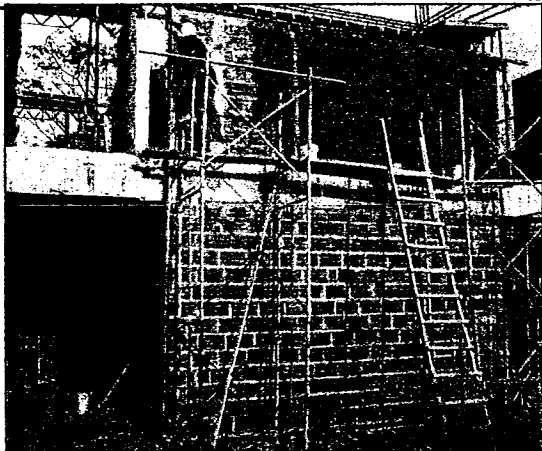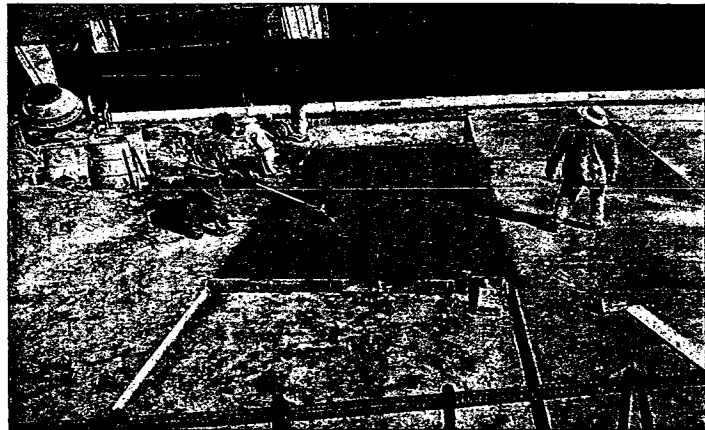	INTERVENTORIA: INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		INSTITUCIÓN SANTA RITA EL CRUCE	
			PERIODO 26/01/11-26/02/2011	
			PÁGINA 13	DE 19
			FECHA 26	02 2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.		CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
				SITIO: CRUCE DE LA SIERRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO				
				
CONTENIDO: PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO (ESP. 0,07) FACHADA LATERAL (BLOQUE DE APOYO ACADEMICO.)		CONTENIDO: FUNDIDA DE PLANTILLA EN CONCRETO (ESP 0,10) PATIO INTERNO, ENTRE BLOQUE DE AULAS DE CLASES Y BLOQUE DE APOYO ACADEMICO.		
Firma 		Firma 		
Nombre: <u>JAIME MERCADO RUIZ</u> COORDINADOR TÉCNICO Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO		Nombre: <u>MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ</u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO Matrícula No.: 08700-69126 Atlántico.		

10-mar-20-2020
 Ha Jose Vides

545
 175



INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	SANTA RITA EL CRUCE		
PERIODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	14	DE	19
FECHA	26	O2	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CRUCE DE LA SIERRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: FUNDIDA DE PLANTILLA. (ESP 0,07) RAMPA DE ACCESO AL SEGUNDO PISO.



CONTENIDO: PANORAMICA GENERAL, FUNDIDA DE PLANTILLA EN CONCRETO (ESP 0,10) PATIO INTERNO, ENTRE BLOQUE DE AULAS DE CLASES Y BLOQUE DE APOYO ACADÉMICO.

Firma



Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.



10-Marzo-2020
Ha Jose Udes.

596
176

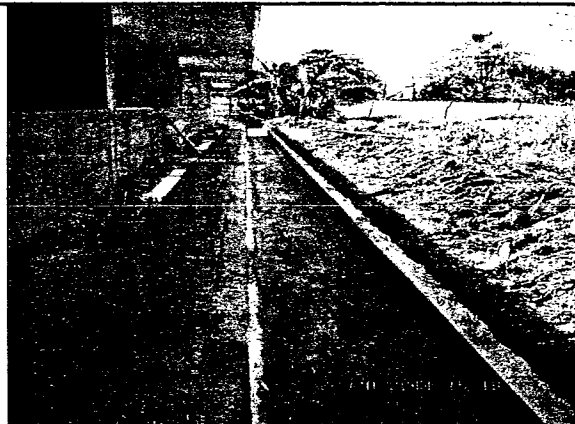	INTERVENTORÍA:		INSTITUCIÓN		SANTA RITA EL CRUCE	
	INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		PERÍODO		26/01/11-26/02/2011	
			PÁGINA	15	DE	19
			FECHA	26	02	2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.		CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: CRUCE DE LA SIERRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
CONTENIDO: PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO (ESP. 0,07) Y FILETE DE VENTANA. FACHADA LATERAL. BLOQUE DE APOYO ACADEMICO.		CONTENIDO: DETALLE. CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, RECOLECTORA DE AGUAS LLUVIAS.				
Firma 		Firma 				
Nombre: <u>JAIME MERCADO RUIZ</u> COORDINADOR TECNICO Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO		Nombre: <u>MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ</u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.				

10 MAR 2011
 RA JOSE VILDES

10 MAR 2011
 RA JOSE VILDES

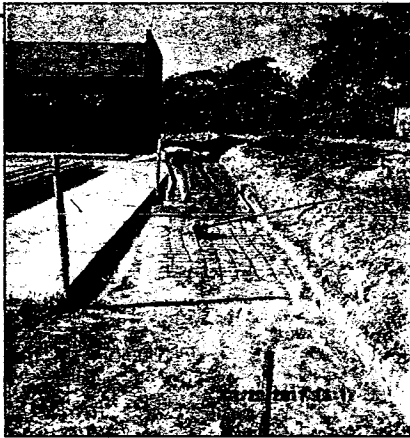	INTERVENTORÍA:		INSTITUCIÓN		SANTA RITA EL CRUCE	
	INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		PERÍODO		26/01/11-26/02/2011	
			PÁGINA	16	DE	19
			FECHA	26	02	2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.		CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: CRUCE DE LA SIERRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
CONTENIDO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA, (AREA DE CUNETA RECOLECTORA DE AGUAS LLUVIAS.		CONTENIDO: DETALLE, FUNDIDA DE CUNETA, RECOLECTORA DE AGUAS LLUVIAS.				
Firma 		Firma 				
Nombre: <u>JAIME MERCADO RUIZ</u> COORDINADOR TÉCNICO Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO		Nombre: <u>MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ</u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO Matrícula No.: 08700-69126 Atlántico.				

10 marzo 2010
 Ha Jose Udes

598
 178



INTERVENTORIA:

INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	SANTA RITA EL CRUCE		
PERÍODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	17	DE	19
FECHA	26	02	2011



OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE
AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS
EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CRUCE DE LA
SIERRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

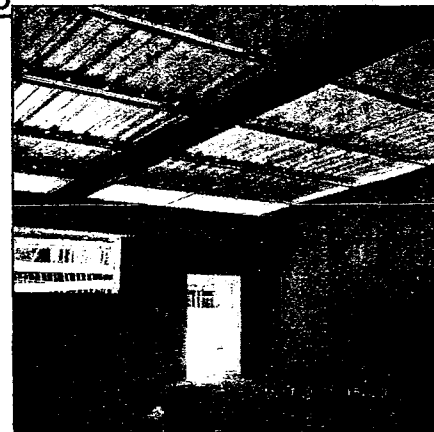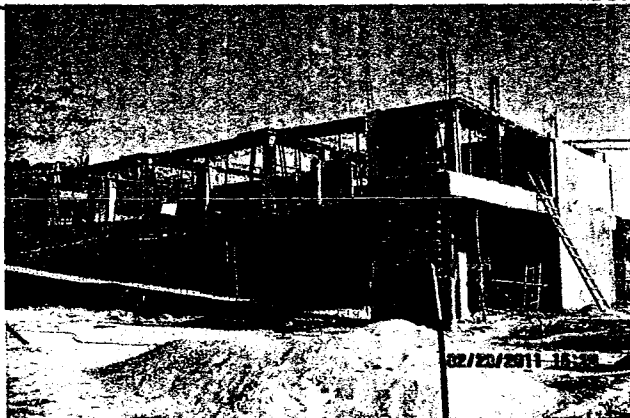

CONTENIDO: PANORAMICA GENERAL. FACHADA PRINCIPAL BLOQUE DE
APOYO ACADEMICO.

CONTENIDO: DETALLE. PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO (ESP. 0,07) Y DETALLE DE
ESTRUCTURA DE CUBIERTA, AREA DE BLOQUE DE AULAS DE CLASES.

Firma

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.

10-marzo-2020
H. José U. J. S.

599
799



INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	SANTA RITA EL CRUCE		
PERIODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	18	DE	19
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE
AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS
EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CRUCE DE LA
SIERRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: DETALLE, FILETE DE COLUMNA (BLOQUE DE APOYO
ACADEMICO.)



CONTENIDO: DETALLE. PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO (ESP. 0.07) BLOQUE DE
APOYO ACADEMICO.

Firma

[Handwritten signature]

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

Firma

[Handwritten signature]

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 Atlántico.

10 marzo-2020
H4 Jose Vides

600
18



INTERVENTORIA:
INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA II ETAPA


INSTITUCIÓN	SANTA RITA EL CRUCE		
PERIODO	26/01/11-26/02/2011		
PÁGINA	19	DE	19
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CRUCE DE LA SIERRA

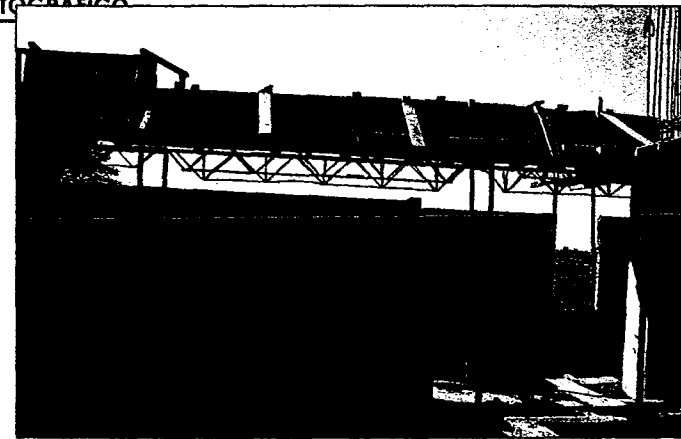

CONTENIDO: LEVANTE DE MURO EN BLOQUE SAMO, FACHADA PRINCIPAL SEGUNDO PISO (BLOQUE DE APOYO ACADEMICO)

CONTENIDO: LEVANTE DE MURO EN BLOQUE SAMO, FACHADA POSTERIOR, SEGUNDO PISO (BLOQUE DE APOYO ACADEMICO)

Firma

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TECNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLANTICO

Firma

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLANTICO.

10-marzo-2020
JHOSÉ VIDES

601
187

182
602

**PROGRAMACIÓN DE OBRAS.
ESCUELA RURAL MIXTA SANTA RITA.
EL CRUCE**

10-marzo-2020
Ma José Vides

**PROGRAMACION DE OBRAS
STA RITA**

	DICIEMBRE		ENERO					FEBRERO			MARZO	
	semana 7	semana 8	semana 9	semana 10	semana 11	semana 12	semana 13	semana 14	semana 15	semana 16	semana 17	semana 18
PRELIMINARES												
EXCAVACIONES Y RELLENOS ESTRUCTURALES												
OBRAS VARIAS												
ESTRUCTURAS												
MAMPOSTERÍA Y PREFABRICADOS												
PAÑETES												
CUBIERTAS												
PISOS												
ACABADOS												
CARPINTERIA METALICA												
INSTALACIONES HIDRAULICAS												
INSTALACIONES SANITARIAS												
INSTALACIONES ELECTRICAS												
OBRAS COMPLEMENTARIAS												

10-Marzo-2020
MA-JOS-udes

603

ES

184
604

**FOTOCOPIA DE LA BITÁCORA QUE MUESTRA EL
AVANCE DE OBRAS DE LA ESCUELA RURAL MIXTA
SANTA RITA - EL CRUCE -**

10-marzo-2020
Ma José Uides

5 Se formalizó e instaló nuevo Kampo, correspondiente a primera mano.

185

605

6 Se Continúa con corte de terreno para plaza.

28/ENERO/2011/(VIERNES).

1 Se Continúa realizando gotero de alero epa (B) Aulas y detalles de filos interiores.

2 Se realizaron perforaciones en cerrillos epa (B) bloques para anclaje de vigas ejen.

3 Se continúa lavante en bloque #4 en bloque apoyo.

4 Se fonde viga dintel sobre epa I en salón profesores.

5 Se continúa con corte y nivelación de terreno para plaza.

29/ENERO/2011/(SABADO).

1 Se Continúa con lavante en bloque #4 en bloque apoyo.

2 Se comenzó a fundir plantilla en concreto para plaza y bloques.

10 marzo 2020
Ma José Vides

3. Pñeta Columns solas eje (6).

186

4. Se formateo y fundieron alapas en solas (1) y (2). 6ct

26/ENERO/2011 / (MIÉRCOLES).

1. Pñeta exterior fachada interna Aulas

2. filas para Ventanas solas (1), (2) y (3) y Vano para puerta acceso Aula (4).

3. Pñeta vigas cubierta a interior de sola 3 y 4.

4. Se Continúa levantando 1º piso bloque apoyo.

5. Se Comenzó instalación de bajantes para aguas lluvias Aulas.

6. Se Continúa con corte y nivelación de terreno para plaza de estacionamiento.

27/ENERO/2011 / (JUEVES).

1. Se continúa con pñeta exterior fachadas Aulas, además de filas de puertas y ventanas en solas.

2. Se Comenzó gotero de acero eje (6) Aulas.

10 marzo 2011
MR. JOSE VILLAS

31/ENERO/2011 / (LUNES).

187

1. Se inicio a pintar el salon bodega 1er piso bloque Apoyabot
2. Se comienza levantar 2do piso bloque apoyo.
3. Se fundida e instalacion de las 1er piso bloque apoyo.
4. Se termino de armar hierro para 1er tramo de rampa
5. Se fundo columna de descenso # 2 de Rampa.
6. Se inicia pintura exterior fachada eje (1) de bloque de apoyo.
7. Se continuo con corte de terreno para plazaletas

01/FEBRERO/2011 / (MARTES).

1. Pintura interior bloque apoyo en bodega y Sala profesores.
2. Pintura exterior, fachada eje (1) (Se continuo) y fachada eje 0.
3. Se continuo armando hierro de losa (vigas) bloque apoyo.
4. Levanta primer piso bloque de apoyo eje (0) (acceso).

10 marzo 2020
H. José Uribe

02 / FEBRERO / 2011 / (MIÉRCOLES).

188

1. Se continuó gotero alero eje (A) azules.

608

2. Se continuó levanta en bloques #4 en fachada paralela a eje (A) 4º piso bloque apoyo.

3. Se realizó corte en Plataba para cimiento de baño bloque de apoyo.

4. Se pinge caras de columnas primer piso bloque apoyo para posterior pintura.

5. Se comenzó levanta eje (2) 2º piso bloque apoyo, acceso a biblioteca de columnas A2 y B2.

6. Se culmina el corte y nivelación de terrazo para plataba.

03 / FEBRERO / 2011 / (JUEVES).

1. Se comenzó a tomar detalles de pintura azules y limpieza de Azules.

2. Llegan a la obra 50 unidades de bloques.

3. Se fundieron vigas cimiento para levantar de baño bloque de apoyo 1º piso.

10 MARZO 2011
MA JORGE VIDES

4. Se decimaron montes de tomar a almacenado

5. Se realizó la junta en bloque #4, división entre 189
columnas B3 y B2 de 1º piso bloque apoyo.

609

6. Se continuó levantando el 2º piso bloque apoyo
acceso a biblioteca y al interior de la misma,
además se continuó levantando el divide bloque
de apoyo biblioteca con sala informática 2º
piso.

7. Se definió con interventoría, lugar de visita del
alcalde, Oficina juegos de niños (trastero) a lado
de comedor existente y cerramiento acceso,
razón por la cual es necesario rellenar dicha zona
a asf..

8. Se continuaron poniendo maderas de refuerzo
a las juntas de 2º piso bloque apoyo.

9. Se desamocro primer tramo de rampa y se empezó
a formatear 2º tramo y a instalar hierro.

10. Se realizó junta de levante entre columnas D2 y
C2, del lado de oficina contador.

04 / FEBRERO / 2011 / (VIERNES).

1. Se inicia levante bloque #4 para
profesores.

10 marzo 2020
Héctor José Uides
S. L.

4. Se continuo fundiendo machones para lausntes de rampa.

~~70~~

610

05 / FEBRERO 2011 / (SABADO).

1. Se continuo instalando y aligando hierro para 2^{da} tramo de rampa y 2^{do} descenso
2. Se inicio regatas en muros 1^{er} piso bloques apoyo para puntos electricos.

07 / FEBRERO / 2011 / (DOMINGOS).

1. Se termina de aligar hierro 2^{do} tramo rampa.
2. Se inician regatas para Puntos electricos en 2^{do} piso bloques apoyo.

08 / FEBRERO / 2011 / (LUNES).

1. Se inicio excavacion para Concreto Eje (B) Aulas (paralela).

10- marzo-2020
M^{ra} Jose Uides

09 / FEBRERO / 2011 / (MIÉRCOLES).

HT
611

1. Se fundió 2^{do} piso, y descanso 1 y 2 de Rampas.

2. Se comenzó a poner plantilla en concreto para fondo de cunetas paralelas a eje B Aulas.

10 / FEBRERO / 2011 / (JUEVES).

1. Se continuó excavación para cunetas paralelas a eje B Aulas.
✓

2. Se inició laugata lateral para dicha cunetas mencionada anteriormente.

3. Se instalaron puentes tomars e interruptores en muros 1^{er} piso bloque apoyo.

4. Se continuó con pñieta exterior primer piso bloque de apoyo.

10 marzo 2020
Héctor Udes

192
612

**CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA
ESCUELA RURAL MIXTA SANTA RITA – EL CRUCE**

10 marzo 2020
H4 Jose Vides


193
613


	INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	CONTRATISTA: CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA.
INSTITUCIÓN	SANTA RITA DEL CRUCE		
PERIODO	26/01/20110 AL 26/02/2011		
FECHA	FEBRERO 26 DEL 2011		
SITIO	CORREGIMIENTO DE LA SIERRA.		

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Si/Bueno	No/Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	x		EN GENERAL EL ESTADO DE LA MAQUINARIA ES BUENO.
- Regularidad del mantenimiento		X	EL MANTENIMIENTO ES CONSTANTE.
- Vibraciones /Ruidos	x		
- Protecciones / Guardas / Frenos	x		
- Idoneidad operarios		X	UN OBRERO ES EL ENCARGADO DE MANEJAR Y HACERLE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	x		
- Buen estado	x		
- Fácil acceso y operación	x		
- Uso según zona de trabajo		x	NO APLICA POR QUE EL CAMPAMENTO ES GENERAL PARA CADA OBRA.
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	x		LA DOTACION BASICA ES COMPLETA (CASCO, GUANTES, BOTAS, GAFAS.)
- Buen estado	x		
- Uso según zona de trabajo	x		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		NO EXISTEN RUTAS DE EVACUACION Y LA OBRA NO ESTA SEÑALIZADA.
- Uso según zona de trabajo	X		NO SE UTILIZA POR QUE NO HAY JORNADA NOCTURNA .
VIGILANCIA			
- Personal suficiente	x		PESONAL DEFICIENTE PARA ESTA ACTIVIDAD
- Diurna	x		EL ALMACENISTA HACE LABORES DE VIGILANCIA
- Nocturna	x		CELADURIA NOCTURNA A CARGO DE PERSONAL CONTRATADO POR EL CONTRATISTA.
EMERGENCIAS			
- Afiliación del Personal al Sistema de Seguridad Social y ARP	x		

Firma: 
 MIGUEL VARGAS SÁNCHEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA

Firma: 
 JAIME MERCADO RUIZ
 COORDINADOR TECNICO DE INTERVENTORIA

10-marzo-2020
Md Jose Vides.


194
614

INTERVENTORIA: <u> </u>						
CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA						
CONTRATO: CONSTRUCCION Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA						
CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR			SUPERVISION DEL CONTRATO: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS			
INSTITUCION		SANTA RITA DEL CRUCE				
PERIODO		ENE-26-11 A FEB 26-11				
SITIO		CORREGIMIENTO DE LA SIERRA				
FECHA		FEBRERO 26 DEL 2011				
No.	FECHA	HORAS SOL	HORAS LLUVIA	LLUVIA EN LA NOCHE		OBSERVACIONES
1	26/12/2010	8	0	SI	NO	
2	27/12/2010	6	2		X	
3	28/12/2010	8	0		X	
4	29/12/2010	8	0		X	
5	30/12/2010	8	0		X	
6	01/01/2011	8	0		X	
7	02/01/2011	8	0		X	
8	03/01/2011	8	0		X	
9	04/01/2011	8	0		X	
10	05/01/2011	8	0		X	
11	06/01/2011	8	0		X	
12	07/01/2011	8	0		X	
13	08/01/2011	8	0		X	
14	09/01/2011	8	0		X	
15	10/01/2011	8	0		X	
16	11/01/2011	8	0		X	
17	12/01/2011	8	0		X	
18	13/01/2011	8	0		X	
19	14/01/2011	8	0		X	
20	15/01/2011	8	0		X	
21	16/01/2011	8	0		X	
22	17/01/2011	8	0		X	
23	18/01/2011	8	0		X	
24	19/01/2011	8	0		X	
25	20/01/2011	8	0		X	
26	21/01/2011	8	0		X	
27	22/01/2011	8	0		X	
28	23/01/2011	8	0		X	
29	24/01/2011	8	0		X	
30	25/01/2011	8	0		X	
31	26/01/2011	8	0		X	

SOL 246

LLUVIA 2

LLUVIA
1%



SOL
99%

Firma:

ARQ. JAIME MERCADO RUIZ

COORDINADOR TECNICO DE INTERVENTORIA

Firma:

ARQ. MIGUEL ANTONIO VARGAS

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA

10 marzo 2020
Ma Jose Udes

195
615

**CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL
CONTRATISTA DE OBRA**


10 marzo 2020
M^a José Uides

	CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		INSTITUCION		SANTA RITA DEL CRUCE	
			PERIODO		26/01/1 a 26/02/1	
			PAGINA	1	DE	1
			FECHA	26	2	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.	CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA																																
PERSONAL	DIA	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
EVARISTO PEREZ																																
ARNOLD PERZ																																
LUIS DIAZ																																
JONY CAAMAÑO																																
LUIS PALLARES																																
JOSE PINEDA																																
JAIDER PALLARES																																
MISAEI SANCHEZ																																
JOSE GOMEZ																																
SERGIO SANTOS																																
LUIS VALENCIA																																
CARLOS SALINAS																																
ROBERTOO SUAREZ																																
JOSE GOMEZ																																
ELKIN ZUÑIGA																																

* estas cuadrillas actuan simultaneamente en las dos obras, Carpinteros, Herreros, Operadores etc.

Firma: 
 Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 Matrícula No. : 08700-69126 ATLÁNTICO

10 MARZO 2020
 RAJOSE URS

196
 616

197
617

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

10-Marzo-2020
Ma José Vides



CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCION	SANTA RITA DEL CRUCE		
PERIODO			
PAGINA	1	OE	1


FECHA 26 02 11

CONTRATISTA	CONSTRUCCION Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	SUPERVISION DEL CONTRATO	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	SITIO: CRUCE DE LA SIERRA


CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA MAQ/EQUI.	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
MEZCLAORA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBRADOR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SIERRA ELECTRICA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
VIBROCOMPACTAO R TIPO RANA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MOTOBOMBA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
GATOS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CERCHAS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CHAZAS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ANDAMIOS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES
ACTIVO = A
REPARACION = R
INACTIVO = I
NO APLICA = N

Firma 

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TECNICO DE INTERVENTORIA

Firma 

Nombre: MIGUEL VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA

10 MARZO 2020
19 Jose Luis

618

198

199
619

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MANUEL GERMÁN CUELLO.
SEDE No. 1 – RINCÓN HONDO.**

10 marzo 2020
M^a Jose Vides

200
610

**INFORME DE AVANCE DE OBRAS DE LA
ESCUELA MANUEL GERMAN CUELLO
SEDE NO. 1 – RINCÓN HONDO.**

10-marzo-2020
Mr. José Udes.

**INTERVENTORIA:
CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA**



**INFORME DE INTERVENTORIA OBRAS ESCUELA MANUEL GERMAN
CUELLO SEDE 1 CORREGIMIENTO DE RINCON HONDO
PERIODO ENERO 26 DEL 2011 A FEBRERO 26 DEL 2011**

ENERO 27 AL 02 DE FEBRERO DEL 2011

La obra se encuentra suspendida desde el día 18 de enero debido a problemas administrativos ajenos al desarrollo de las obras.

FEBRERO 03 DEL 2011.

Se reinician las actividades con la rectificación de niveles y se continúa con el desencofrado de la losa de entre piso, el residente solicita permiso por dos días debido a calamidad familiar.

FEBRERO 04 DEL 2011.

Se programa una limpieza general de la obra, se continua con el retiro de los casetones aligerantes de la losa de entrepiso replanteo y fundida de plantilla de los ejes M3-M2-O2-O3., fundida de plantilla en el área de preescolar de los ejes C7-C10, y relleno de la misma área.

FEBRERO 05 DEL 2011.

Fundida de columnas de los ejes M1-H1, fundida de la plantilla de plantilla del bloque de preescolar, fundida de pedestal del eje G4, relleno y compactación para piso de los ejes M6-M5-P-5 y P6.

FEBRERO 06 DEL 2011.

Se continúa con el retiro de los casetones aligerantes de la losa de entrepiso, se funde la plantilla de los ejes P6-M6, M5-P5, P5-P6.

FEBRERO 07 DEL 2011.

Fundida de plantilla de los ejes P-6 M-6, M-6M-5, M-5P-5, P-5-P6, se hace un arqueo en el almacén para verificar que materiales se necesitan de los que se han requerido en la oficina principal.

FEBRERO 08 DEL 2011.


Se inicia el armado de la obra falsa para la segunda parte de la losa de entre piso, se continúa con el retiro de los casetones aligerantes de la losa de entrepiso, relleno y compactación de la zona de preescolar.

Oficina: Calle 106 No 50-102 Oficina 7
Tel: 3785058 Fax: 3739606
Barranquilla - Colombia
E-mail: rafaelperez333@hotmail.com
Oficina Chiriguana: Calle 8 No 1-203 Chiriguana - Cesar
Cel: 311 6505205 - 311 4113087
E-mail: arq.miguelvargas@hotmail.com

10 marzo 2020
H. José Vides

INTERVENTORIA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA



FEBRERO 09 DEL 2011.

Relleno y compactación de material seleccionado de los ejes E5- E6-G5-G6, se continua con el armado de la obra falsa para la segunda parte de la losa de entre piso, se inicia la excavación de la viga P6-M6, descapote, demolición, trazado y replanteo de de los pisos del área de preescolar y área de sistemas, andenes y jardineras.

FEBRERO 10 DEL 2011.

Fundida de plantilla de los ejes E6-E5-G5-G6, fundida de la viga de cimiento de del eje M6-P6, se continua con el armado de la obra falsa para la segunda parte de la losa de entre piso y se continua con el retiro de los casetones aligerantes de la losa de entrepiso, relleno y compactación de la zona de preescolar.

FEBRERO 11 Y 12 DEL 2011.

se continua con el armado de la obra falsa para la segunda parte de la losa de entre piso y se continua con el retiro de los casetones aligerantes de la losa de entrepiso, fundida de cimientos de jardineras y rampas, armado de hierro y formaleta para viga de cimiento de los ejes G5-G4-E4-E5-J4.

FEBRERO 13 DEL 2011.

Se continúa con el armado de la obra falsa para la segunda parte de la losa de entre piso y se continúa con el retiro de los casetones aligerantes de la losa de entrepiso relleno y compactación de la zona de preescolar,

FEBRERO 14 DEL 2011.

No se realiza ninguna actividad pues los trabajadores no laboran debido a atrasos en el pago de la nomina.

FEBRERO 15 DEL 2011

Se comienza con la armada del hierro de la placa de entre piso, se continúa con el retiro de los casetones aligerantes de la losa de entrepiso, excavación para cimiento de la rampa de acceso.

FEBRERO 16 DEL 2011.

Se comienza con el rearmado de los casetones, se continua con el desencofre de la palca de entre piso, y se excava la viga de los ejes O1-M1-M1-J1-O2-O1.

FEBRERO 17 DEL 2011.

La obra se suspende por parte del contratista por un faltante de material a lo cual esta Interventoria le solicita que los asuntos administrativos de carácter interno, no pueden afectar el desarrollo de la obra sobre todo cuando esta está atrasada en la programación.

Oficina: Calle 106 No 50-102 Oficina 7

Tel: 3785058 Fax: 3739606

Barranquilla - Colombia

E-mail: rafaelperez333@hotmail.com

Oficina Chiriguana: Calle 8 No 1-203 Chiriguana- Cesar


Cel: 311 6505205 - 311 4113087

E-mail: ara.miauelvaraas@hotmail.com

10 marzo 2010
Ma José Uides

208
623

**INTERVENTORIA:
CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA**



FEBRERO 18 DEL 2011.

Se continua con el retiro de los casetones aligerantes de la losa de entrepiso, teniendo en cuenta que se le dejaron gatos puestos al tercio de las luces, se realizo limpieza general de la obra, y se fundió plantilla en el área de preescolar, se fundieron vigas a nivel de sobre nivel, se realizo trazado y replanteo, y sobre nivel en el área de la rampa.

FEBRERO 18, 19, 21 DEL 2011.

Sobre nivel en el área de la rampa, rearmado de los casetones armada del hierro de la placa de entre piso, se hace relleno en el área de la rampa, y se inicia levante de muros de preescolar.

FEBRERO 22 DEL 2011.

Armado y para da de cajas de columnas, fundida de cimiento de las vigas de los ejes F2-F1, F1-H1, H1-J1, armada de hierro, fundición de cimiento ciclópeo en el área de la rampa, y se continua levante de muros de preescolar.

FEBRERO 23 DEL 2011.

Armado y para da de cajas de columnas F1,G4, se continua con el armado de la losa en la segunda parte, fundida de plantilla área de sistemas.

FEBRERO 24 Y 25 DEL 2011.

Llegada del Arquitecto Ernesto Artuz, Fundida de plantilla en el área de depósito de deporte, levante de muros ejes E5-E6,G5-G6, D-7 D 10, C7-C10, B7-B10, fundida de plantilla de piso en el área de preescolar, formaleta de columnas en el segundo piso, y se suspende las actividades a las 3:0 pm por un fuerte aguacero

FEBRERO y 26 DEL 2011.

Se hace una jornada de limpieza y se hace el ingreso de material a la obra, no se laboro de forma continua debido a la falta de agua en al sistema de acueducto del Corregimiento desde hace tres días.

Oficina: Calle 106 No 50-102 Oficina 7

Tel:3785058 Fax: 3739606

Barranquilla - Colombia

E-mail: rafaelperez333@hotmail.com

Oficina Chiriguana: Calle 8 No 1-203 Chiriguana- Cesar

Cel: 311 6505205 - 311 4113087

E-mail: arq.miguelvargas@hotmail.com

70-Marzo-2020
Ma Jose Uides

~~204~~

674

**RESUMEN FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRAS
DE LA ESCUELA MANUEL GERMAN CUELLO
SEDE NO. 1 – RINCÓN HONDO.**

10 marzo 2020
Hugo Vides



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERIODO	26/01/2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	01	DE	45
FECHA	26		2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONTENIDO: RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO Y REPLANTEO. (AREA DE AULAS DE CLASES PARA PREESCOLAR.)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ

COORDINADOR TECNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10 marzo 2020
Ha José U. Pérez

621
205



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO		
PERIODO	SEDE 2 26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	02	DE	45
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRAFICO

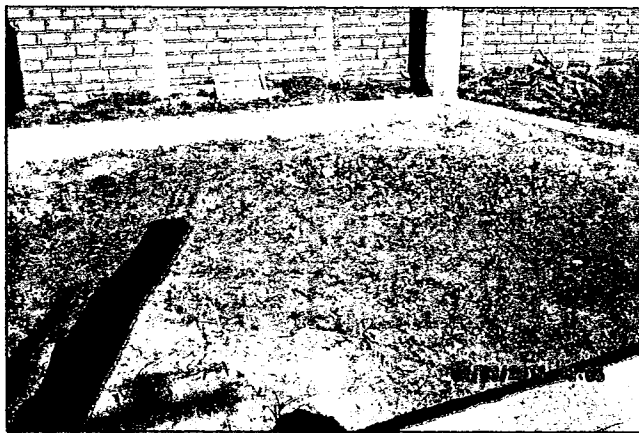

CONTENIDO: DETALLE, LIMPIEZA Y DESCAPOTE. (AREA DE AULAS DE CLASES PARA PREESCOLAR.)



CONTENIDO: RELLENO Y COMPACTACIÓN, PARA FUNDIDA DE PLANTILLA EN CONCRETO. (AREA DE AULAS DE CLASES PARA PREESCOLAR.)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10 marzo 2011
Hoy se revisó

626
205



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERIODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	03	DE	45
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: DETALLE, FUNDIDA DE PLANTILLA EN CONCRETO, (ESP. 0.07) AREA DE (AULAS DE CLASES PARA PREESCOLAR.)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10 MAR 20 2012
por José Vides.

625
2012



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERIODO	26/01/2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	04	DE	45
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR


SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: DETALLE DE ARMADO DEL HIERRO, PARA COLUMNAS DEL SEGUNDO PISO. (ÁREA DE AUDIOVISUALES.)

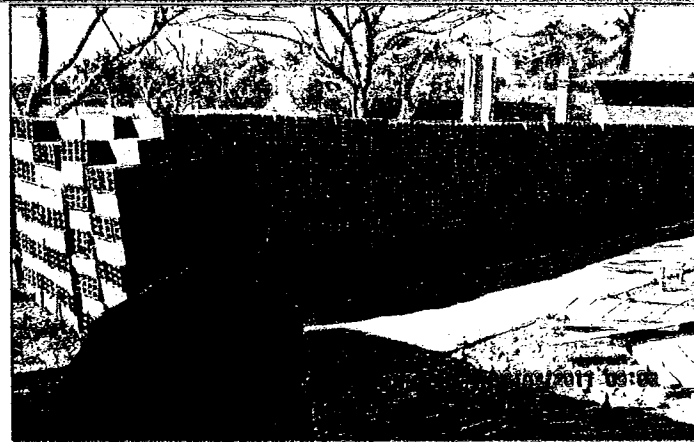

CONTENIDO: DETALLE, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES, EN LA OBRA (BLOQUE SAMO)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ

COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

170-1000-2020
170-1000-2020
170-1000-2020

628
208



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERIODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	05	DE	45
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: RELLENO Y COMPACTACIÓN, PARA FUNDIDA DE PLANTILLA EN CONCRETO. (AREA DE SISTEMAS.)

CONTENIDO: DETALLE, FUNDIDA DE PLANTILLA EN CONCRETO. (ESP. 0.07) (AREA DE SISTEMAS.)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10-0505-20020
14-0505-20020
14-0505-20020

624
200



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERIODO	26/01/2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	06	DE	45
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: DETALLE, TRAZADO Y REPLANTEO. PARA FUNDICIÓN DE PLANTILLA. (AREA DE COMEDOR ESTUDIANTIL)

Firma

[Handwritten signature]

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

[Handwritten signature]

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10 de marzo 2020
17 de junio 2020

[Handwritten signature]
630



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERIODO	26/01/2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	07	DE	45
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

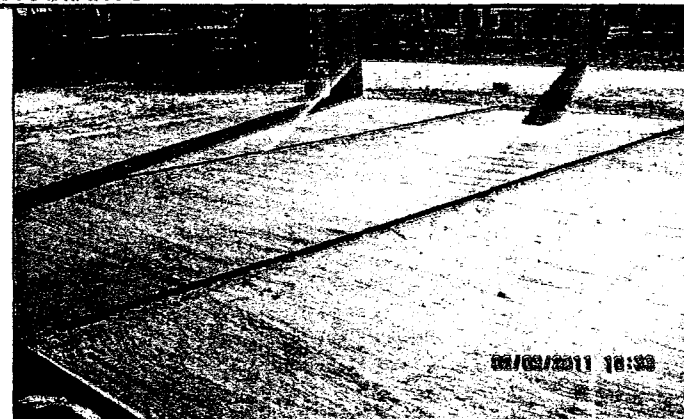

CONTENIDO: DETALLE, FUNDIDA DE PLANTILLA EN CONCRETO, (ESP. 0,07) (AREA DE COMEDOR ESTUDIANT.)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

631
24



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERIODO	26/01/2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	08	DE	45
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: DETALLE, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES, EN LA OBRA (GATOS Y CERCHAS METÁLICAS)

CONTENIDO: DETALLE, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES, EN LA OBRA (CHASAS)

Firma

[Handwritten signature]

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

[Handwritten signature]

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10-Marzo-2011
Mr. José

632
242



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN

MANUEL GERMAN CUELLO
SEDE 2

PERÍODO

26/01-2011 AL 26/02/2011

PÁGINA

09

DE

45

FECHA

26

02


2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

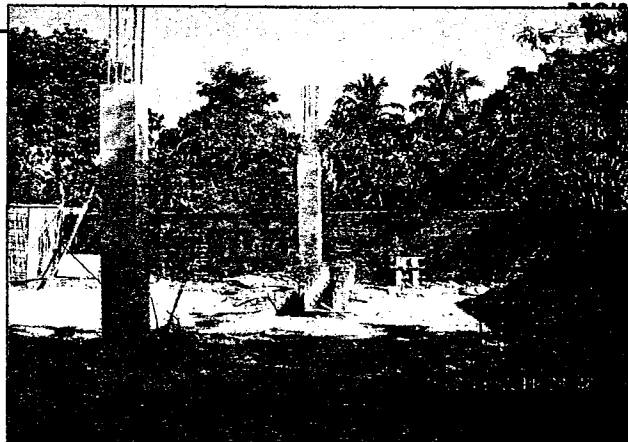

CONTENIDO: DETALLE, FUNDIDA DE COLUMNA. EJE M1 (DIM 0,40X0,30)

CONTENIDO: DETALLE, RELLENO Y COMPACTACIÓN, PARA FUNDIDA DE PLANTILLA EN CONCRETO. (AREA SALA DE PROFESORES.)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ

COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10 de mayo de 2010
M. José Nieves

633
213



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERÍODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	10	DE	45
FECHA	26	O2	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO



CONTENIDO: DESENCOFRE DE PEDESTAL. EJE G5

CONTENIDO: DETALLE, FUNDIDA DE PLANTILLA EN CONCRETO, (ESP. 0,07) AREA DE (AULAS DE CLASES PARA PREESCOLAR.)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.



Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10-Marzo-2020
Ha José Uides

624
24

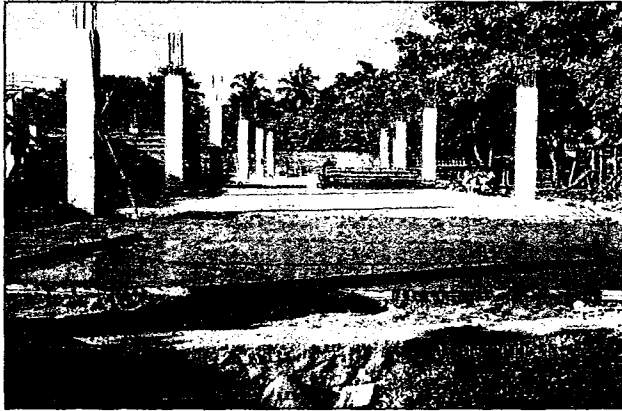	INTERVENTORÍA:		INSTITUCIÓN		MANUEL GERMAN CUELLO	
	CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		PERIODO		26/01-2011 AL 26/02/2011	
			PÁGINA	11	DE	45
			FECHA	26	02	2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.		CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
CONTENIDO: DETALLE, FUNDIDA DE PLANTILLA EN CONCRETO (ESP. 0.07) AREA (SALA DE PROFESORES)		CONTENIDO: DETALLE, REPLATEO DEL HIERRO A UTILIZAR EN LA VIGA DE CIMENTACION, EJES G5-J5 (ESTRIBOS)				
Firma: 		Firma: 				
Nombre: <u>JAIME MERCADO RUIZ</u> COORDINADOR TÉCNICO Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.		Nombre: <u>MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ</u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO				

10-Marzo-2012
H. José Urdaz

695
275



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PÉRIODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	12	DE	45
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONTENIDO: DETALLE, FUNDIDA DE VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO Y ALINEAMIENTO DE GUARDERAS DEL EJE. J2-H2

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TECNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10 marzo 2020
Miguel José

636
216



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERÍODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	13	DE	45
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRAFICO

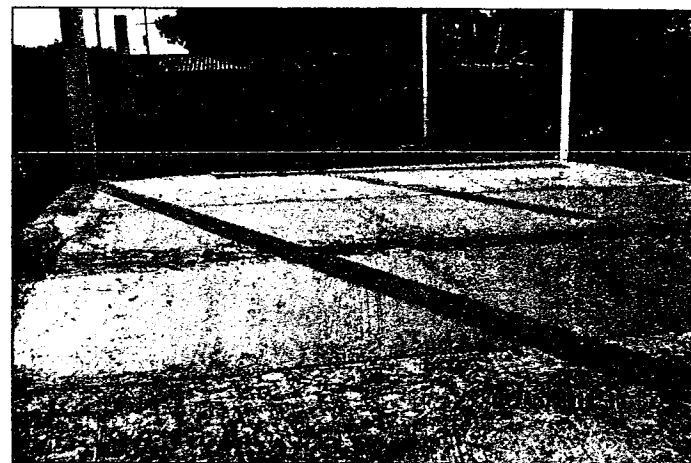

CONTENIDO: FUNDICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO (ESP. 0.07) AREA (AULAS DE CLASES PARA PREESCOLAR)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ

COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10-mar-20-2020
Hr José Uldes

687
217



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERÍODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	14	DE	45
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: DETALLE, RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO, AREA (AULAS DE CLASES PARA PREESCOLAR)



CONTENIDO: DETALLE, RELLENO Y COMPACTACIÓN, CON MATERIAL SELECCIONADO, AREA (DE BAÑO PARA PREESCOLAR)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ

COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:


MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10-marzo-2020
Ms-Joe
Vides

638
218

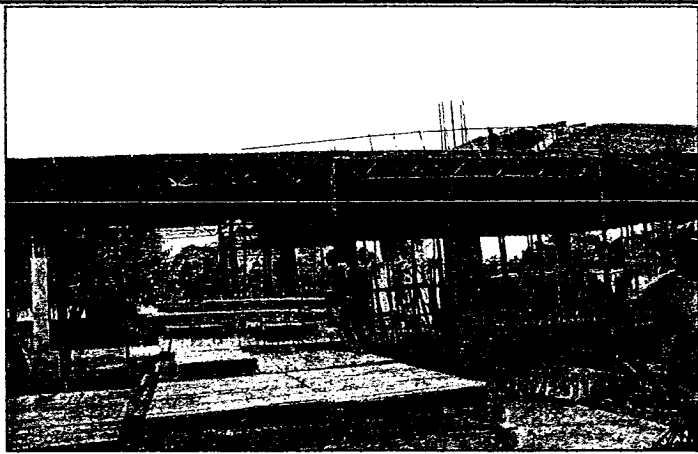	INTERVENTORÍA:		INSTITUCIÓN		MANUEL GERMAN CUELLO		
			PERIODO		SEDE 2		
	CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		PÁGINA		15	DE	45
			FECHA		26	02	2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE		CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO	
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
CONTENIDO: DETALLE, RELLENO Y COMPACTACIÓN, CON MATERIAL SELECCIONADO, AREA (DE AUDIVISUALES)				CONTENO: ARMADO DE MESA, PARA FUNDIDA DE LOSA DE ENTRE-PISO.			
Firma <u> <i>LMR</i> </u>				Firma <u> <i>MS</i> </u>			
Nombre: <u> JAIME MERCADO RUIZ </u> COORDINADOR TECNICO				Nombre: <u> MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ </u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO			
Matricula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.				Matricula No. : 08700-69126 ATLÁNTICO			

10 marzo 2020
 Hg Jose

6391
 2/9



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERIODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	16	DE	45
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

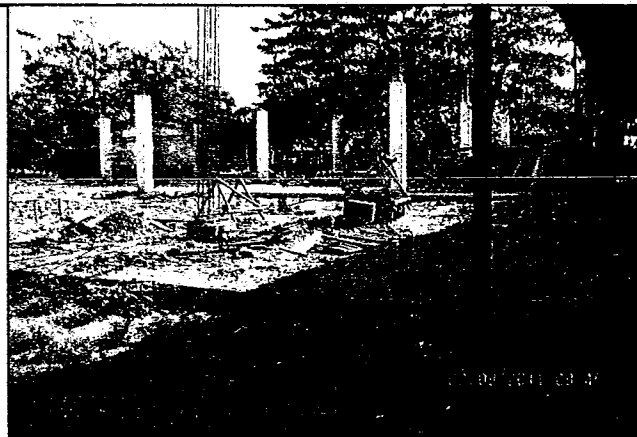

CONTENIDO: DETALLE ENCOFRADO DE PEDESTAL.



CONTENIDO: DETALLE, EXCAVACIÓN. PARA CIMIENTO DE MURO. (FACHADA LATERAL)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.

10-marzo-2020
M. Jose Gides

6490
220



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERÍODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	17	DE	45
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EXISTENTE (ESP. 0.05)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

70-Marzo-2020
Hra Jde Udes

641
227



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERÍODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	18	DE	45
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: DETALLE, DEMOLICIÓN DE VIGAS, DE CIMENTACIÓN EXISTENTES.

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10-Marzo-2020
H. Jose Uides

642
222



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERÍODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	19	DE	45
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: DETALLE, ARMADO DEL HIERRO, Y FUNDIDA DE VIGA DE CIMENTACIÓN. (MURO DE FACHADA LATERAL)

CONTENIDO: DETALLE. APLOMADA PARA CIMENTACIÓN DEL MURO (SALON DE AUDIOVISUALES)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10 MAR 2012
M. José Uribe

643
222



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA


INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERIODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	20	DE	45
FECHA	26	O2	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

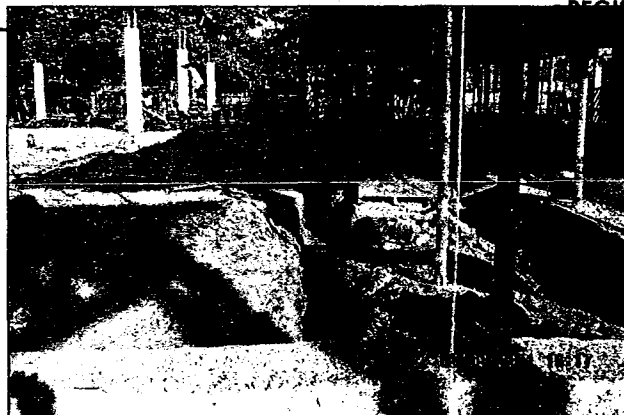

CONTENIDO: EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS PARA MUROS DE FACHADA PRINCIPAL Y FACHADA POSTERIOR. (DIM 0,30X0,30)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10-MAR-2012
Hr. José Ojeda

644

224



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERÍODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	21	DE	45
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR


SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

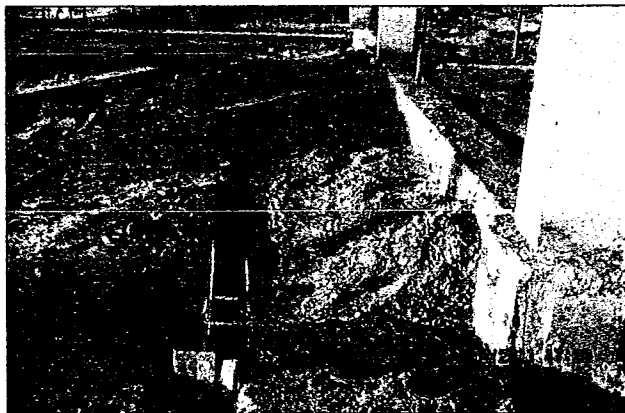

CONTENIDO: DETALLE DE FUNDIDA DE VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO, FACHADA LATERAL

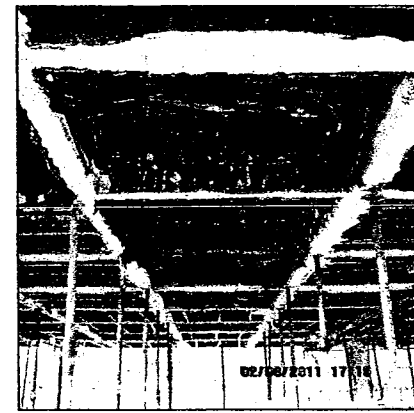

CONTENIDO: DETALLE, PANORAMICA GENERAL, DESENCOFRE DE CASETONES EN MADERA. (LOSA DE ENTREPISO)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ

COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10-Marzo-2020
1a Jose Uides

645
225



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERÍODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	22	DE	45
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRAFICO

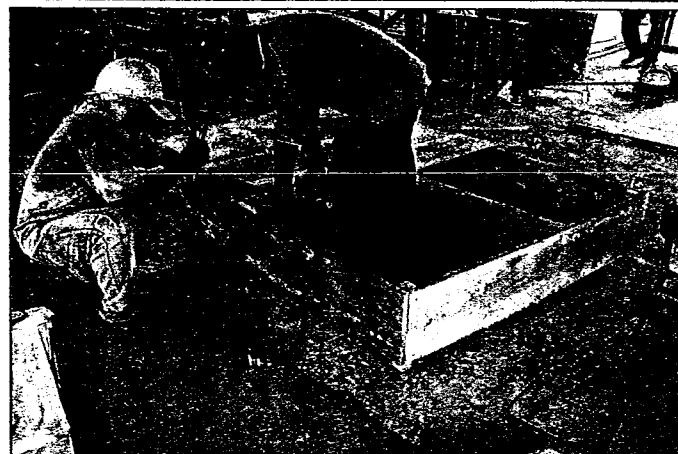

CONTENIDO: DETALLE, DESENCOFRE DE CASETONES EN MADERA.

CONTENIDO: CONSTRUCCIÓN DE CASETONES, EN MADERA (DIM. 1.50X1.50)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

HA JOSE VIDES
10-MARZO-2010

646
226



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERIODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	23	DE	45
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRAFICO

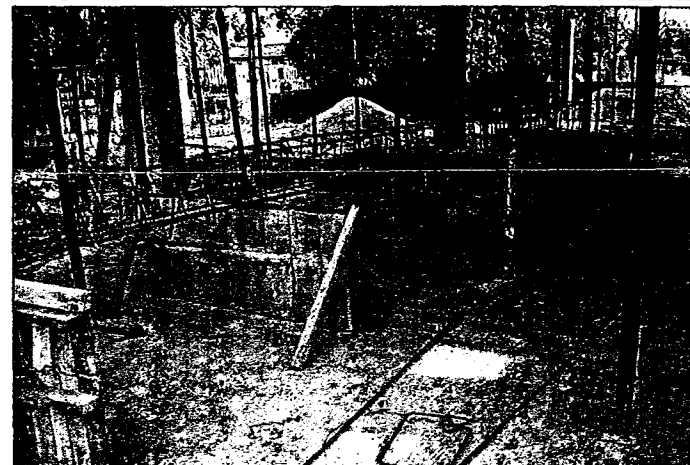

CONTENIDO: DETALLE, ARMADO DEL HIERRO, PARA FUNDICIÓN DE VIGAS. (LOSA DE ENTREPISO)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10-March-2011
M48008

647
227



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERÍODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	24	DE	45
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: ARMADO DEL HIERRO DE VIGA CIMENTO DEL EJE F1-H1



CONTENIDO: ARMADO DEL HIERRO DE VIGA CIMENTO DEL EJE F2-F1

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

RECIBIDO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO
26-02-2011

648
228



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERIODO	26/01/2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	25	DE	45
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: FUNDIDA DE VIGA CIMINETO, EN CONCRETO (DIM. 0,40X0,30) DEL EJE H2-H1

CONTENO: FUNDIDA DE VIGA CIMINETO, EN CONCRETO (DIM. 0,40X0,30) DEL EJE F1-H1

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula Na.: 08700-69126 ATLÁNTICO

Fecha: 26/02/2011
Firma: [Handwritten signature]
Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula: 08700-69126 ATLÁNTICO

649
[Handwritten signature]



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERIODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	26	DE	45
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: FUNDIDA DE VIGA CIMINETO, EN CONCRETO (DIM. 0.40X0.30) DEL EJE H2-F2



CONTENIDO: FUNDIDA DE VIGA CIMINETO, EN CONCRETO (DIM. 0.40X0.30) DEL EJE F2-F1

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO.

Verificado en el terreno el 26/02/2011
por el Ing. Jaime Mercado Ruiz
Coordinador Técnico
Matrícula No. 08700-51664
Atlántico.

670



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERÍODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	27	DE	45
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.


CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO



FOTOGRAFÍA

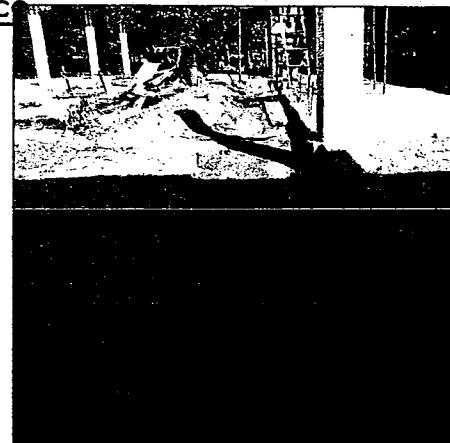

CONTENIDO: FUNDIDA DE VIGA CIMINETO, EN CONCRETO (DIM. 0.40X0.30) DEL EJES E5.G5 - G4.G5 - G5.J5.

CONTENIDO: FUNDIDA DE VIGA CIMINETO, EN CONCRETO CICLOPEO (DIM. 0.30X0.30) JARDINERAS.

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

Fecha: 16-02-2011
Firma: [Handwritten signature]
Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

657
234



INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO		
PERIODO	SEDE 2		
	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	28	DE	45
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÀ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL
CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONTENIDO: ARMADO DEL HIERRO PARA VIGA CIMIENTO. Y DETALLE DE FUNDIDA DE VIGA. (FACHADA POSTERIOR)

Firma LILD

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TECNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma _____

Nombre: **MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ**
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No. : 08700-69126 ATLÀNTICO

[illegible]

~~232~~
652



MANUEL GERMAN CUELLO
SEDE 2

26/01-2011 AL 26/02/2011

45

2011

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: FUNDIDA DE VIGA CIMINETO, EN CONCRETO CICLOPEO(DIM. 0,30X0,30) MURO DE FACHADA POSTERIOR Y JARDINERA.

10/15/51

F. S. Brown

Matrícula No. : 08700-69126 ATLÀNTICO

[illegible]

659



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERÍODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	30	DE	45
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

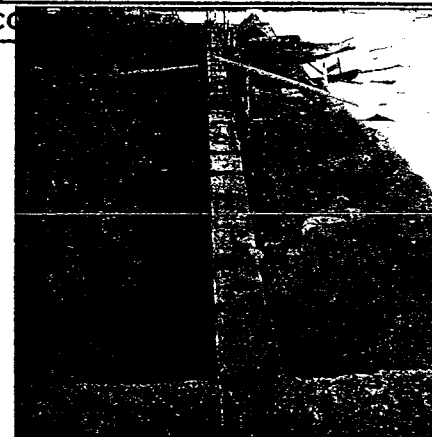

CONTENIDO: DETALLE, LEVANTE DE SOBRENIVEL EN LADRILLO. (MURO DE FACHADA POSTERIOR Y JARDINERA.)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

RECEBIDO
En la Oficina de Planeación y Obras Públicas
El 26 de Febrero de 2011
Firma: [Firma] Fecha: 26/02/2011

654
234



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERÍODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	31	DE	45
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: EXCAVACIÓN DE CIMENTO (DIM. 0.30X0.30)

CONTENIDO: DETALLE, DEMOLICIÓN DE VIGA CIMENTO EXISTENTE.

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

RECEBIDO: 26/02/2011
A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE DOCUMENTACIÓN Y FOTOCOPIADO
Firma: RAJOS URS
Fecha: 10-11-2011

617
235

~~235~~
676



INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO		
	SEDE 2		
PERÍODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	33	DE	45
FECHA	26	02	2011

OBJETO:CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE
AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y
CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE
CHIRIGUANA.

**CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL
CESAR**

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONTENIDO: DETALLE, SIMBRADO PARA ARMADO DE FORMALETRIA DE COLUMNA EJE F1



CONTENIDO: ARMADO DE FORMALETERIA, PARA FUNDICIÓN DE COLUMNA
[EJEF]

Firma

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TECNICO
Matricula No.: 08700-51664 ATLANTICO.

Firma

Nombre: **MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ**
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matricula No. : 08700-69126 ATLANTICO

CONFIDENTIAL

74-108-1065-2020

617



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERÍODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	34	DE	45
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: DETALLE, FUNDIDA DE VIGA CIMENTO EN CONCRETO CICLOPEO, Y LEVANTE DE SOBRENIVEL EN LADRILLO. AREA DE AUDIOVISUALES Y JARDINERAS.

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ

COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLANTICO

Fecha: 17/02/2011
Firma: [Handwritten signature]
Código: 08700-51664
2011

656
238



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERÍODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	35	DE	45
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

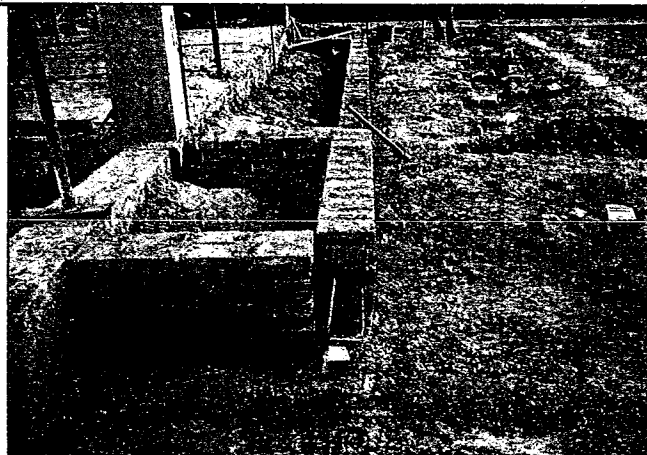

CONTENIDO: LEVANTE DE SOBRENIVEL EN LADRILLO. AREA DE AUDIOVISUALES Y DEPOSITO DE DEPORTES.

CONTENO: DETALLE, PAÑETE DE SOBRENIVEL (AREA DE DEPOSITO DE DEPORTES.

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No. : 08700-69126 ATLÁNTICO

RECIBIDO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO
26/02/2011
10:54 AM
1032

619
1034



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERÍODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	36	DE	45
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

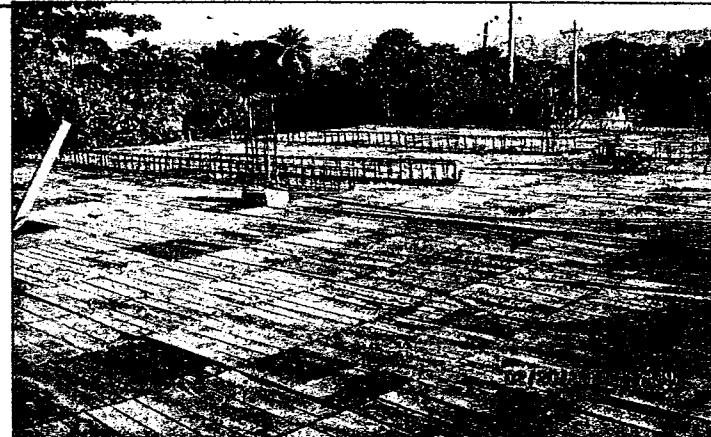

CONTENIDO: PANORAMICA GENERAL, CONSTRUCCION DE MESA, PARA FUNDIDA DE LOSA.

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

Handwritten notes and stamps on the left margin, including dates like '10-NOV-2010' and '10-NOV-2010'.

Handwritten notes and stamps on the bottom right margin, including the number '240' and the letters 'LCC'.



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2		
PERÍODO	26/01/2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	37	DE	45
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: ARMADO DE HIERRO PARA VIGAS DE CIMENTO Y COLUMNAS.

CONTENIDO: CORTE DEL HIERRO (CONFINAMIENTO)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

Recibido en el Municipio de Chiriguana el día 26 de febrero de 2011.
Firma: [Firma] y sello de la Alcaldía Municipal de Chiriguana.

64-1

241



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN

MANUEL GERMAN CUELLO
SEDE 2

PERÍODO

26/01-2011 AL 26/02/2011

PÁGINA

38

DE

45

FECHA

26

02

2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO



REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO. Y COMPACTADO AREA DE (COMEDOR ESTUDIANTIL.)

CONTENIDO: DETALLE, FUNDIDA DE PLANTILLA EN CONCRETO (ESP. 0,07) ZONA DE AULAS DE CLASES.

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

Firma: *[Handwritten signature]*
Fecha: *[Handwritten date]*
Lugar: *[Handwritten location]*

662

242



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN

MANUEL GERMAN CUELLO
SEDE 2

PERIODO

26/01-2011 AL 26/02/2011

PÁGINA

39

DE

45

FECHA

26

02

2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

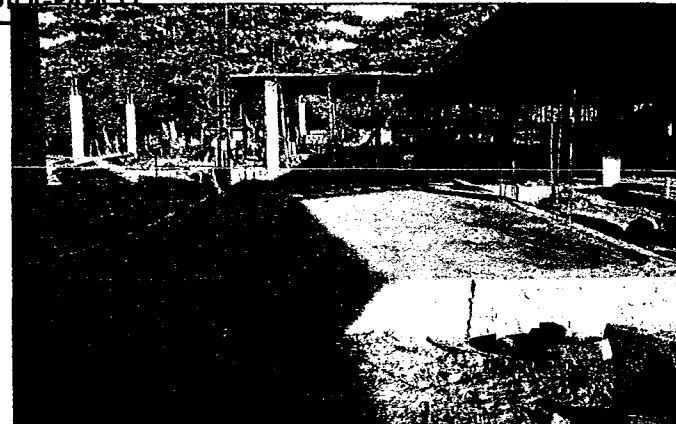

CONTENIDO: DETALLE RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO. (AREA RAMPA DE ACCESO)

CONTENIDO: DETALLE, COMPACTACIÓN DE TERRENO. (RAMPA DE ACCESO PRINCIPAL)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.

Firma

Nombre:





MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

Fecha: 10-02-2011
Firma: [Handwritten Signature]
Código: 08700-51664
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO

663



243

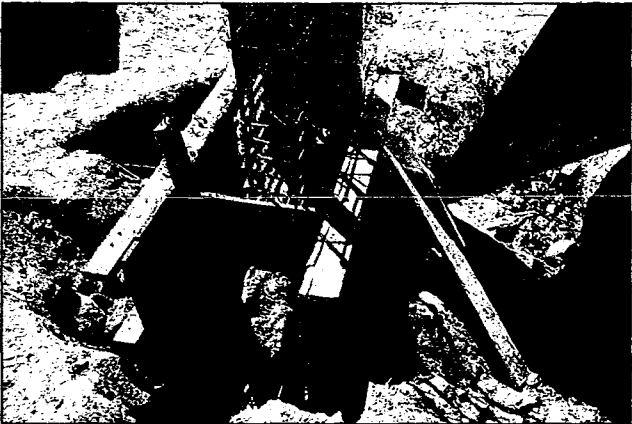	INTERVENTORÍA:		INSTITUCIÓN		MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2	
			PERÍODO		26/01-2011 AL 26/02/2011	
	CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		PÁGINA		40	DE 45
			FECHA		26	02 2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.			CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	
					SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO	
			RO FOTOGRÁFICO			
CONTENIDO: DETALLE, ARMADO DE FORMALETERIA, Y FUNDIDA DE PEDESTAL. EJE. J1			CONTENIDO: DETALLE, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS, PARA FUNDIDA DE COLUMNAS.			
Firma: 			Firma: 			
Nombre: <u>JAIME MERCADO RUIZ</u> COORDINADOR TÉCNICO Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.			Nombre: <u>MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ</u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO			

	INTERVENTORÍA:		INSTITUCIÓN		MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2	
			PERÍODO		26/01-2011 AL 26/02/2011	
	CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		PÁGINA		41	DE 45
			FECHA		26	02 2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.		CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
CONTENIDO: LEVANTE DE MURO EN BLOQUE SAMO, FACHADA LATERAL (AULAS DE PREESCOLAR)			CONTENIDO: RELLENO CON MATERIAL SELECCIONDO Y COMPACTADO. (AREA DE AUDIOVISUALES.)			
Firma: 			Firma: 			
Nombre: <u>JAIME MERCADO RUIZ</u> COORDINADOR TÉCNICO Matricula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.			Nombre: <u>MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ</u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO Matricula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO			

Fecha: 10-03-2011
 Firmado: 
 Por: 
 En: 
 10-03-2011

665
 245

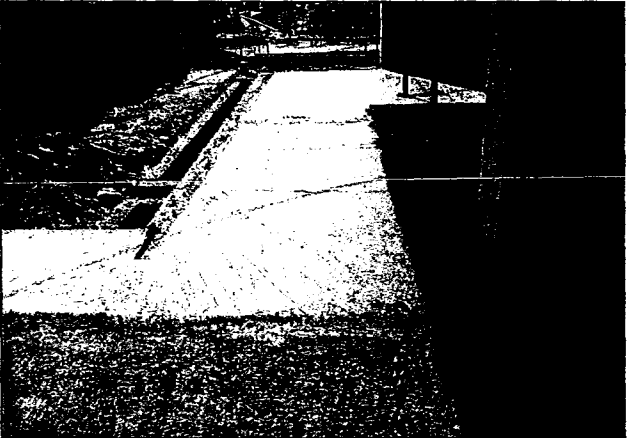	INTERVENTORÍA:		INSTITUCIÓN		MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2	
			PERÍODO		26/01/2011 AL 26/02/2011	
	CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		PÁGINA	45	DE	45
			FECHA	26	02	2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE		CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
CONTENIDO: DETALLE, FUNDIDA DE PLANTILLA EN CONCRETO (ESP. 0,07)						
Firma 			Firma 			
Nombre: <u>JAIME MERCADO RUIZ</u> COORDINADOR TÉCNICO			Nombre: <u>MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ</u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO			
Matrícula No.: 08700-51664 ATLÁNTICO.			Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO			

10- MARZO - 2011
 14-108-010

246
 666

~~247~~
667

**PROGRAMACIÓN DE OBRAS.
ESCUELA MANUEL GERMÁN CUELLO.
RINCÓN HONDO.**

10 - Março - 2020
Má José Vides

PROGRAMACION DE OBRAS RINCON HONDO

[illegible]

10-11-1953
M-10000

~~248~~
668

249

669

**FOTOCOPIA DE LA BITÁCORA QUE MUESTRA EL
AVANCE DE OBRAS DE LA ESCUELA MANUEL
GERMAN CUELLO SEDE NO. 1 – RINCÓN HONDO.**

Escuela Manuel German Cuello
Código de
10-Marzo-2020
Firma: Jose Vides



Martes 18/2011

250

Quitar los separadores de la lona gacha
y lacha, Guardarlos.

EXU

Punto Himpresabilizado para vigas de
amarre. Domicilio de plantilla
limpieza general de la obra, y
Plantilla de pisos.



 

Miércoles 19/2011

Inventory de Hierro, ingreso Norio
Celador (Alcoba).

Hacer una mesa de Planchado
8 pm.

Punto de Vigas de Amarre
Plantilla de pisos.



Jueves 19/2011

Desbarre de Block. Lomo (Una mesa)

Nora Martes 18/2011.

La obra se suspende debido a que el Contratista por su parte no
permite que se realice ninguna de las actividades programadas.

Por un fomento de Material (Cemento) a lo cual esta Interventora
le solicita que los asuntos administrativos de Carácter Interno,
no puedan afectar el desarrollo de los obra y mas sabiendo que
esta no cumple con la programación.

10 - Marzo - 2011
Firma: H. José Vides

621

Rectificación de niveles y desmontados.

Nota: El desarrollo de la obra se adelantará en el día de hoy y mañana debido a una calamidad familiar.

Feb 4/2011 Vir.

Actividades: Limpieza de obra.

Fundida y Replanteo de Plantilla de los ejes

$$A_1 A_2 A_3 \quad \Delta_1 \Delta_2 \Delta_3 \quad \Delta_2 \Delta_3 \Delta_1 \quad A_1 A_3$$

Fijada de Plantilla en el Arco de prescolar en la ejes

$C_7 - C_{10} - C_{15} - C_{10} D_{15} - C_{10} D_{15} D_{10} D_7$ f Rollme

Sat. Feb 5 - 2021

Fundición de Columnas de las cjas M, y H.

Fundido de plantilla de los ejes $B_{10}C_{10} - C_{10}C_7 - B_7B_1, B_7B_{10}$

Fundida de pedestal Gy.

Repleno y compactación $28m^3$ en los ejes $M_6 - M_5 - M_4 - P_5 - P_6$

Feb 6/2011

Fondida de Plantilla en los ejes $P_1, M_1 - M_2, M_3 - M_4, P_5 - P_6 - P_7$

LMN Feb 7/2011

• Fundida de plantilla en los ejes $As_9P_8 - P_8P_6 - P_6As_6 - As_6As_9$

• Fundida de Viga de Amara del g^o 12-H^o 10-Marzo

• Relación y compactación en los ejes $A_{10} \rightarrow A_7 \rightarrow B_7 \rightarrow B_{10} \rightarrow B_{10} \rightarrow A_{10}$


Mar. 7 de 8 2011

252

Inicia Actividad de Armado de mesa y nivelación.

Fundición de Plantilla Ejes A10 A7 A7 B7 B10 B10 A10. (proscenios 6x2)

Rebando y Compactación area de proscenios. - Sistema.



Mir Feb 9/2011

Actividades: Rebando y Compactación con material, Excavación.

Seleccionado ejes E5 - E6 - G5 - G6. (H1 - H2 F1 - F2)

Armado de mesa, Armado de Hierro y Excavación de la viga P6 - M6. Desapogote, demolición, trazado y replanteo excavación y armado de hierro para Viga de Cimentación.


El área de Sistema, Andenes y Jardineras.

Jov. Feb 10/2011

Fundida de plantilla Ejes E5 - G5 - G6. (Sistema).

Fundida de Viga de Cimiento Eje M6 - P6.

Armado de Mesa de entrapiso, Trazado de la Cimentación de la Rampa. incluye excavación, Hierro Limpieza General y Desapogado de Casetones.



Vir. Feb 11/2011



Armado de loza y so nivelación,

Fundida de plantilla en los ejes M6 - P6 (8'5 x 14')

Fundida de Cimiento de Jardineras y rampa.

Armado de Hierro de Formalería para Viga de cimiento ejes G5 - G6 - E4 - E4 - J4 G4.

Desmante de Casetones.




Sab. Feb 12/2011

Fundida de Viga de Cimiento en los ejes G5 - G6 - E4 G4 y G4 J4. incluye formalería.

10 - Marzo - 2011
MA José Vides


Lun 14 Feb. Los trabajadores suspenden actividades por falta de su pago.



Mier 15 Feb Se realizan las actividades de Armado de Hierro la placa de entrapiso.

Excavación de Viga de Cimiento para rampa incl el armado de Hierro.

Actividad de Levante de Sobrenivel en la dallas moras exteriores y jardinerías.




Mier 16 Feb

Actividades: Armado de Casetonas (1.5 x 1.5), Sobrenivel y relleno (Área de Rampa).

Excavación de Viga de Cimiento en los ejes O, M, J, D2-O, M, M2.


Armado de Hierro en la Losa.



Jue 17 Feb. Actividades de Viga de cimiento ciclapzo la rampa.

Fundida de Viga de Cimiento en los ejes O, M, M, J, D2-O, M, M2. (Incluye Armado A de Hierro y formatería).

Demolición de Vigas en los ejes O, D2 - M, M2. Construcción de Casetonas. Excavación de las Vigas de cimiento y fundida en los ejes H2 F2, H, J.



14-Marzo-2020
17-Feb-2020
14-Feb-2020

Vie Feb 18 2011

254

Actividades: Fondida de plantilla en las ejas O₁-O₂


O₂ AA₂ AA₂ AA₁ O₁

674

Fondida de Viguetas a nivel de sobre nivel.

Trazado, Replanteo y excavación de Jardineras.

Sobrenivel en la dritta Area de Rampa.



Sab Feb 19 2011

Actividad de Sobrenivel en el área de Rampa y Jardineras.


Excavación de Jardineras y relleno (Armado de hierro y Armado de Casetones).



Dom 21 Feb 2011

Actividad de Relleno en el área de Rampa.

Trazado y relleno de muro Area de prescolar.



Mie 22 Feb 2011

Armado y parada de Cajas de Columnas.

Fondida de Cimiento de las Vigas


Ejas F₂-F₁ F₁-H₁ H₁-J₁

Armado de Hierro:

Fondida de Cimiento escalera (Area de rampa)

Llave de muro en el área de prescolar

Estimado Fondida de pedestal J₁ (1)



Mie 23 Feb 2011

Febrero 10 - Marzo 2011
FEBRERO 2011

Mie 25 Feb 2011. ARMADA Y PARADA Cajas columnas

- 1F-64 → 2 UNIDADES.


- ARMADO Hierro local 20 ETAPA.

- FUNDIDA PLANTILLA AREA DEPOSITO DEPORTE.
- LEVANTE MURO BLOQUE SANO - 10

671

E/E E5 ↔ E6 - G5 ↔ G6


D7 ↔ D10 - C7 ↔ C10 - B7 - B10.



ARQ: ERNESTO ARTURO.

FEB 24 2011 - FUNDIDA PLANTILLA AREA XULA S.

- LEVANTE MUROS.
- TRAZADO MUROS.
- FORMALETA COLUMNAS 2º PISO.
- 4.00 PM → Corte luz. → suministro AGUA.



10 - MARZO - 2010
 Fichas: 14 Jose Luis

~~256~~
676

**CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA
ESCUELA MANUEL GERMAN CUELLO –
RINCÓN HONDO.**

10- Mayo-2020
Hª José Vides

257
67x


	INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	CONTRATISTA: CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO
INSTITUCIÓN: MANUEL GERMAN CUELLO No1			
PERIODO: 26/01/2011 AL 26/02/2011			
FECHA: FEBRERO 26 DEL 2011			
SITIO: CORREGIMIENTO DE RINCON HONDO			

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Si/Bueno	No/Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo		X	EN GENERAL EL ESTADO DE LA MAQUINARIA NO ES BUENO.
- Regularidad del mantenimiento		X	EL MANTENIMIENTO NO ES CONSTANTE.
- Vibraciones /Ruidos	x		
- Protecciones / Guardas / Frenos	x		
- Idoneidad operarios		X	UN OBRERO ES EL ENCARGADO DE MANEJAR Y HACERLE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	x		
- Buen estado	x		
- Fácil acceso y operación	x		
- Uso según zona de trabajo		x	NO APLICA POR QUE EL CAMPAMENTO ES GENERAL PARA CADA OBRA.
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa		X	LA DOTACION BASICA ES DEFICIENTE ENJ EL CASO DEL FRENTE DE OBRA No 2 A CARGO DEL MAESTRO
- Buen estado	x		
- Uso según zona de trabajo	x		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente		X	LA OBRA NO SE ENCUENTRA SEÑALIZADA Y NO ESTAN DEMARCADAS LAS RUTAS DE EVACUACION.
- Uso según zona de trabajo	X		NO SE UTILIZA POR QUE NO HAY JORNADA NOCTURNA .
VIGILANCIA			
- Personal suficiente	x		
- Diurna	x		EL ALMACENISTA HACE LABORES DE VIGILANCIA
- Nocturna	x		CELADURIA NOCTURNA A CARGO DE PERSONAL CONTRATADO POR EL CONTRATISTA.
EMERGENCIAS			
- Afiliación del Personal al Sistema de Seguridad Social y ARP	x		

Firma: 
 MIGUEL VARGAS SÁNCHEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA

Firma: 
 JAIME MERCADO RUIZ
 COORDINADOR TECNICO DE INTERVENTORIA

12 - Marzo - 2011
 Hu Jose yider

~~258~~

678

**CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO.
ESCUELA MANUEL GERMAN CUELLO –
RINCÓN HONDO**

10 MARZO 2020
HA JOSE VILAS

259

679



INTERVENTORIA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO


CONTRATO: CONSTRUCCION Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA			CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISION DEL CONTRATO: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	
INSTITUCION			MANUEL GERMAN CUELLO SEDE 2			
PERIODO			ENE-26-11 A FEB 26 -11			
SITIO			CORREGIMIENTO DE RINCON HONDO			
FECHA			FEBRERO 26 DEL 2011			

No.	FECHA	HORAS SOL	HORAS LLUVIA	LLUVIA EN LA NOCHE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	26/12/2010	6	2			
2	27/12/2010	8	0		X	
3	28/12/2010	8	0		X	
4	29/12/2010	8	0		X	
5	30/12/2010	8	0		X	
6	01/01/2011	8	0		X	
7	02/01/2011	8	0		X	
8	03/01/2011	8	0		X	
9	04/01/2011	8	0		X	
10	05/01/2011	8	0		X	
11	06/01/2011	8	0		X	
12	07/01/2011	8	0		X	
13	08/01/2011	8	0		X	
14	09/01/2011	8	0		X	
15	10/01/2011	8	0		X	
16	11/01/2011	8	0		X	
17	12/01/2011	8	0		X	
18	13/01/2011	8	0		X	
19	14/01/2011	8	0		X	
20	15/01/2011	8	0		X	
21	16/01/2011	8	0		X	
22	17/01/2011	8	0		X	
23	18/01/2011	8	0		X	
24	19/01/2011	8	0		X	
25	20/01/2011	8	0		X	
26	21/01/2011	8	0		X	
27	22/01/2011	8	0		X	
28	23/01/2011	8	0		X	
29	24/01/2011	8	0		X	
30	25/01/2011	8	0		X	
31	26/01/2011	8	0		X	


SOL 246

LLUVIA 2


LLUVIA 1%



SOL 99%

Firma: 

ARQ. JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TECNICO DE INTERVENTORIA

Firma: 

ARQ. MIGUEL ANTONIO VARGAS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA

10-Marzo-2011

174 Jose Vides

~~260~~

682





10 Miguel - 2020
Mr Jose Vides

261

651


**RESUMEN FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DE OBRAS
DE LA ESCUELA RURAL MIXTA LA SIERRA.**

10 - Marzo - 2020
M4 José Vides

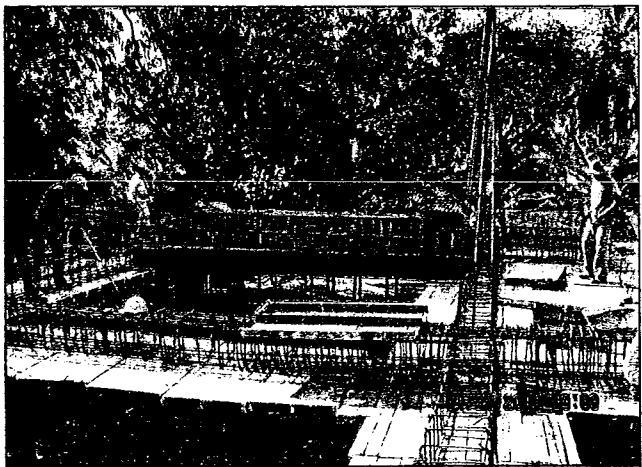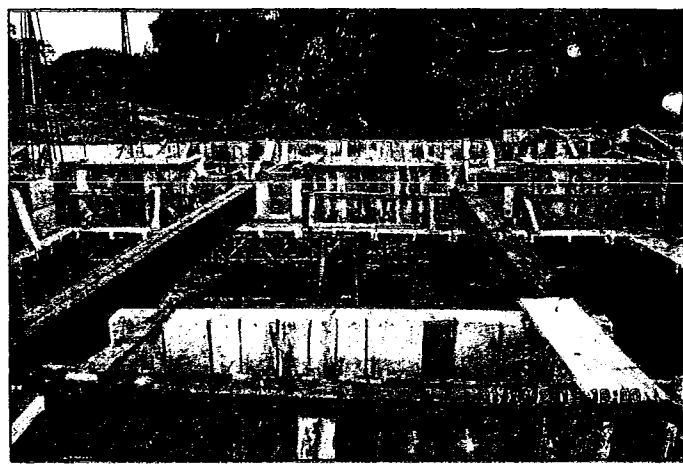

	INTERVENTORÍA:			INSTITUCIÓN		LA SIERRA	
	CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA			PERÍODO		26/01/2011 AL 26/02/2011	
				PÁGINA		01 DE 22	
				FECHA		26 01 2011	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.		CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA	
REGISTRO FOTOGRÁFICO							
							
CONTENIDO: DETALLE, ARMADO DEL HIERRO PARA FUNDIDA DE VIGAS, EN CONCRETO.				CONTENIDO: DETALLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA, (PAG) 300 ENCAJONADA A LA VIGA DE CONCRETO, ARMADO			
Firma: 				Firma: 			
Nombre: <u>JAIME MERCADO RUIZ</u> COORDINADOR TÉCNICO Matrícula No.: 0870051-664 ATLÁNTICO				Nombre: <u>MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ</u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO			

10 de Mayo - 2012
 14:00 horas

652
 2012

	INTERVENTORÍA:				INSTITUCIÓN	LA SIERRA		
	CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA				PERÍODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
					PÁGINA	02	DE	22
					FECHA	26	01	2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.		CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA		
REGISTRO FOTOGRÁFICO								
								
CONTENIDO: DETALLE. NIVELACIÓN DE GATOS Y CERCHAS PARA FUNDIDA DE LOZA, EN METALDECK.								
Firma: 					Firma: 			
Nombre: <u>JAIME MERCADO RUIZ</u> COORDINADOR TÉCNICO Matrícula No.: 0870051-664 ATLÁNTICO					Nombre: <u>MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ</u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO			

65

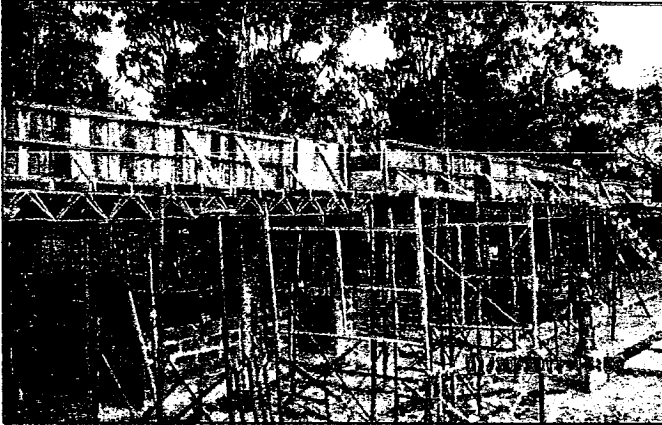	INTERVENTORÍA: CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		INSTITUCIÓN		LA SIERRA	
			PERIODO		26/01/2011 AL 26/02/2011	
			PÁGINA	03	DE	22
			FECHA	26	01	2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE			CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	
					SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA	
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
CONTENIDO: DETALLE. ARMADO DE MEZA, PARA FUNDIDA DE VIGAS. (BLOQUE DE APOYO ACADEMICO)			CONTENIDO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDERAS, PARA FUNDIDA DE VIGAS Y VIGUETAS. (BLOQUE DE APOYO ACADEMICO)			
Firma: 			Firma: 			
Nombre: <u>JAIME MERCADO RUIZ</u> COORDINADOR TÉCNICO			Nombre: <u>MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ</u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO			
Matrícula No.: 0870051-664 ATLÁNTICO			Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO			

10-NOV-2011
 HA JOSE VARGAS

684
 2011



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	LA SIERRA		
PERIODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	04	DE	22
FECHA	26	01	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

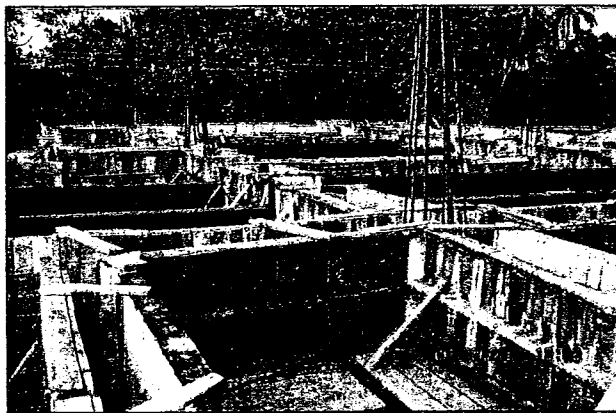

CONTENIDO: ARMADO Y ALINEAMIENTO DE GUARDERAS



CONTENIDO: FUNDIDA DE VIGAS Y VIGUETAS EN CONCRETO ARMADO

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 0870051-664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10-MAR-2011
14-10-2011

651
265



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	LA SIERRA		
PERIODO	26/01/2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	05	DE	22
FECHA	26	01	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: DETALLE. PASADORES EN VARILLA DE 1/2



CONTENIDO: DETALLE. FUNDIDA DE VIGA Y ACERO DE COLUMNAS. SEGUNDO PISO.

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 0870051-664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10 - Marzo - 2012
H. J. J. Vides

866
C. J. K.



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	LA SIERRA		
PERÍODO	26/01/2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	06	DE	22
FECHA	26	01	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

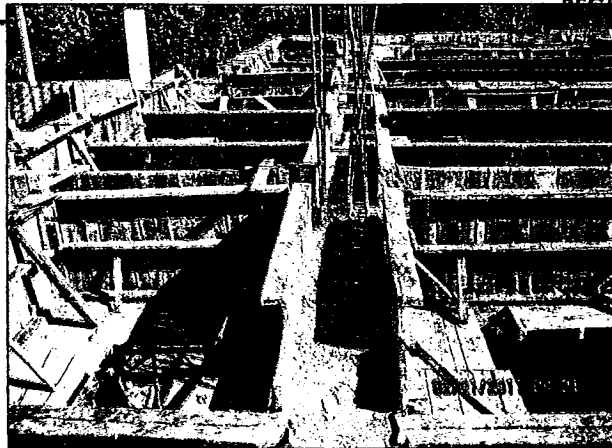

CONTENIDO: FUNDIDA DE VIGA (PRIMERA SECCIÓN)



CONTENIDO: REFORZAMIENTO, Y APUNTALAMIENTO DE GUARDERAS

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 0870051-664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10-MARZO-2012
M. José Vides

65X
267



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN

LA SIERRA

PERIODO

26/01/2011 AL 26/02/2011

PÁGINA

07

DE

22

FECHA

26

01

2011



OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

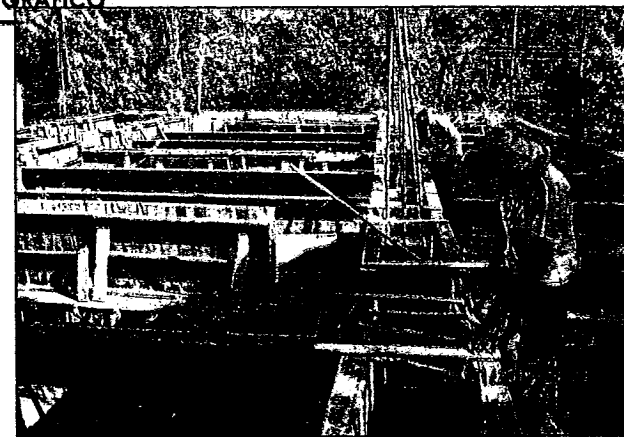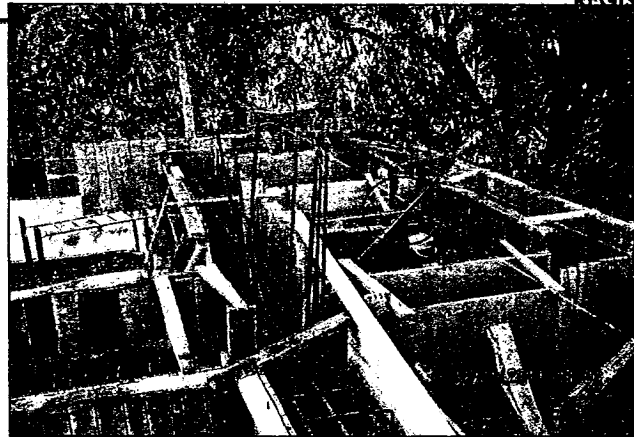

CONTENIDO: DETALLE, NIVELACIÓN DE VIGAS (VITOLA)

CONTENIDO: DETALLE, FUNDIDA DE VIGAS Y VIGUETAS EN CONCRETO, ARMADO (SEGUNDA SECCIÓN)

Firma

Nombre: **JAIME MERCADO RUIZ**
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 0870051-664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre: **MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ**
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

14-11-2010
ID-11-11-2010
14-11-2010

889
898



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	LA SIERRA		
PERIODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	08	DE	22
FECHA	26	01	2011



OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

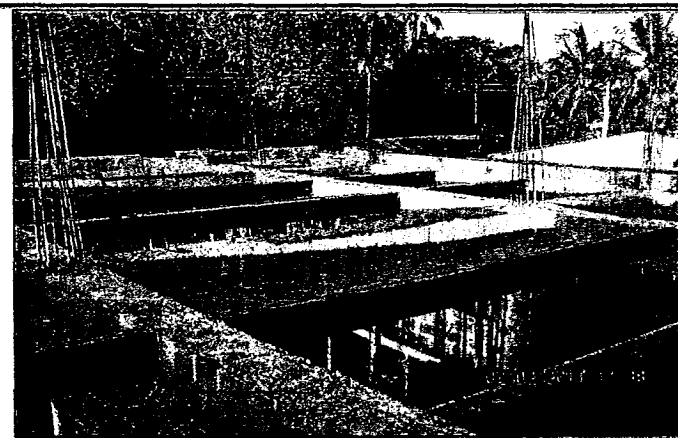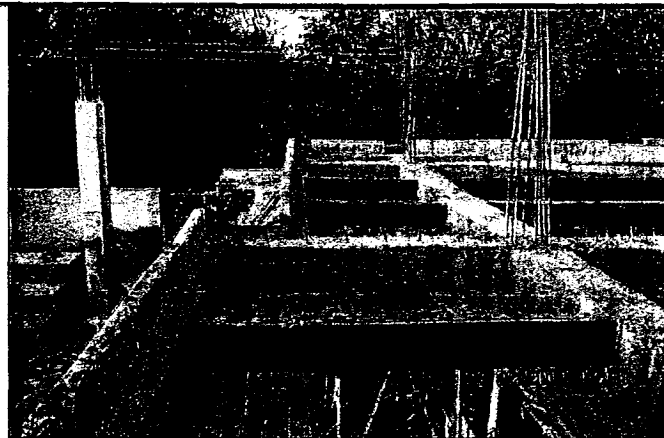

CONTENIDO: PANORAMICA, GENERAL DE VIGAS Y VIGUETAS FUNDIDAS. Y EMPOTRADO DE PERFILES PAG 300.

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 0870051-664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

659
269



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	LA SIERRA		
PERÍODO	26/01/2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	09	DE	22
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR


SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

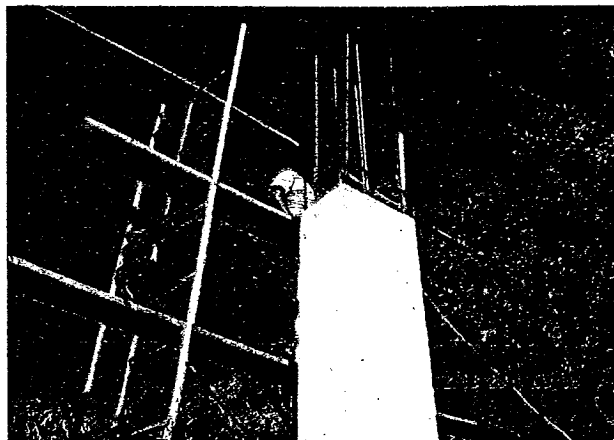

CONTENIDO: DETALLE, AMARRE DE ESTRIBOS, COLUMNA DE CANCHA MULTIPLE (1/2)

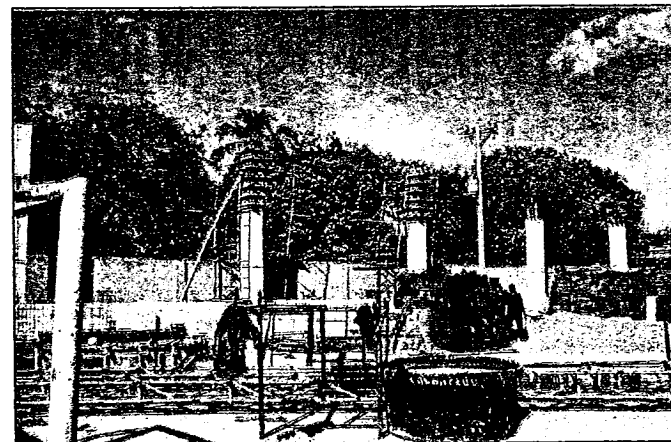

CONTENIDO: ARMADO DE FORMALETERIA, PARA FUNDIDA DE COLUMNAS, (CANCHA MULTIPLE)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 0870051-664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10- MARZO - 2011
POR JOSE MIGUEL

690
976



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	LA SIERRA		
PERIODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	10	DE	22
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR


SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

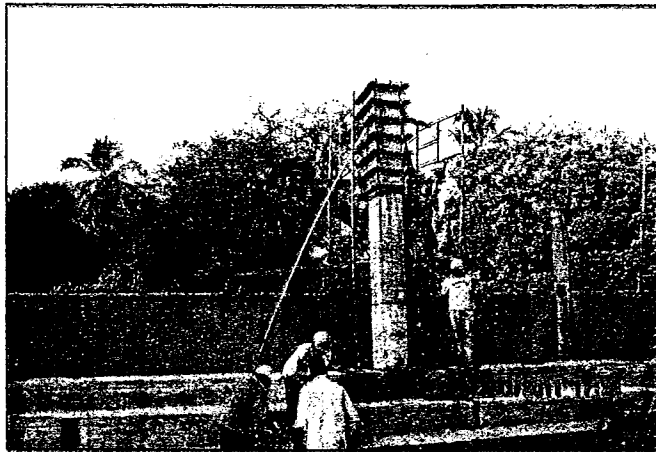

CONTENIDO: ENCOFRADO DE COLUMNA.(CANCHA MÚLTIPLE)

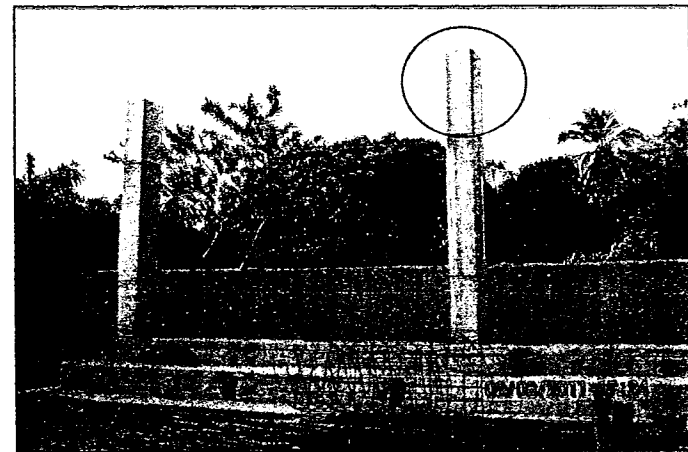

CONTENIDO: DETALLE, FUNDIDA DE COLUMNAS (MODULO SUPERIOR)

Firma

[Signature]

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ

COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 0870051-664 ATLÁNTICO

Firma

[Signature]

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

Finalizado
10-03-2011
Miguel Antonio Vargas Sanchez

691
27



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	LA SIERRA		
PERÍODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	11	DE	22
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

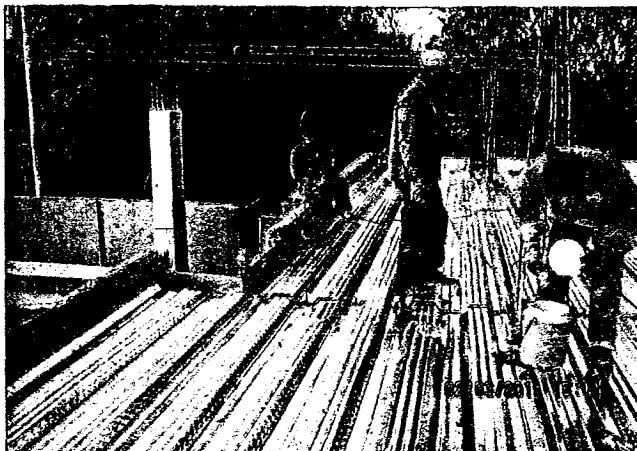

CONTENIDO: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE METALDECK Y DETALLE DE PASADORES EN HIERRO DE (1/2) (DIM 0,07cm)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ

COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 0870051-664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10- Marzo 2011
Hé Jose Oides

692

272



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN

LA SIERRA

PERÍODO

26/01-2011 AL 26/02/2011

PÁGINA

12

DE

22

FECHA

26

02

2011



OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

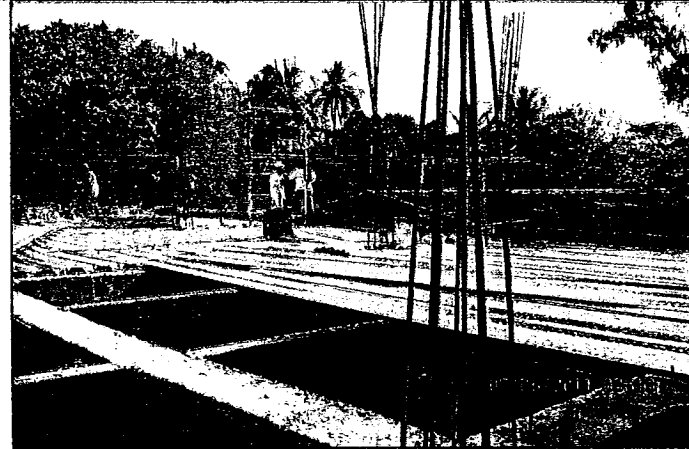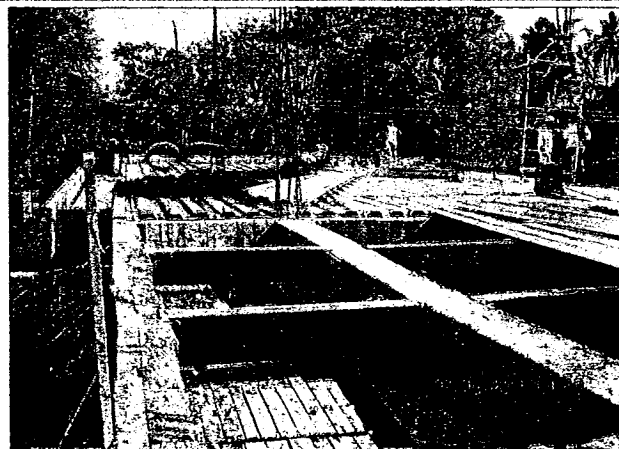

CONTENIDO: DETALLE, ASENTAMIENTO DE LAMINA DE METALDECK, PERFILES PAG Y VIGAS EN CONCRETO ARMADO.

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 0870051-664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10-11-2011
M. J. José Urdaz
2011

692

273



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN

LA SIERRA

PERÍODO

26/01-2011 AL 26/02/2011

PÁGINA

13

DE

22

FECHA

26

02

2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

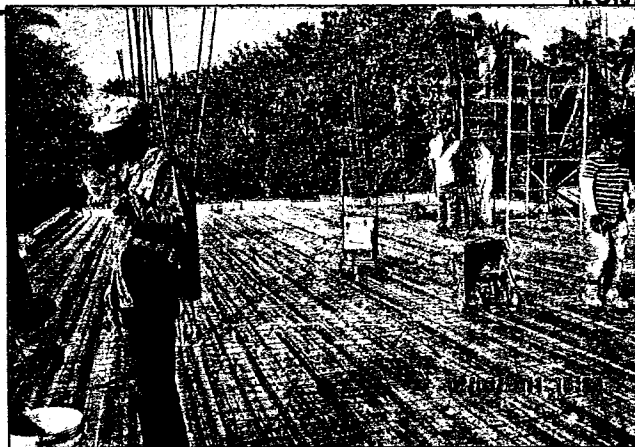

CONTENIDO: DETALLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTRO SOLDADA SOBRE LAMINA DE METALDECK.

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 0870051-664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

Fecha: 10-02-2011
Ma José Urdes
10-02-2011

694

234



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	LA SIERRA		
PERIODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	14	DE	22
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR


SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

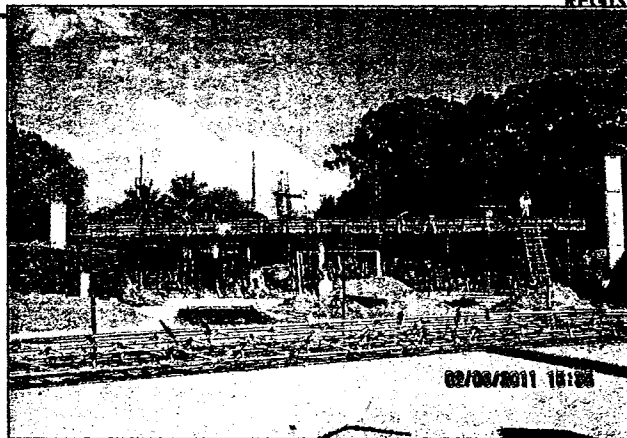

CONTENIDO: PANORAMICA GENERAL DE LA LOSA (ESTRUCTURA EN METALDECK)

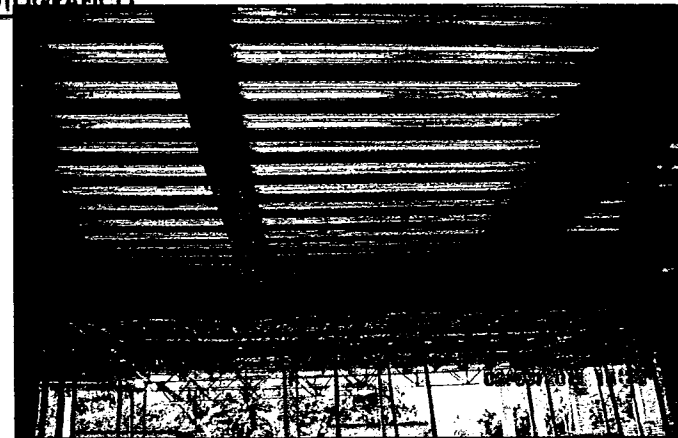

CONTENIDO: DETALLE, DE LOSA DESDE LA PARTE POSTERIOR.

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 0870051-664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10-Mar-10-2010
14-Mar-10-2010

695
875



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN

LA SIERRA

PERIODO

26/01/2011 AL 26/02/2011

PÁGINA

15

DE

22

FECHA

26

02

2011



OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

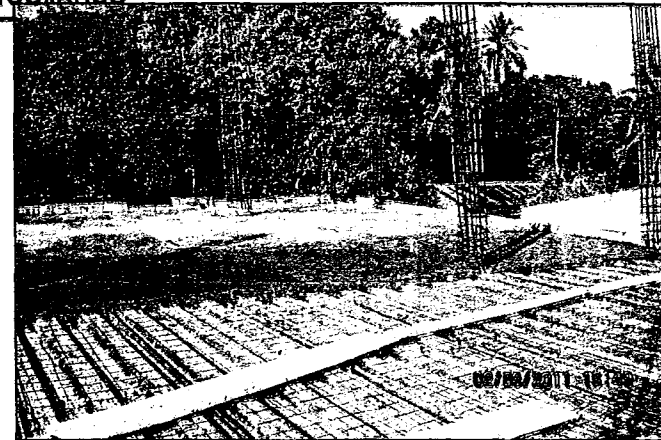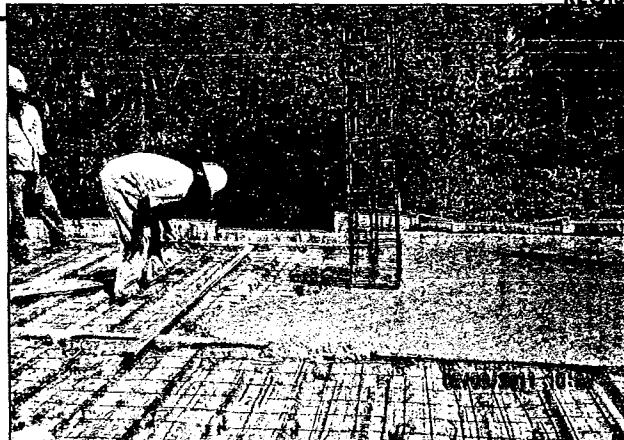

CONTENIDO: FUNDIDA DE PLANTILLA EN CONCRETO ARMADO (ESP. 0,12) AREA (BLOQUE DE APOYO ACADEMICO.)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 0870051-664 ATLÁNTICO

Firma




Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

70 marzo 2020
Ha José Uricó

696
276

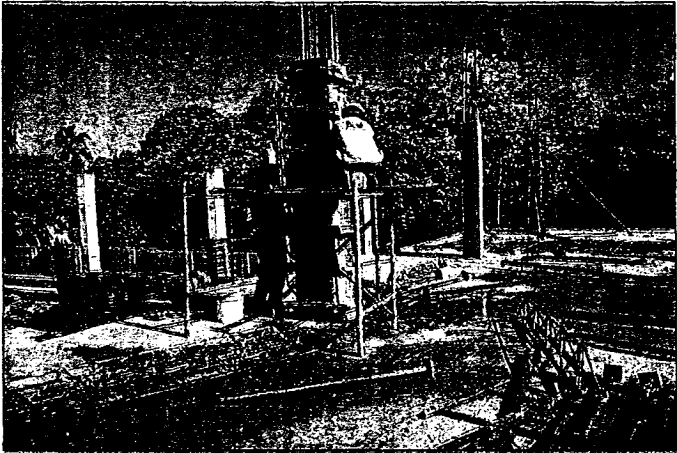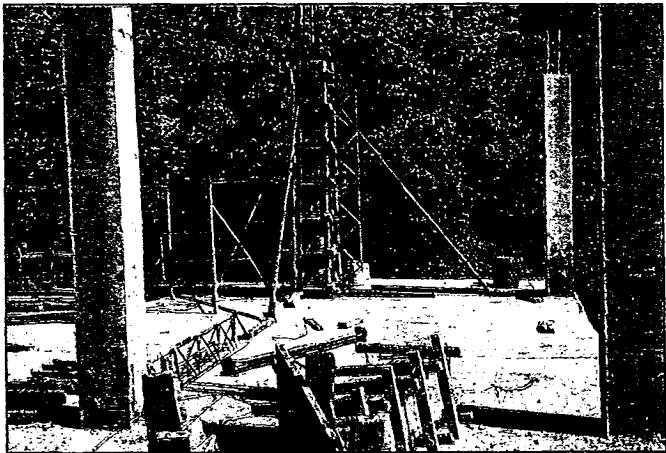	INTERVENTORÍA:		INSTITUCIÓN		LA SIERRA	
	CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		PERÍODO		26/01/2011 AL 26/02/2011	
			PÁGINA	16	DE	22
			FECHA	26	02	2011
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.		CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR		SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS		SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO						
						
CONTENIDO: ARMADA DE FORMALETA PARA FUNDIDA DE COLUMNAS. (DIM 0,40X0,40X2,80)			CONTENIDO: DETALLE. FUNDIDA DE COLUMNA. EN CONCRETO ARMADO. (DIM 0,40X0,40X2,80)			
Firma 			Firma 			
Nombre: <u>JAIME MERCADO RUIZ</u> COORDINADOR TÉCNICO Matrícula No.: 0870051-664 ATLÁNTICO			Nombre: <u>MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ</u> COORDINADOR ADMINISTRATIVO Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO			

10-11-2010
 14-3-2011
 10-11-2010
 14-3-2011

697
 277



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	LA SIERRA		
PERIODO	26/01/2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	17	DE	22
FECHA	26	02	2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA

RÉGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: PANETE SOBRE MURO DE GRADAS.

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ

COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 0870051-664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10- Norte - 2010
Ha doce slides

698
278



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN

LA SIERRA

PERIODO

26/01/2011 AL 26/02/2011

PÁGINA

18

DE

22

FECHA

26

02

2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR


SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

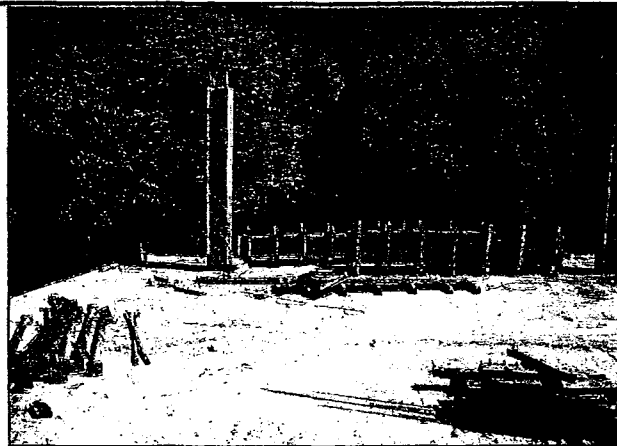

CONTENIDO: DETALLE DE FUNDIDA DE COLUMNA. H:2.80mts Y DESENCOFRADO.

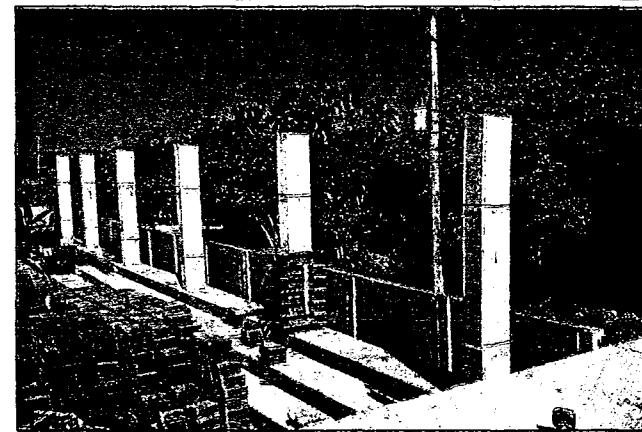

CONTENIDO: DETALLE, PANORAMICA GENERAL. FUNDIDA DE LOS BAROTES DE LAS COLUMNAS DE LA CANCHA MULTIPLE.

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ

COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 0870051-664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10-Marzo-2011
M. José Uribe

649
279



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN

LA SIERRA

PERÍODO

26/01-2011 AL 26/02/2011

PÁGINA

19

DE

22

FECHA

26

02

2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

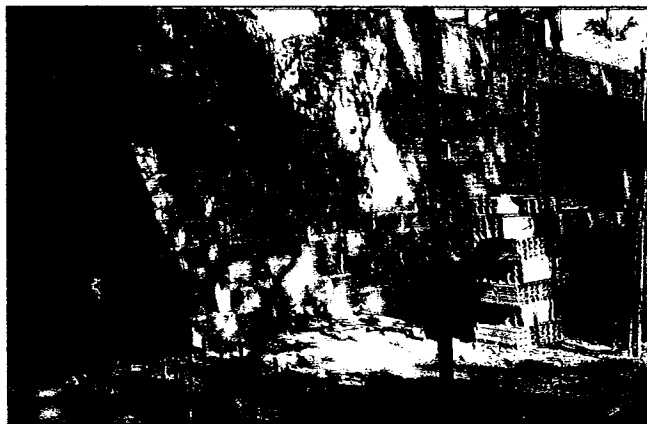

CONTENIDO: DETALLE, LEVANTE DE MURO EN BLOQUE SAMO, FACHADA POSTERIOR. (BLOQUE DE APOYO ACADEMICO.)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ

COORDINADOR TÉCNICO

Matrícula No.: 0870051-664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre: MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10-Marzo-2011
Firma Jose Uido

280

INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN

LA SIERRA

PERIODO

26/01-2011 AL 26/02/2011

PÀGINA

20

DE

22

FECHA

26

Q2

2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÀ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

**SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS**

SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CONTENIDO: DETALLE. PANETE ALLANADO SOBRE MURO (ESP. 0,07) Y JUNTA DE DILATACIÓN. FACHADA LATERAL (BLOQUE DE APOYO ACADÉMICO.)

firmo

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ

COORDINADOR TECNICO

Matrícula No.: 0870051-664 ATLÀNTICO

Firma

Nombr

Dr. MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Matricula No. : 08700-69126 ATLANTICO

10-11-2005
Fly 1000 Miles

102 / 182



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	LA SIERRA		
PERIODO	26/01/2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	21	DE	22
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

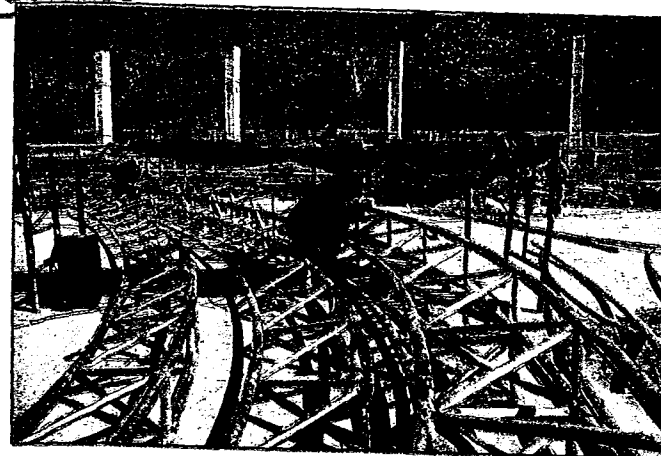

CONTENIDO: DETALLE. CORTE DE TUBERIA GALVANIZADA (DIAMETRO 1 1/2") PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS CERCHAS METALICAS. (CANCHA MULTIPLE)

CONTENIDO: DETALLE. CONSTRUCCIÓN DE CERCHAS METALICAS EN TUBERIA GALVANIZADA (DIAMETRO 2") AREA DE CANCHA MULTIPLE.

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TECNICO
Matrícula No.: 0870051-664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10-Mar-10-2020
H4 Jose Luis

282
202



INTERVENTORÍA:

CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCIÓN	LA SIERRA		
PERÍODO	26/01-2011 AL 26/02/2011		
PÁGINA	22	DE	22
FECHA	26	02	2011


OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO

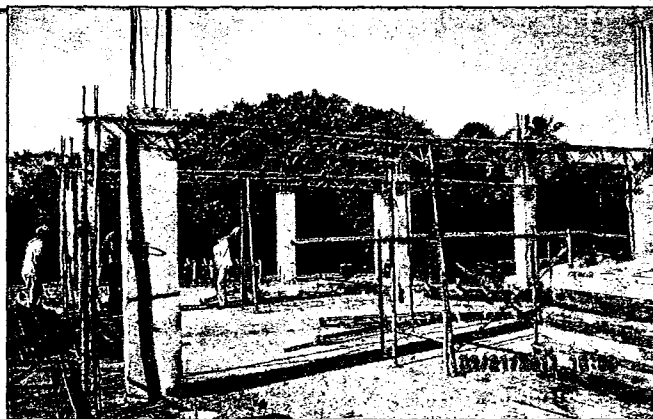

CONTENIDO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHAS, GATOS Y FORMALETERIA, PARA LA FUNDIDA DE LAS VIGAS AEREAS EN CONCRETO. (SEGUNDO PISO)

Firma

Nombre:

JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TÉCNICO
Matrícula No.: 0870051-664 ATLÁNTICO

Firma

Nombre:

MIGUEL ANTONIO VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Matrícula No.: 08700-69126 ATLÁNTICO

10-Marzo-2020
Heide Ruiz

2023

284

204

**PROGRAMACIÓN DE OBRAS.
ESCUELA RURAL MIXTA LA SIERRA.**

10 - Mayo - 2020
Hago de video

PROGRAMACION DE OBRAS LA SIERRA

	DICIEMBRE		ENERO					FEBRERO				MARZO	
	semana 7	semana 8	semana 9	semana 10	semana 11	semana 12	semana 13	semana 14	semana 15	semana 16	semana 17	semana 18	
PRELIMINARES													
EXCAVACIONES Y RELLENOS ESTRUCTURALES													
OBRAS VARIAS													
ESTRUCTURAS													
MAMPOSTERÍA Y PREFABRICADOS													
PAÑETES													
CUBIERTAS													
PISOS													
ACABADOS													
CARPINTERIA METALICA													
INSTALACIONES HIDRAULICAS													
INSTALACIONES SANITARIAS													
INSTALACIONES ELECTRICAS													
OBAS COMPLEMENTARIAS													

Fecha 10- Marzo -2020
Ma José Vides

10x
1580

~~286~~
706

**FOTOCOPIA DE LA BITÁCORA QUE MUESTRA EL
AVANCE DE OBRAS DE LA ESCUELA RURAL MIXTA
LA SIERRA.**

10- Mayo - 1970
F14 José Udes

ENERO 22-11. SABADO

Grupos de los intercomunicadores se observó que las
Juntas de dilatación de los gradas de la cancha
con coinciden por lo que esta intercomunicación
exigirá que se demuestre y/o sellen para hacer
las de nuevo, lo mismo que se sigue la demo-
stración del esbozo en la tabla de GROSS, de modo
a que se ocupe el B. Pando. 11/1/11



se ejecutó labores de fundido de alfajras en concreto,
igualmente paneles de gradas existentes con las respecti-
vas juntas. Igualmente se realizó la conexión de juntas
en paneles de gradas.

ENERO 23/2011. NO se laboró en este día dominical.

ENERO 24-25/2011 LUNES-MARTES

se laboró en las siguientes actividades:

- Soldadura de tubos para cerchas en la cubierta de cancha
múltiple.
- Armada de hierro faltante en vigas C y D y formateo
de losa en bloque de apoyo académico.

10- MARZO 2011
H. J. José Vides

ENC
SE
losa
for
alg
Tor

EN
bor
ma
tor

FE
EN
30
de
car
Iq
no
En
suo
dre
un

FEBRERO 01-2011

- SUPP. En la fundación de la estructura por
bloque de apoyo de concreto, entre por ende fu
lo intercalamos. Aho una recomendaciones
que no han sido aceptadas por el Residente de
obra, el igual que la ubicación de la misma
por lo que se hace responsable al Residente
de obra. Por los resultados finales del proceso

11/5

* ENERO 26-27/2011 MIERCOLES- JUEVES

En estos días se llevó a cabo la revisión del hieno de
losa por parte del arg. Luis Verbel. ya q' el arg' residente
se encontraba en Valledupar en diligencias de su oficina
en Biquilla se encontró un desplazamiento del hieno en
los aleros q' dan hacia la cancha y ganchos q' faltaban
al interior de las vigas B-C de la losa. Igualmente se re-
comendó algunas varillas de refuerzo en algunas vigas de
la losa. También se comenzaron actividades de revela-
ción de la losa. se hizo con la interventoría (Gaimel Mer-
cado) el trazado de las guarderas y se comenzó con
la colocación de estas.

11/5

10- MURCO -2020
MA Jose Vides

ENERO 28-29-30/2011 VIERNES - SABADO Y DOMINGO

se trabajo en actividades de guarderas de bordes de losa, guarderas y tapones de vigas y nivelación de formaleta de losa. se hicieron varias conexiones en algunas líneas de guarderas por parte de la interven-
toria.

45°
2°

ENERO 31/2011 LUNES se laboró en guarderas de bordes de losas, tapones de vigas, nivelación de formaleta de losa y conexiones solicitadas por la interven-
toria.

45°
2°

FEBRERO 01/2011 MARTES

En este día se comenzó con la fundición en concreto 3000 psi de las vigas de 0,40 x 0,45 de la losa del bloque de apoyo académico. se laboró con 20 operarios alcanzándose a fundir un 60% de las vigas.

Igualmente se hizo la nivelación de la parte superior de las vigas recomendadas por el interventor.

En la parte delantera se fundió la viga de amarrado la cual por un error involuntario esta presenta un resaca-
che de 2 cms. lo cual no presenta un inconveniente para una posterior demolición.

10-
M4 José
2°

FEBRERO 02/2011 MIERCOLES

Se terminó la fundición en concreto 3000 psi de las vigas 40 x 45 del bloque de apoyo académico. se laboró con 12 operarios alcanzando el saldo del 40% restante. Igualmente se colocaron los conectores en las vigas los cuales iban a hacer contacto con las laminas metaldex. se tomó un cilindro de muestra del concreto referenciado con la sigla losa 4-2/2011.

*Fr^o
2*

FEBRERO 03/2011 JUEVES

En este día se trabajó en el desencofre de vigas del lado interno. Quedando solo pendiente las guarderas externas. se laboró en el aniego de chazas. Igualmente se trabajó en la nivelación de la parte superior de las vigas para que las laminas metaldex sentaran sin ningún desperfecto. se laboró en este día con 6 operarios.

*Fr^o
2*

FEBRERO 04/2011 VIERNES

Se comenzó la instalación de las laminas metaldex en el bloque de apoyo académico con 4 soldadores. También se trabajó en la prolongación de columnas 60 x 40 de la cancha múltiple. se trabajó en ambas actividades con 6

10- Marzo
H4 José Udes

operarios. También se laboró en el descargue y cargue de cemento, mallas electrosoldadas. Se laboró en este día con 10 operarios. \$15⁰⁰

FEBRERO 05/2011 SABADO

se laboró en este día en la instalación de las laminas metaldex para la losa del bloque de apoyo académico. Forma-
leta y fundida en concreto 3000 psi de las prolongaciones de columnas 60 x 40 hacia el lado de las gradas existentes igualmente en el cargue y descargue de cemento, mallas electrosoldadas. En este día se vieron interminadas las actividades de soldadura de conectores en la losa porque hubo un daño en las redes eléctricas en la sierra. \$15⁰⁰

FEBRERO 06/2011 DOMINGO

No se laboró en la losa del bloque de apoyo académico por los problemas en las redes eléctricas en la sierra. Igualmente día de descanso de los trabajadores. \$15⁰⁰

FEBRERO 07/2011 LUNES

se terminaron de instalar las laminas metaldex en la losa del bloque de apoyo académico y se procedió a colocar los conectores y la malla electrosoldada. Igualmente se procedió a encofrar y fundir en concreto 3000 psi las

prolongaciones de columnas de los ejes B-4 y B-3 de la cancha múltiple del lado de las gradas existentes.
se laboró en la obra con 11 obreros $\frac{45}{20}$

FEB 03/2011 MARTES

En este día se laboró en actividades de armado de hierro de columnas del 2º piso del bloque de apoyo académico. En la fundida de la losa no se laboró por pedido de la dotación requerida desde hace un mes por parte del personal q' labora en la obra. Igualmente la interventoría de la obra hizo el mismo requerimiento y las afiliaciones a seguridad de salud.

La obra se encontrará suspendida hasta q' ~~se~~ sean cumplidos dichos requerimientos. Se laboró solamente con 5 trabajadores $\frac{45}{20}$

*FEB 09-10/2011 MIÉRCOLES-JUEVES

En estos dos días se laboró en la fundida de la losa del bloque de apoyo académico esp. 12 cm concreto 3000 psi y se tomaron dos muestras del concreto utilizado. Se laboró con 18 obreros incluyendo personal contratado solo para la fundición.

se entregó en este día la dotación (botas de cuero)

$\frac{45}{20}$

10- Marzo - 2011
H. José Udes.

292

112/FEB

En es
dient
día e
cual
acuer

FEB

En e.
copre
conc
para

FEB

En

FEB

En e.
- des
- tra
- fun
en

293
713

FEB 11/2011 VIERNES

En este día no se laboró por inconvenientes de deudas pendientes del maestro de obra con algunos trabajadores. En este día en horas de la tarde se presentó el sr Arnold Almeida el cual dialogó con los trabajadores y el maestro llegando a acuerdos de pago de la deuda en los pagos siguientes. $\frac{14.00}{12.00}$

FEB 12/2011 SABADO

En este día se laboró con 7 obreros en actividades de desencofre de la losa, fundida del tercer tramo de columna de la cancha en el eje B-2 y ameglo de cajas de columnas para su posterior fundida en el bloque de apoyo académico. $\frac{14.00}{12.00}$

FEB 13/2011 - DOMINGO

En este día no se laboró. Descanso por día de pago. $\frac{14.00}{12.00}$

FEB 14/2011 - LUNES

En este día se laboró en las siguientes actividades:

- desencofre de losa, levante de muros en 1er piso
- trazado de muros en el 2º piso, Ameglo de cajas
- fundida de columna en el tercer tramo de la cancha en el eje B-1. $\frac{14.00}{12.00}$

10 - Marzo - 2020
MA José Vides:

294

FEB 15/2011 MARTES

En este día se laboró en las siguientes actividades:
 - levante de muros en 1º piso en el área de cafetería y Baños, trazado y replanteo de columnas y muros en el 2º piso concertado con el interventor Jaime Mercado. *Jr*

X14 FEB se pri x 0, con labo de l

FEB. 16/2011 MIERCOLES

En este día se desarrolló el siguiente trabajo:
 levante de muros en el 1º piso en el sector de Baños, formaleta y fundida de columnas segundo piso en los ejes 1A, 3A (0,40 x 0,40), 2B (0,30 x 0,30) y 1D (0,30 x 0,30).
 Igualmente se ingresó a la obra arena lavada que llegó a la obra el día anterior. se laboró en este día con 8 operarios. *Jr*

FEB se pri 0,40, mur para FEB se cubi

FEB 17/2011 JUEVES

En este día se desarrolló el siguiente trabajo: formaleta y fundida de columnas del segundo piso en los ejes: 2A (0,40 x 0,40) 1B y 2B (0,30 x 0,30) y 3D (0,30 x 0,30). Igualmente se continuó con el levante de muros del primer piso. se laboró con 7 operarios. Se continuó con la rotada de tubos y soldadura en las cercas para la cubierta de la cancha. *Jr*

FEB se la ros, elabi Igua obra de l 12.0

10-Marzo-2011
 Hª José Vides

FEB. 18/2001 VIERNES

se laboró en la formaleta y fundida en concreto 3000 psi de las columnas segunda piso en los ejes 3B(0,40 x 0,40), 3C(0,30 x 0,30), 2C(0,30 x 0,30) y se continuó con el levante de los muros en el segundo piso. se laboró con 7 operarios, se continuó con la elaboración de las cerchas para la cubierta de la cancha. 7/15/20

FEB. 19/2011 SABADO

se trabajó en la formaleta y fundida en concreto 3000 psi de las columnas del segundo piso en los ejes 2D(0,40 x 0,40) y 1C(0,30 x 0,30). En este día no hubo levante de muros. En este día también se laboró en la cercha para la cubierta de la cancha. *15°*

FEB 10/2011 DOMINGO En este día a pesar de ser domingo se trabajo en el corte, soldadura de la cercha para la cubierta de la cancha. se laboró con 4 soldadores.

FEB. 20/2011 LUNES

se laboró en este día en actividad como levante de mu-
ros, corte y figuración de hierro para dinteles y en la
elaboración de las cerechas para la cubierta de la ~~gaceta~~
igualmente se laboró en actividades de ~~limpieza~~ ^{Mantenimiento} de la
obra y subida de materiales a utilitas ^{105 mts.} formateo
de las vigas y losa del segundo nivel. Se laboró con
12 operarios

296
F. 6
Ex
ge
m
ob

FEB. 22/2011 MARTES

En este día se laboró en actividades como fundida de dinteles, levante de muros, pañete de muros del lado de Baños -cto eléctrico, soldadura de nudos en las cerchas de la cubierta de la cancha, formaleta para vigas y losa del segundo piso. Se laboró en este día con 10 obreros. Igualmente se ejecutaron actividades de limpieza de obra. Se hizo por parte de la interventoría algunas objeciones sobre la verticalidad de un muro en el baño de discapacitado el cual se procedió a su corrección.

FEB. 23/2011 MIÉRCOLES

En este día se ejecutaron actividades como levante de muros, pañete de muros, corrección de bordes de losa, formaleta para vigas del segundo piso y resoldadura de nudos en las cerchas de la cubierta de la cancha. En este día se laboró con 9 operarios. Incorporaron a la obra 15 mts³ de granzon $3/4"$. Igualmente se terminó la última cercha de la estructura de la cubierta de la cancha. En este día se tuvo la inspección a la obra por parte del funcionario de la DNP (División Nacional de Regalías) acompañado del arq. Arnold Almeida y Jaime Mercado.

10- Marzo 2011
M4 José Uides

297
215

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA ESCUELA RURAL MIXTA LA SIERRA.

10- Marzo - 2022
M4 Jose Vides

298
718


	INTERVENTORIA: CONSULTORÍA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA.	CONTRATISTA: CONSORCIO AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA.
INSTITUCION	LA SIERRA		
PERIODO	26/01/2011 AL 26/02/2011		
FECHA	FEBRERO 26 DEL 2011		
SITIO	CORREGIMIENTO DE LA SIERRA.		

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Si/Bueno	No/Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	x		EN GENERAL EL ESTADO DE LA MAQUINARIA ES BUENO.
- Regularidad del mantenimiento		X	EL MANTENIMIENTO NO ES CONSTANTE.
- Vibraciones /Ruidos	x		
- Protecciones / Guardas / Frenos	x		
- Idoneidad operarios		X	UN OBRERO ES EL ENCARGADO DE MANEJAR Y HACERLE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	x		
- Buen estado	x		
- Fácil acceso y operación	x		
- Uso según zona de trabajo		x	NO APLICA POR QUE EL CAMPAMENTO ES GENERAL PARA CADA OBRA.
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	x		LA DOTACION BASICA ES COMPLETA (CASCO, GUANTES, BOTAS, GAFAS.)
- Buen estado	x		
- Uso según zona de trabajo	x		
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		SI HAY PROGRAMADAS RUTAS DE EVACUACIÓN
- Uso según zona de trabajo	X		NO SE UTILIZA POR QUE NO HAY JORNADA NOCTURNA.
VIGILANCIA			
- Personal suficiente	x		EL PERSONAL NO ES SUFICIENTE
- Diurna	x		EL ALMACENISTA HACE LABORES DE VIGILANCIA
- Nocturna	x		CELADURIA NOCTURNA A CARGO DE PERSONAL CONTRATADO POR EL CONTRATISTA.
EMERGENCIAS			
- Afiliación del Personal al Sistema	x		
- de Seguridad Social y ARP	x		

Firma: 
 MIGUEL VARGAS SANCHEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA

Firma: 
 JAIME MERCADO RUIZ
 COORDINADOR TECNICO DE INTERVENTORIA

10-Marzo-2020
 M. José Uides

299
719

**CONTROL DIARIO DEL ESTADO DEL TIEMPO.
ESCUELA RURAL MIXTA LA SIERRA.**

10- Marzo - 2020
Ma José Vides

300
720

INTERVENTORIA:
CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

CONTRATO: CONSTRUCCION Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA

CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR

SUPERVISION DEL CONTRATO: SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

INSTITUCION: LA SIERRA


PERIODO: ENE 26-11 A FEB 26-11


SITIO: CORREGIMIENTO DE LA SIERRA


FECHA: FEBRERO 26 DEL 2011

No.	FECHA	HORAS SOL	HORAS LLUVIA	LLUVIA EN LA NOCHE	OBSERVACIONES
1	26/12/2010	6	2	NO	
2	27/12/2010	8	0	X	
3	28/12/2010	8	0	X	
4	29/12/2010	8	0	X	
5	30/12/2010	8	0	X	
6	01/01/2011	8	0	X	
7	02/01/2011	8	0	X	
8	03/01/2011	8	0	X	
9	04/01/2011	8	0	X	
10	05/01/2011	8	0	X	
11	06/01/2011	8	0	X	
12	07/01/2011	8	0	X	
13	08/01/2011	8	0	X	
14	09/01/2011	8	0	X	
15	10/01/2011	8	0	X	
16	11/01/2011	8	0	X	
17	12/01/2011	8	0	X	
18	13/01/2011	8	0	X	
19	14/01/2011	8	0	X	
20	15/01/2011	8	0	X	
21	16/01/2011	8	0	X	
22	17/01/2011	8	0	X	
23	18/01/2011	8	0	X	
24	19/01/2011	6	2	X	FUERTE LLUVIA EN HORAS DE LA TARDE
25	20/01/2011	8	0	X	
26	21/01/2011	8	0	X	
27	22/01/2011	8	0	X	
28	23/01/2011	8	0	X	
29	24/01/2011	8	0	X	
30	25/01/2011	8	0	X	
31	26/01/2011	8	0	X	

SOL 244
LLUVIA 4



Firma: 
ARQ. JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TECNICO DE INTERVENTORIA

Firma: 
ARQ. MIGUEL ANTONIO VARGAS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA

10- Marzo - 2011
M^a José Vides

301
721

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

10- Marzo - 2010
Ma Jose Vides

	CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA		INSTITUCION LA SIERRA	
			PERIODO 36/01/11 A 26/02/11	
			PAGINA 1	DE 1
			FECHA 26	2 2011

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ.	CONTRATISTA: AMBIENTES ESCOLARES DEL CESAR	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	SITIO: LA SIERRA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA																																
PERSONAL	DIA	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
ROBERTO CARO																																
MARCIAL RODRIGUEZ																																
JEAN GUZMAN																																
EFRAIN PADILLA																																
RAFAEL QUINTANA																																
RUBEN PALLARES																																
JOSE GREGORIO																																
JOSE PADILLA																																
FERNENDO HERNANDEZ																																
LIBARDO PACHECO																																
JACINTO GARCIA																																
JEAN ROMERO																																
FRANCISCO OSPINO																																
JHONN DITA																																
ATILIO MARTINEZ																																

* estas cuadrillas actuan simultaneamente en las dos obras

Firma: 

Nombre: **MIGUEL ANTONIO VARGAS**
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO
 Matrícula No. : 08700-69126 ATLÁNTICO

10- MAR 2011
 FLE J. M. UDES

302
 222

303
723

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

10-11-2020
F14 Jose Udes



CONSULTORIA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA II ETAPA

INSTITUCION	LA SIERRA		
PERIODO			
PAGINA	1	DE	1

FECHA 26 02 11

CONTRATISTA	CONSTRUCCION Y ADECUACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA	SUPERVISION DEL CONTRATO	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	SITIO: LA SIERRA

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIA MAQ/EQUI.	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
MEZCLADORA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBRADOR	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SIERRA ELECTRICA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBROCOMPACTADO R TIPO RANA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
MOTOBOMBA	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
GATOS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CERCHAS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CHAZAS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ANDAMIOS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES
ACTIVO = A
REPARACION = R
INACTIVO = I
NO APLICA = N

Firma

Nombre: JAIME MERCADO RUIZ
COORDINADOR TECNICO DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: MIGUEL VARGAS SANCHEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE INTERVENTORIA

10-11-2010
Hijos de la Sierra

2010

305
725

10- MARZO 2020
Ha Jose V. J. G.
